

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FAISMUN 027/2023 AMPLIACION ELECTRIFICACIÓN CALLE REVOLUCION MEXICANA SUR DE CALLE GUAYANA A FIN DE CALLE
FAISMUN 028/2023 AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN CALLE CONCEPCIÓN DE CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA SUR A FIN DE CALLE

Ubicación: PUERTECITO DE LA VIRGEN

Contrato: FAISMUN 027 028/2023

Tipo de inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2023

Contratista: ECOSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Programa: SG ELECTRIFICACION

Inicio Vigente: lunes, 23 de octubre de 2023

Días de Obra: 45

Subprograma: 02 RURAL, AMPLIACION

Inicio Real: lunes, 23 de octubre de 2023

Monto Contratado: \$895,622.11

Residente: ARQ. LUIS FERNANDO MARTINEZ REYES


Fin Vigente: miércoles, 6 de diciembre de 2023

Monto Ejercido: \$863,799.78

Fin Real: miércoles, 6 de diciembre de 2023

SE SOLICITA NOTA DE CREDITO

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	25/10/2023	25.41%	25.42%	50.0%
2	06/11/2023	44.70%	44.72%	50.0%
3	21/11/2023	92.21%	92.23%	62.1%
4	06/12/2023	100.00%	100.00%	82.7%
5	21/12/2023	100.00%	100.00%	82.7%
6	05/01/2024	100.00%	100.00%	
7	20/01/2024	100.00%	100.00%	
8	04/02/2024	100.00%	100.00%	
9	19/02/2024	100.00%	100.00%	

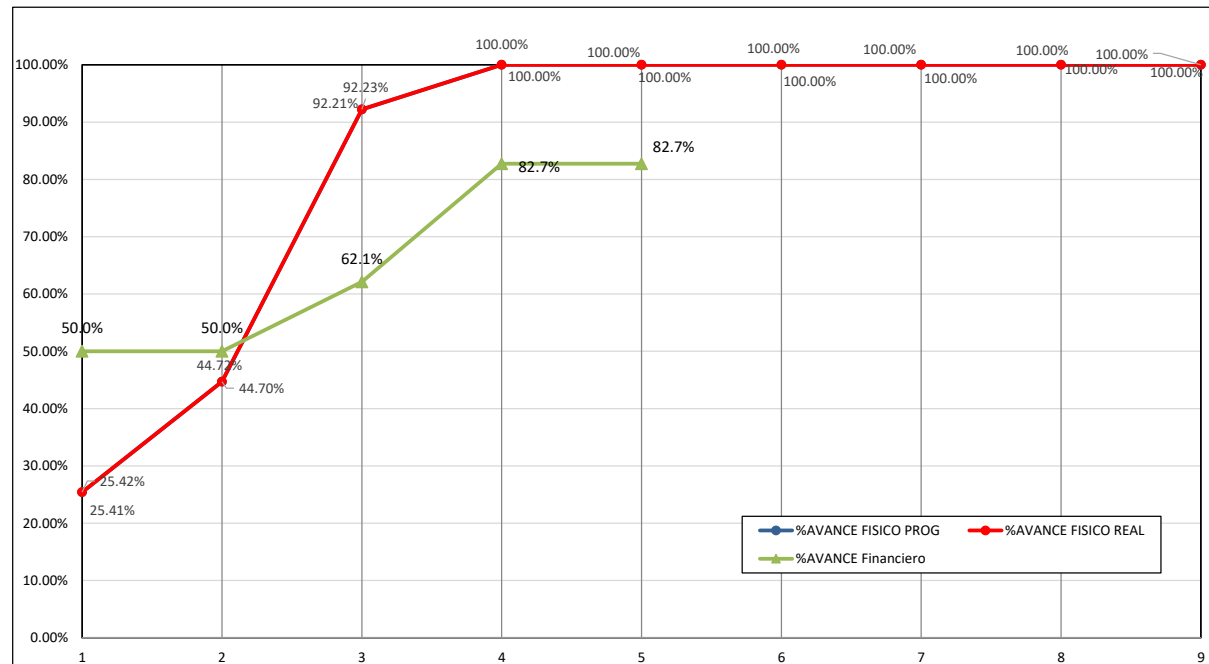

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
