

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FAISMUN 029/2023 REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO CALLE PARRAS DE CALLE MORELOS A CALLE FRANCISCO VILLA

Ubicación: LA ESCONDIDA

Contrato: FAISMUN 029/2023

Tipo de inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2023

Contratista: CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS, S.A. DE C.V.

Programa: SD ALCANTARILLADO

Inicio Vigente: viernes, 15 de septiembre de 2023

Días de Obra: 45

Subprograma: 01 REHABILITACION

Inicio Real: viernes, 15 de septiembre de 2023

Monto Contratado: \$821,057.45

Residente: URB. SERGIO MARQUEZ LEON


Fin Vigente: domingo, 29 de octubre de 2023

Monto Ejercido: \$785,000.00

Fin Real: domingo, 29 de octubre de 2023

SE SOLICITA NOTA DE CREDITO

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	15/09/2023	0.00%	0.00%	0.0%
2	22/09/2023	15.55%	15.56%	0.0%
3	29/09/2023	31.11%	31.12%	0.0%
4	06/10/2023	46.65%	46.67%	0.0%
5	13/10/2023	62.22%	62.25%	0.0%
6	20/10/2023	77.78%	77.79%	67.2%
7	29/10/2023	100.00%	100.00%	67.2%
8	05/11/2023	100.00%	100.00%	90.9%
9	12/11/2023	100.00%	100.00%	
10	19/11/2023	100.00%	100.00%	
11	26/11/2023	100.00%	100.00%	

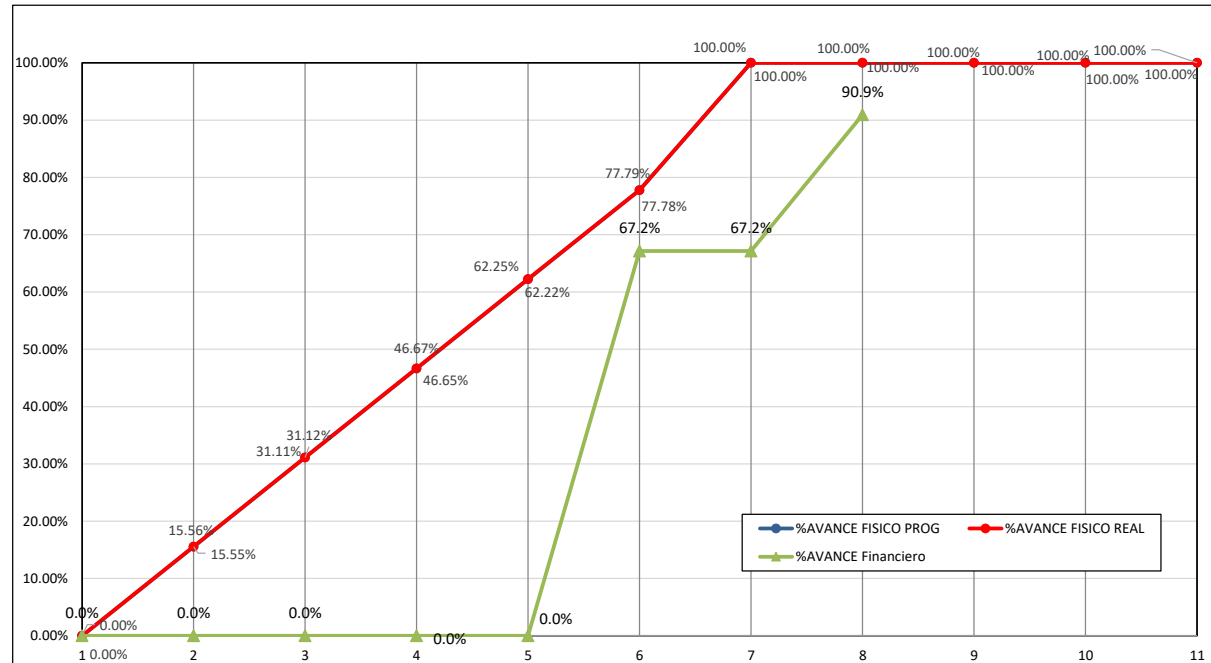

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
