

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FAISMUN 030/2023 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE CIRCUITO ESCUELAS
FAISMUN 031/2023 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE CIRCUITO ESCUELAS

Ubicación: LA CONCEPCIÓN

Contrato: FAISMUN 030 031/2023

Tipo de inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2023

Contratista: C. BENJAMIN MACIAS GASPAR

Programa: SD ALCANTARILLADO
SC AGUA POTABLE

Inicio Vigente: viernes, 15 de septiembre de 2023

Días de Obra: 30

Subprograma: 01 REHABILITACION

Inicio Real: viernes, 15 de septiembre de 2023

Monto Contratado: \$523,930.69

Residente: ING. CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA


Fin Vigente: sábado, 14 de octubre de 2023

Monto Ejercido: \$396,888.78

Fin Real: sábado, 14 de octubre de 2023

SE SOLICITA NOTA DE CREDITO

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	16/09/2023	0.63%	0.65%	0.0%
2	23/09/2023	5.14%	5.16%	0.0%
3	30/09/2023	37.67%	37.68%	0.0%
4	07/10/2023	74.19%	74.21%	0.0%
5	14/10/2023	100.00%	100.00%	0.0%
6	21/10/2023	100.00%	100.00%	12.0%
7	28/10/2023	100.00%	100.00%	12.0%
8	04/11/2023	100.00%	100.00%	12.0%
9	11/11/2023	100.00%	100.00%	12.0%
10	18/11/2023	100.00%	100.00%	75.8%

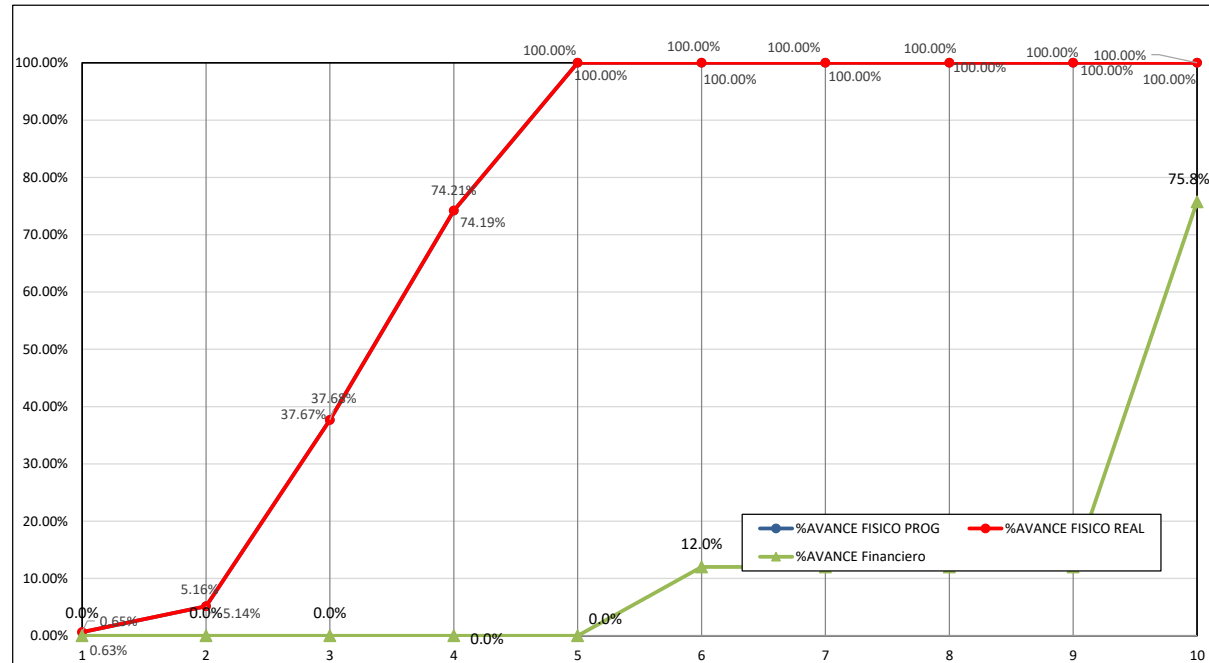

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
