

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FAISMUN 032/2023 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CALLE PARRAS DE CALLE MORELOS A CALLE CUAUHTEMOC
PF 007/2023 RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE PARRAS DE CALLE CUAHUTEMOC A CALLE FCO. VILLA

Ubicación: LA ESCONDIDA

Contrato: FAISMUN 032 PF 007/2023

Tipo de inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2023

Contratista: CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS, S.A. DE C.V.,

Programa: SF PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

Inicio Vigente: jueves, 9 de noviembre de 2023

Días de Obra: 45

Subprograma: 01 CONCRETO

Inicio Real: jueves, 9 de noviembre de 2023

Monto Contratado: \$3,674,379.49


Residente: URB. SERGIO MARQUEZ LEON

Fin Vigente: sábado, 23 de diciembre de 2023

Monto Ejercido: \$3,674,379.49

Fin Real: sábado, 23 de diciembre de 2023

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	10/11/2023	0.00%	0.00%	50.0%
2	17/11/2023	15.55%	15.56%	50.0%
3	24/11/2023	31.11%	31.13%	50.0%
4	01/12/2023	46.65%	46.66%	54.6%
5	08/12/2023	62.22%	62.22%	73.1%
6	15/12/2023	77.78%	77.79%	88.1%
7	23/12/2023	100.00%	100.00%	
8	30/12/2023	100.00%	100.00%	
9	06/01/2024	100.00%	100.00%	
10	13/01/2024	100.00%	100.00%	

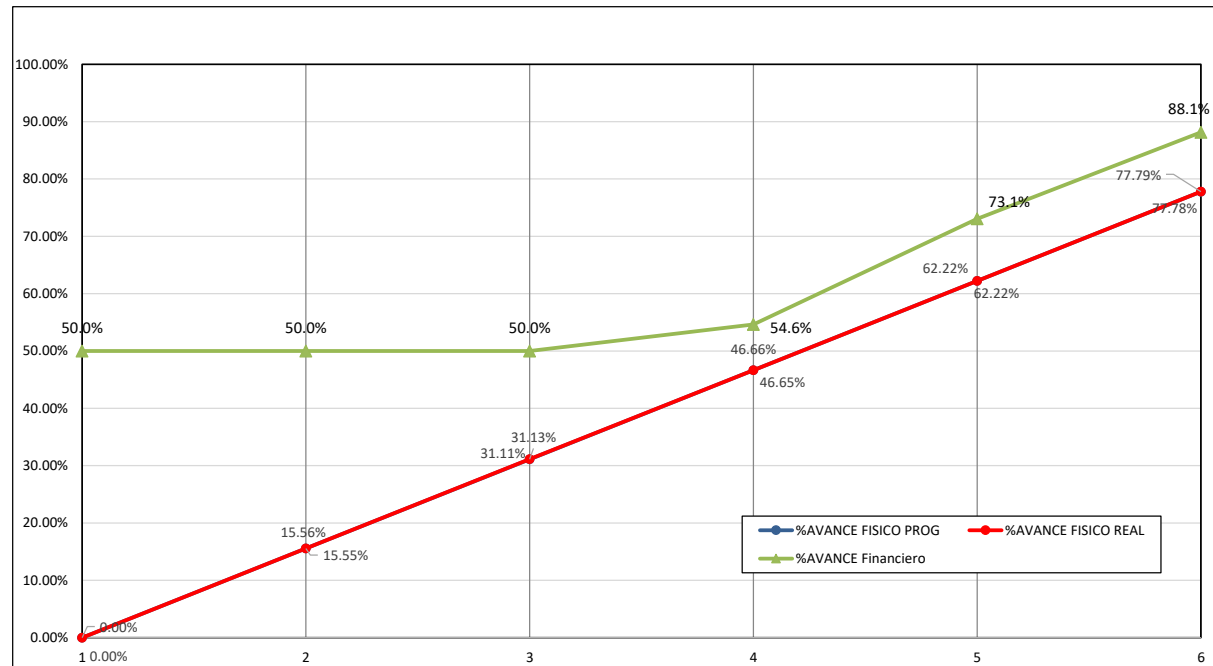

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
