

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FAISMUN 033/2023 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, COCINA Y BAÑO EN ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Ubicación: FRACC. CERRADA SAN FRANCISCO, FRACC. HIDALGO, FRACC. LIRIOS, FRACC. SAN JOSÉ DEL BARRANCO, COMUNIDAD LA CONCEPCIÓN, DELEGACIÓN LA ESCONDIDA **Contrato:** FAISMUN 033/2023

Tipo de inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2023 **Contratista:** FRADAG CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.


Programa: SH VIVIENDA DIGNA **Inicio Vigente:** jueves, 2 de noviembre de 2023 **Días de Obra:** 60

Subprograma: 02 AMPLIACION DE VIVIENDA **Inicio Real:** jueves, 2 de noviembre de 2023 **Monto Contratado:** \$1,684,419.59

Residente: ARQ. FRANCISCO LOZANO SILVA **Fin Vigente:** domingo, 31 de diciembre de 2023 **Monto Ejercido:** \$1,684,419.59

Fin Real: domingo, 31 de diciembre de 2023

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	02/11/2023	0.00%	0.00%	50.0%
2	17/11/2023	19.40%	19.40%	50.0%
3	02/12/2023	54.34%	54.34%	57.5%
4	17/12/2023	87.18%	87.18%	67.6%
5	01/01/2024	100.00%	100.00%	
6	16/01/2024	100.00%	100.00%	
7	31/01/2024	100.00%	100.00%	
8	15/02/2024	100.00%	100.00%	
9	01/03/2024	100.00%	100.00%	

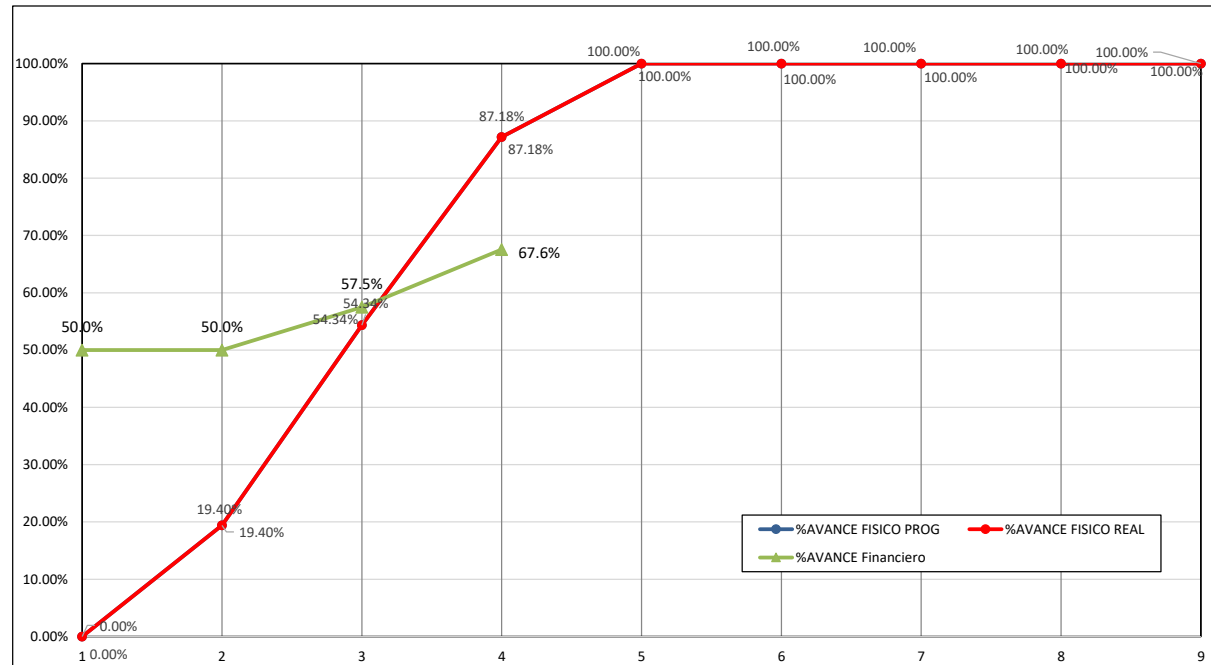

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
