

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FAISMUN 034/2023 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, COCINA Y BAÑO EN ZONA NORTE EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Ubicación: AMAPOLAS DEL RÍO, BORROTÉS, RANCHO NUEVO Y TEPETATE

Contrato: FAISMUN 034/2023

Tipo de inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2023

Contratista: BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

Programa: SH VIVIENDA DIGNA

Inicio Vigente: jueves, 2 de noviembre de 2023

Días de Obra: 45

Subprograma: 02 AMPLIACION DE VIVIENDA

Inicio Real: jueves, 2 de noviembre de 2023

Monto Contratado: \$1,171,131.28


Residente: ARQ. FRANCISCO LOZANO SILVA

Fin Vigente: sábado, 16 de diciembre de 2023

Monto Ejercido: \$1,171,131.28

Fin Real: sábado, 16 de diciembre de 2023

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	02/11/2023	0.00%	0.00%	0.0%
2	17/11/2023	30.97%	30.97%	0.0%
3	02/12/2023	80.43%	80.43%	65.5%
4	17/12/2023	100.00%	100.00%	
5	01/01/2024	100.00%	100.00%	
6	16/01/2024	100.00%	100.00%	

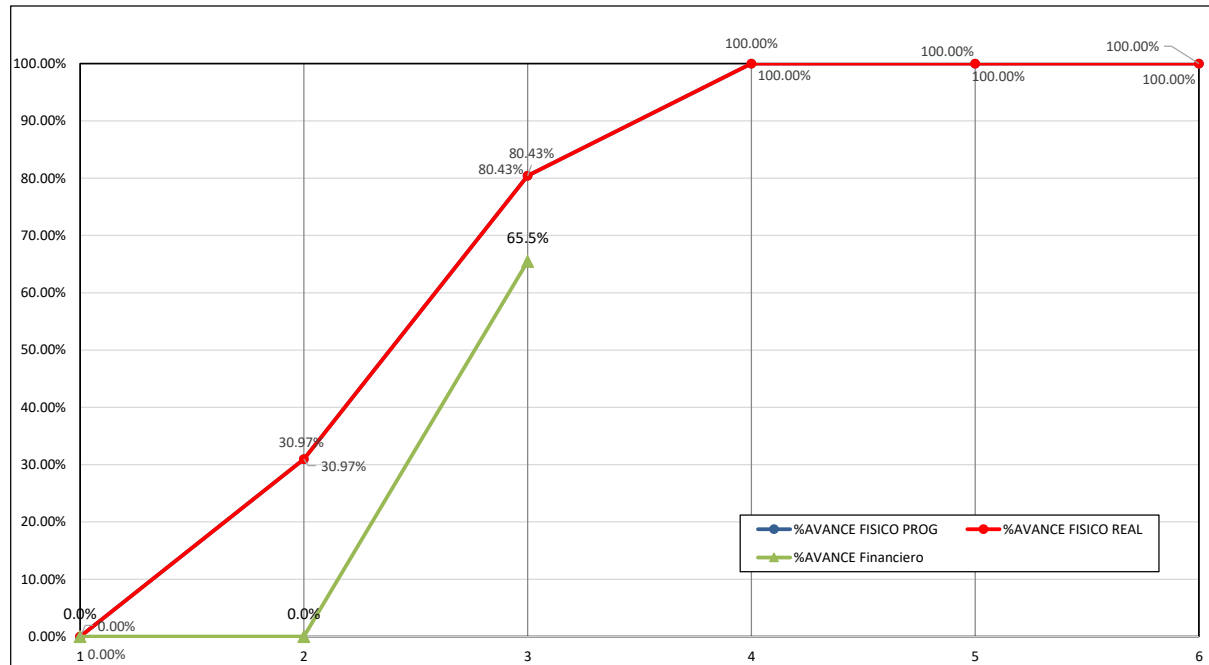

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
