

## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

**Obra:** FAISMUN 035/2023 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO Y BAÑO EN ZONA SUR EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

**Ubicación:** ESTACIÓN CHICALOTE, LA GUAYANA, LORETITO, MACARIO J. GÓMEZ Y PUERTECITO DE LA VIRGEN **Contrato:** FAISMUN 035/2023

**Tipo de inversión:** FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2023 **Contratista:** CORPORATIVO CONSTRUYE, S.A. DE C.V.


**Programa:** SH VIVIENDA DIGNA **Inicio Vigente:** jueves, 2 de noviembre de 2023 **Días de Obra:** 60

**Subprograma:** 02 AMPLIACION DE VIVIENDA **Inicio Real:** jueves, 2 de noviembre de 2023 **Monto Contratado:** \$1,368,597.19

**Residente:** ARQ. FRANCISCO LOZANO SILVA **Fin Vigente:** domingo, 31 de diciembre de 2023 **Monto Ejercido:** \$1,368,597.19

**Fin Real:** domingo, 31 de diciembre de 2023

| SEMANA | FECHA      | %AVANCE FISICO PROG | %AVANCE FISICO REAL | %AVANCE Financiero |
|--------|------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1      | 02/11/2023 | 0.00%               | 0.00%               | 0.0%               |
| 2      | 17/11/2023 | 19.97%              | 19.97%              | 0.0%               |
| 3      | 02/12/2023 | 52.55%              | 52.55%              | 60.0%              |
| 4      | 17/12/2023 | 87.53%              | 87.53%              |                    |
| 5      | 01/01/2024 | 100.00%             | 100.00%             |                    |
| 6      | 16/01/2024 | 100.00%             | 100.00%             |                    |
| 7      | 31/01/2024 | 100.00%             | 100.00%             |                    |
| 8      | 15/02/2024 | 100.00%             | 100.00%             |                    |
| 9      | 01/03/2024 | 100.00%             | 100.00%             |                    |

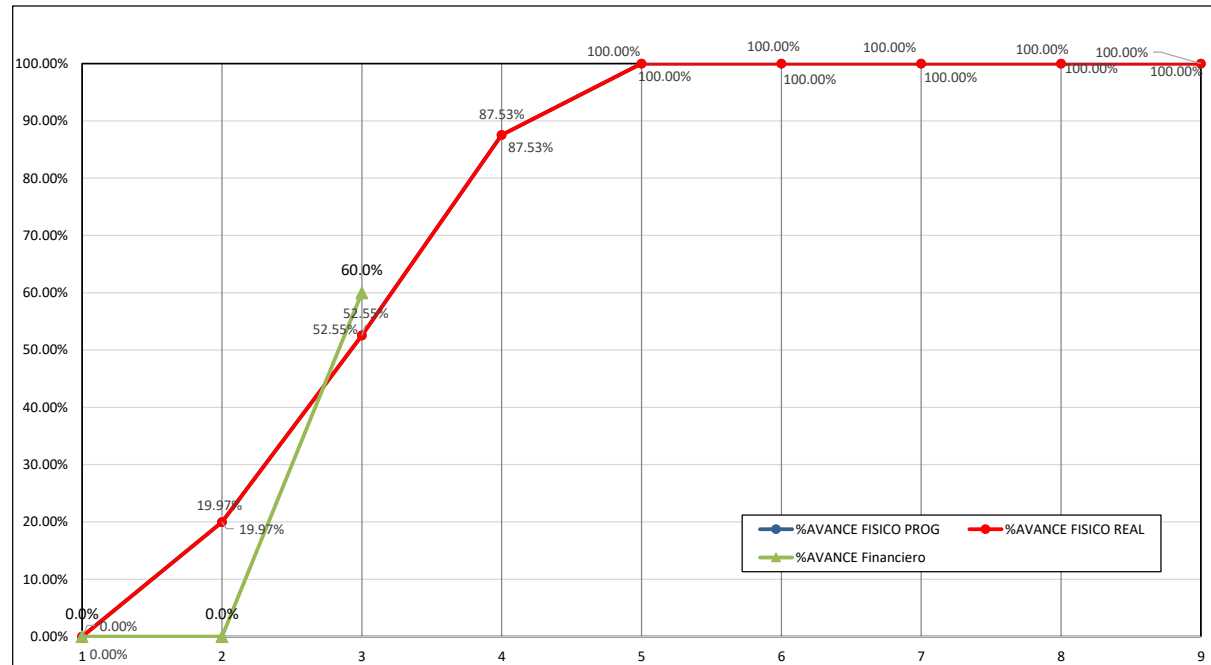

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
