

## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

**Obra:** FAISMUN 036/2023 EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN VARIAS COMUNIDADES, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES

**Ubicación:** EN VARIAS COMUNIDADES

**Contrato:** FAISMUN 036/2023

**Tipo de inversión:** FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2023

**Contratista:** ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. r

**Programa:** SH VIVIENDA DIGNA

**Inicio Vigente:** lunes, 16 de octubre de 2023

**Días de Obra:** 20

**Subprograma:** EQUIPAMIENTO

**Inicio Real:** lunes, 16 de octubre de 2023

**Monto Contratado:** \$582,376.84


**Residente:** ARQ. MIGUEL ÁNGEL CASTORENA ARIAS

**Fin Vigente:** martes, 14 de noviembre de 2023

**Monto Ejercido:** \$582,376.84

**Fin Real:** martes, 14 de noviembre de 2023

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	17/10/2023	0.63%	0.65%	0.0%
2	24/10/2023	5.14%	5.16%	0.0%
3	31/10/2023	37.67%	37.68%	0.0%
4	07/11/2023	74.19%	74.19%	70.0%
5	14/11/2023	100.00%	100.00%	89.5%
6	21/11/2023	100.00%	100.00%	100.0%

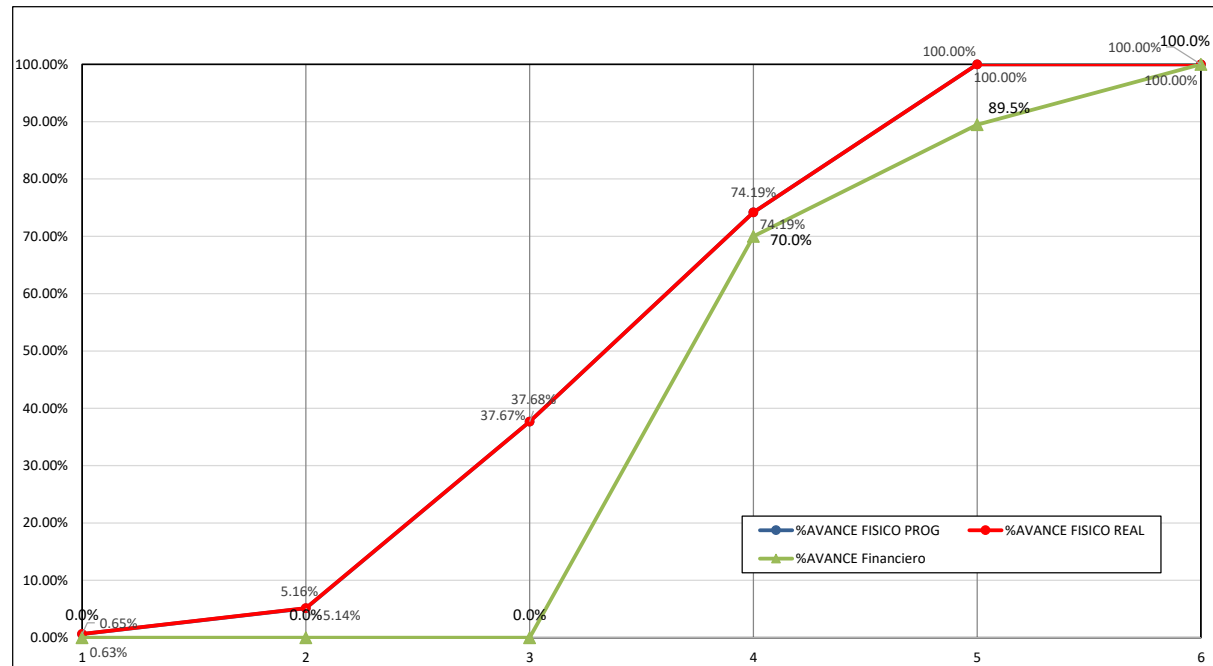

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
