

## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA


**Obra:** FR 001 /2023 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE J.N. FRANCESCO TONUCCI

**Ubicación:** FRACCIONAMIENTO LA RIBERA SAN FRANCISCO DE LOS ROMO  
**Tipo de inversión:** FONDO RESARCITORIO 2023  
**Programa:** SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIV  
**Subprograma:** 02 A CONSTRUCCIÓN-PREESCOLAR  
**Residente:** ING. MIGUEL ANGEL SILVA SERNA

**Contrato:** FR 001 /2023  
**Contratista:** C. Edgar Joel Tapia Guzmán  
**Inicio Vigente:** viernes, 5 de mayo de 2023  
**Inicio Real:** viernes, 5 de mayo de 2023  
**Fin Vigente:** lunes, 3 de julio de 2023  
**Fin Real:** lunes, 3 de julio de 2023

**Días de Obra:** 60  
**Monto Contratado:** \$867,539.42  
**Monto Ejercido:** \$864,867.46  
**Se solicita Nota de credito**

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	05/05/2023	0.00%	0.00%	49.2%
2	20/05/2023	17.09%	18.00%	49.2%
3	02/06/2023	46.36%	48.56%	56.3%
4	19/06/2023	83.88%	85.60%	67.6%
5	04/07/2023	100.00%	100.00%	89.7%
6	19/07/2023	100.00%	100.00%	99.7%

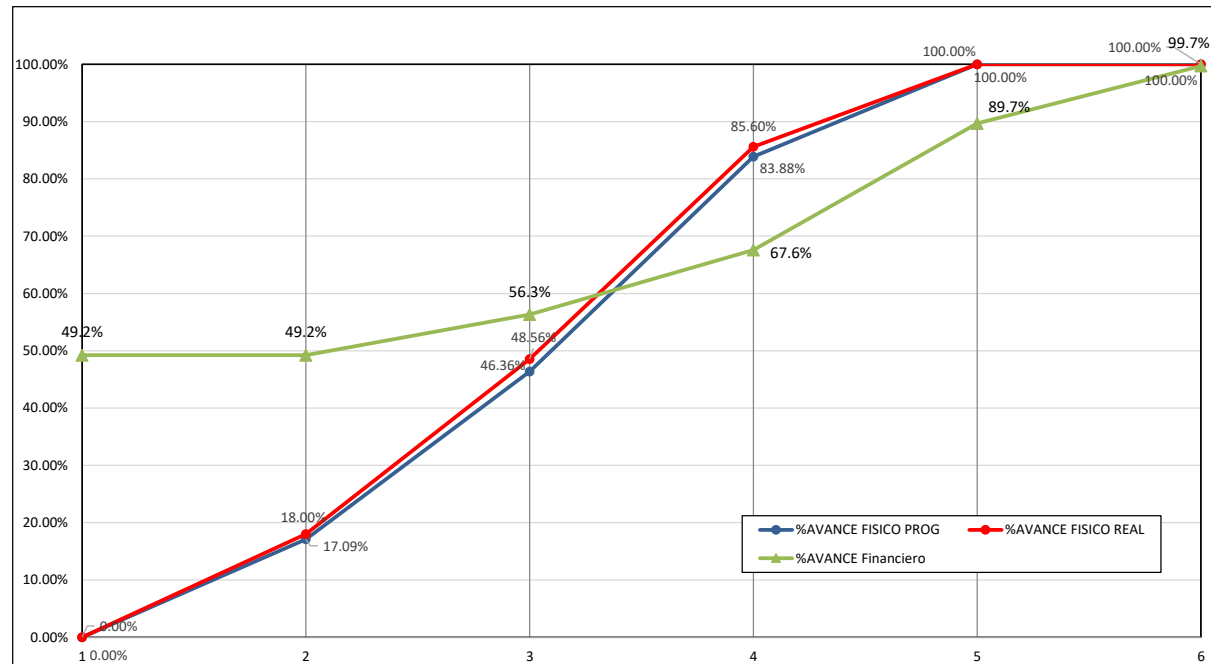

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
