

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FR 002 /2023 CONSTRUCCION DE MONUMENTO "SANTA CRUZ"

Ubicación: CALLE EMILIO CARRANZA ESQUINA CALLE RIO SAN PEDRO
Tipo de inversión: COLONIA CENTRO. CABECERA MUNICIPAL. FONDO RESARCITORIO 2023

Programa: UE SITIOS HISTÓRICOS Y CULTURALES

Subprograma: 02 CONSTRUCCION Y AMPLIACION

Residente: ING. MIGUEL ANGEL SILVA SERNA

Contrato: FR 002 /2023

Contratista: GRUPO AMBIENTA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.


Inicio Vigente: lunes, 11 de septiembre de 2023 **Días de Obra:** 30

Inicio Real: lunes, 11 de septiembre de 2023 **Monto Contratado:** \$1,056,576.30

Fin Vigente: martes, 10 de octubre de 2023 **Monto Ejercido:** \$1,056,576.30

Fin Real: martes, 10 de octubre de 2023

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	15/09/2023	11.82%	11.84%	48.1%
2	25/09/2023	42.12%	42.14%	48.1%
3	02/10/2023	70.26%	70.28%	62.0%
4	10/10/2023	100.00%	100.00%	80.1%
5	24/10/2023	100.00%	100.00%	96.2%
6	08/11/2023	100.00%	100.00%	96.2%
7	23/11/2023	100.00%	100.00%	100.0%

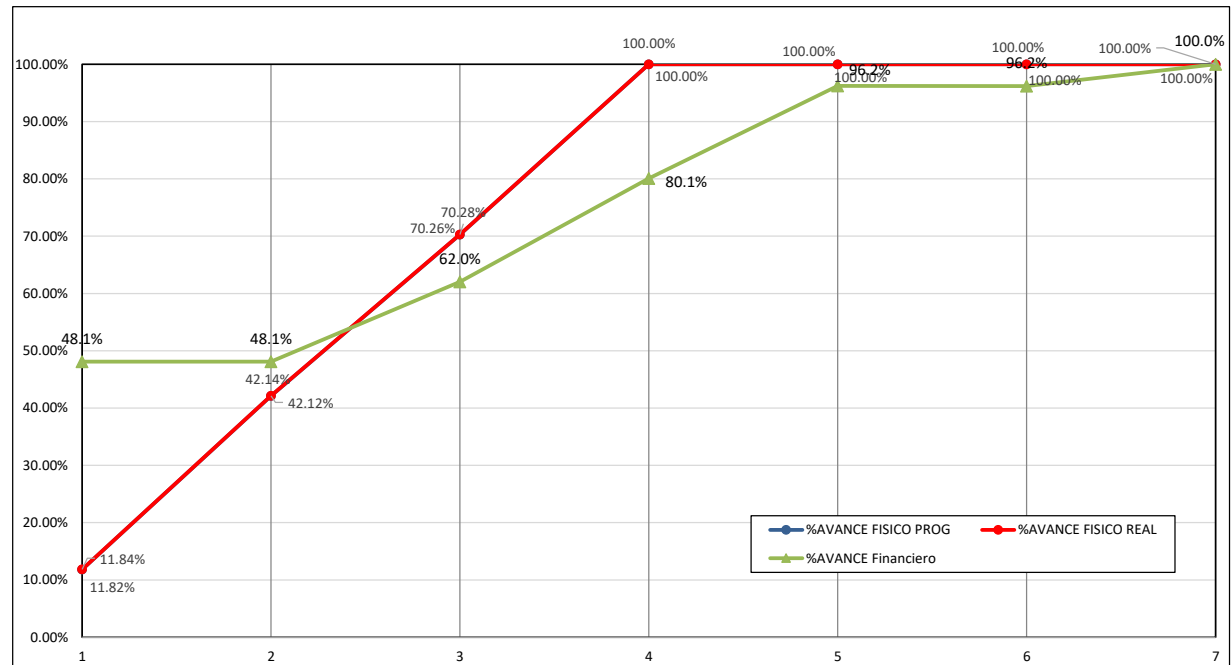

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
