

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FR 003/2023 REHABILITACION DE EXPLANADA SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Ubicación: AV. JUÁREZ, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Contrato: FR 003 /2023

Tipo de inversión: FONDO RESARCITORIO 2023

Contratista: REMODELACIONES Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENT

Programa: SE URBANIZACIÓN

Inicio Vigente: martes, 19 de septiembre de 2023 **Días de Obra:** 30

Subprograma: 04 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y JARDINES


Inicio Real: martes, 19 de septiembre de 2023 **Monto Contratado:** \$743,660.38

Residente: ARQ. LUIS FERNANDO MARTINEZ REYES

Fin Vigente: miércoles, 25 de octubre de 2023 **Monto Ejercido:**

Fin Real: miércoles, 25 de octubre de 2023

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	19/09/2023	0.00%	0.00%	46.6%
2	26/09/2023	0.04%	0.06%	46.6%
3	03/10/2023	21.47%	21.49%	46.6%
4	10/10/2023	49.34%	49.35%	46.6%
5	17/10/2023	81.67%	81.69%	55.6%
6	25/10/2023	100.00%	100.00%	55.6%
7	01/11/2023	100.00%	100.00%	83.3%
8	08/11/2023	100.00%	100.00%	83.3%
9	15/11/2023	100.00%	100.00%	83.3%
10	22/11/2023	100.00%	100.00%	83.3%
11	29/11/2023	100.00%	100.00%	
12	06/12/2023	100.00%	100.00%	
13	13/12/2023	100.00%	100.00%	
14	20/12/2023	100.00%	100.00%	

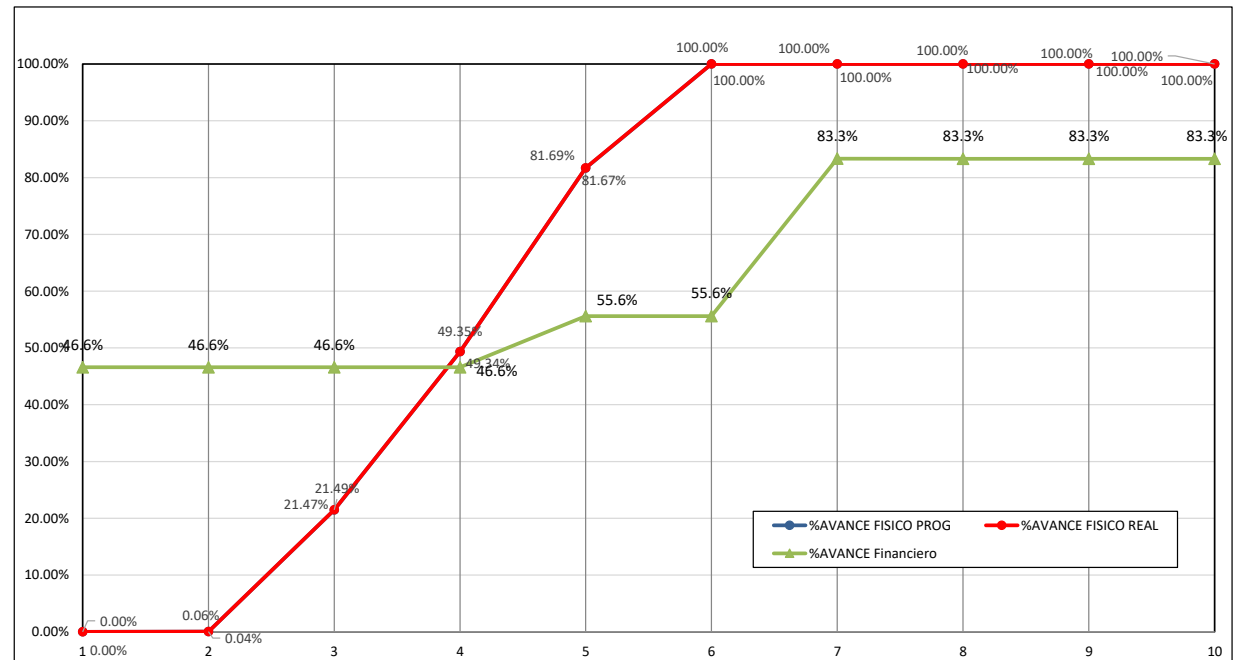

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
