

## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FR 004 /2023 RECONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PARQUE

Ubicación: SAN FELIPE I

Tipo de inversión: FONDO RESARCITORIO 2023

Programa: SL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Subprograma: 02 RECONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PARQUE

Residente: ING. MIGUEL ANGEL SILVA SERNA

Contrato: FR 004 /2023

Contratista: CONESTRUCTURA, S.A. DE C.V.

Inicio Vigente: miércoles, 29 de noviembre de 2023

Inicio Real: miércoles, 29 de noviembre de 2023

Fin Vigente: sábado, 27 de enero de 2024


Fin Real: sábado, 27 de enero de 2024

Días de Obra: 60

Monto Contratado: \$ 1,517,500.03

Monto Ejercido:

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	29/11/2023	0.00%	0.00%	50.0%
2	09/12/2023	10.45%	10.46%	50.0%
3	24/12/2023	22.86%	22.87%	50.0%
4	09/01/2024	56.12%		
5	24/01/2024	93.48%		
6	08/02/2024	100.00%		
7	23/02/2024	100.00%		
8	09/03/2024	100.00%		
9	24/03/2024	100.00%		

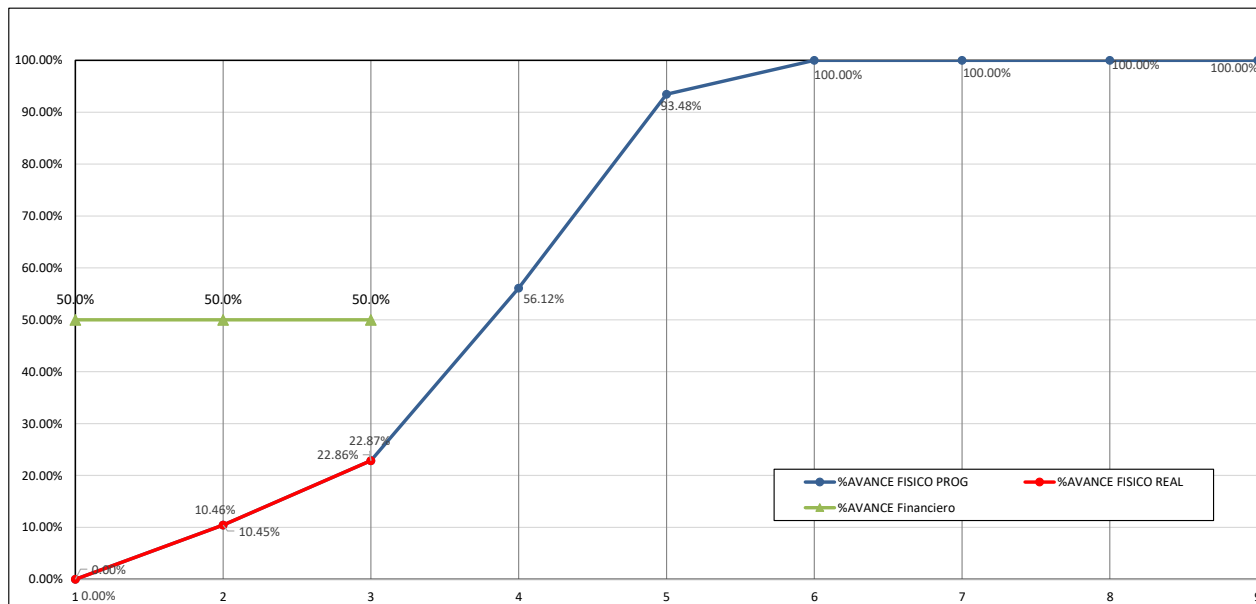

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
