


## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

<b>Obra:</b>	IP 001 B/2023 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA DESPLANTE DE EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN LA ESCONDIDA, EN LA COMUNIDAD DE LA ESCONDIDA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.				
<b>Ubicación:</b>	SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	<b>Contrato:</b>	IP 001 B/2023		
<b>Tipo de inversión:</b>	IP INGRESOS PROPIOS 2023	<b>Contratista:</b>	INGENIERIA PROYECTO Y CONTROL DE OBRA, S. DE R.L. DE C.V.		
<b>Programa:</b>	U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DES. REG.	<b>Inicio Vigente:</b>	jueves, 19 de enero de 2023	<b>Días de Obra:</b>	15
<b>Subprograma:</b>	03 SERVICIOS	<b>Inicio Real:</b>	jueves, 19 de enero de 2023	<b>Monto Contratado:</b>	<b>\$39,614.00</b>
<b>Residente:</b>	ING. CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA	<b>Fin Vigente:</b>	jueves, 2 de febrero de 2023	<b>Monto Ejercido:</b>	<b>\$39,614.00</b>
		<b>Fin Real:</b>	jueves, 2 de febrero de 2023		

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	19/01/2023	0.00%	0.00%	0.0%
2	25/01/2023	59.00%	59.00%	0.0%
3	01/02/2023	70.00%	70.00%	0.0%
4	02/02/2023	100.00%	100.00%	0.0%
5	08/02/2023	100.00%	100.00%	100.0%
6	15/02/2023	100.00%	100.00%	100.0%

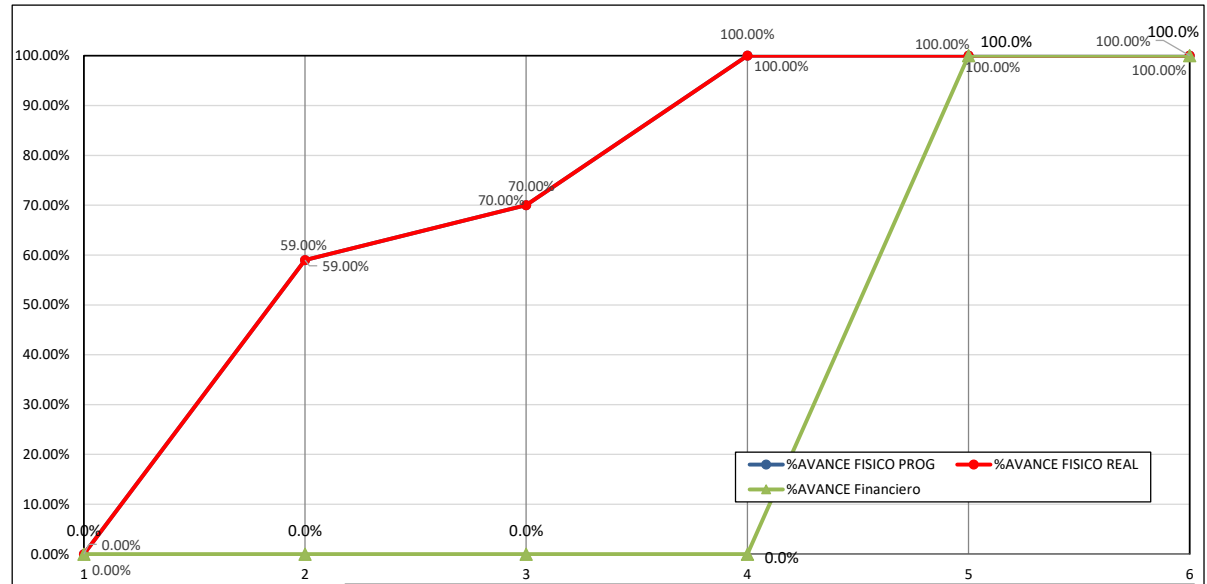

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
