


## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

<b>Obra:</b>	IP 001 C/2023 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - TRAMITE DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, PERITO RESPONSABLE DE 5 OBRAS Y 2 PROYECTOS ESTRUCTURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO (CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA).			
<b>Ubicación:</b>	SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	<b>Contrato:</b>	IP 001 C/2023	
<b>Tipo de inversión:</b>	IP INGRESOS PROPIOS 2023	<b>Contratista:</b>	ANGEL DE JESUS RAMIREZ GUARDADO	
<b>Programa:</b>	U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DES. REG.	<b>Inicio Vigente:</b>	viernes, 31 de marzo de 2023	<b>Días de Obra:</b> 270
<b>Subprograma:</b>	03 SERVICIOS	<b>Inicio Real:</b>	viernes, 31 de marzo de 2023	<b>Monto Contratado:</b> \$137,069.08
<b>Residente:</b>	ARQ. MIGUEL ÁNGEL CASTORENA ARIAS	<b>Fin Vigente:</b>	lunes, 25 de diciembre de 2023	<b>Monto Ejercido:</b> \$137,069.08
		<b>Fin Real:</b>	lunes, 25 de diciembre de 2023	

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	31/03/2023	0.00%	0.00%	0.0%
2	09/04/2023	33.85%	35.97%	0.0%
3	23/04/2023	36.09%	35.97%	0.0%
4	07/05/2023	38.34%	35.97%	0.0%
5	21/05/2023	43.20%	48.87%	0.0%
6	04/06/2023	45.45%	55.60%	0.0%
7	18/06/2023	56.83%	71.38%	0.0%
8	02/07/2023	60.38%	71.38%	0.0%
9	16/07/2023	63.94%	74.94%	57.8%
10	30/07/2023	65.25%	79.81%	57.8%
11	13/08/2023	65.25%	90.47%	57.8%
12	27/08/2023	67.49%	90.47%	57.8%
13	10/09/2023	69.73%	92.71%	57.8%
14	24/09/2023	74.60%	92.71%	57.8%
15	08/10/2023	84.67%	92.71%	57.8%
16	22/10/2023	88.23%	92.71%	57.8%
17	05/11/2023	88.23%	93.12%	57.8%
18	19/11/2023	91.78%	93.35%	57.8%
19	03/12/2023	94.02%	95.68%	57.8%
20	17/12/2023	96.27%	98.46%	96.3%
21	31/12/2023	100.00%	100.00%	96.3%
22	14/01/2024	100.00%		

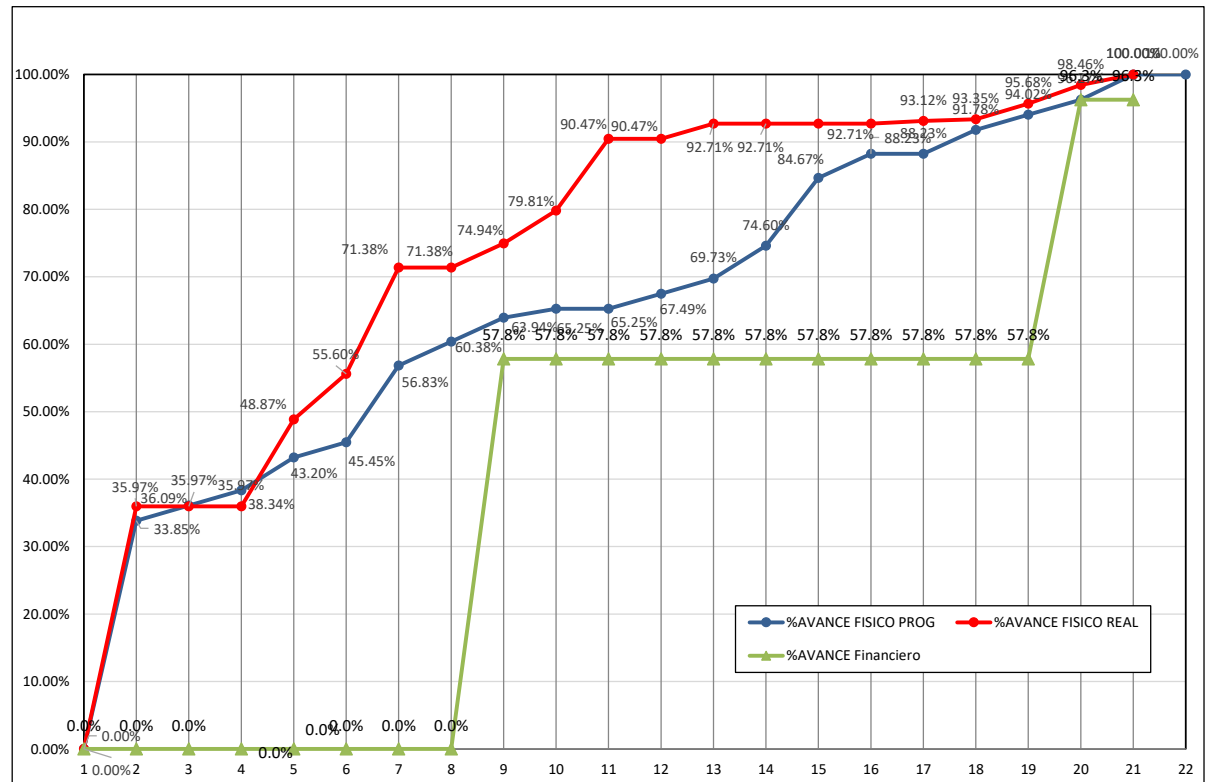

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
