

## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

**Obra:** IP 001 D/2023 TRABAJOS DE GEOTECNIA Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE PAVIMENTO DE LA CALLE CIRCUITO ESCUELAS EN LA COMUNIDAD DENOMINADA LA CONCEPCION (22°02'03.7"N;102°17'52.1"W) Y DE PAVIMENTO DE LA CALLE ALAMILLOS EN LA COLONIA MACARIO J. GOMEZ (21°58'41.5" N;102°14'47.4"W), DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS., CON DOS SONDEOS TIPO PCA A 1.5 M DE PROFUNDIDAD EXCAVADOS CON EQUIPO.

**Ubicación:** SAN FRANCISCO DE LOS ROMO **Contrato:** IP 001 D/2023

**Tipo de inversión:** IP INGRESOS PROPIOS 2023 **Contratista:** Ing. Luis Gerardo del Muro Caldera


**Programa:** U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DES. REG. **Inicio Vigente:** viernes, 21 de abril de 2023 **Días de Obra:** 8 **270**

**Subprograma:** 03 SERVICIOS **Inicio Real:** viernes, 21 de abril de 2023 **Monto Contratado:** \$46,541.78 **\$137,069.08**

**Residente:** ING. CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA **Fin Vigente:** viernes, 28 de abril de 2023 **Monto Ejercido:** \$46,541.78 **\$137,069.08**

**Fin Real:** viernes, 28 de abril de 2023

| SEMANA | FECHA      | %AVANCE FISICO PROG | %AVANCE FISICO REAL | %AVANCE Financiero |
|--------|------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1      | 21/04/2023 | 0.00%               | 0.00%               | 0.0%               |
| 2      | 06/05/2023 | 100.00%             | 100.00%             | 0.0%               |
| 3      | 21/05/2023 | 100.00%             | 100.00%             | 100.0%             |
| 4      | 05/06/2023 | 100.00%             | 100.00%             | 100.0%             |
| 5      | 20/06/2023 | 100.00%             | 100.00%             | 100.0%             |
| 6      | 05/07/2023 | 100.00%             | 100.00%             | 100.0%             |

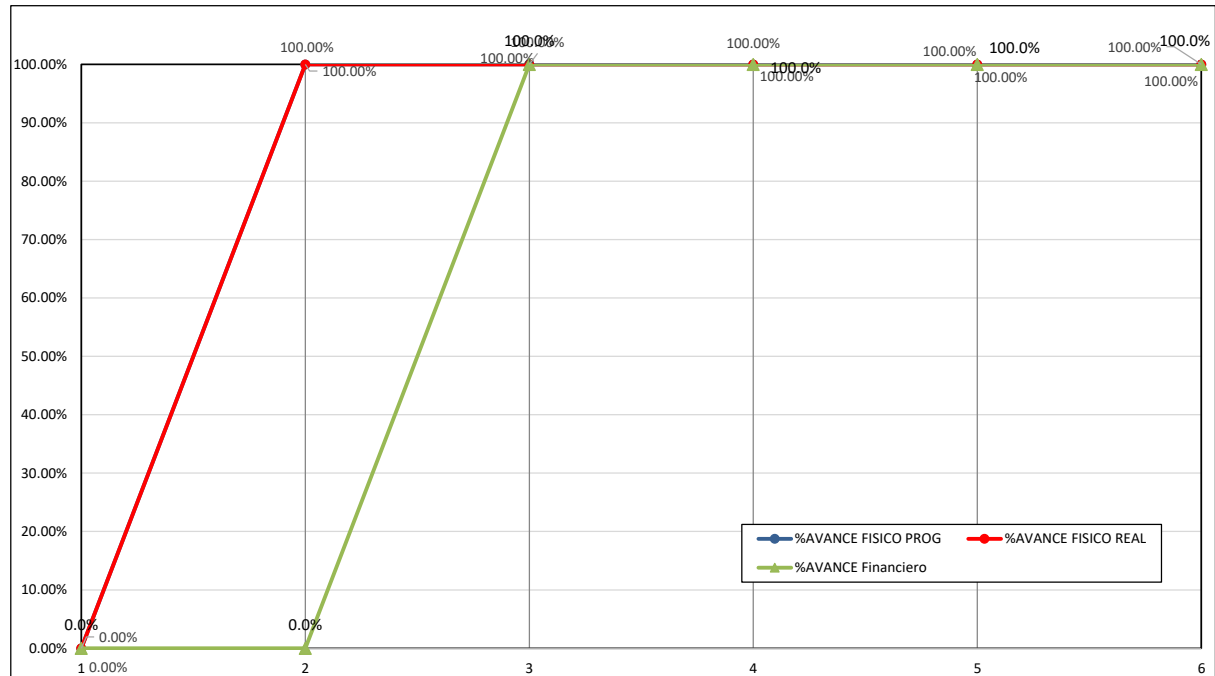

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
