

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: IP 001 E/2023 PROYECTO EJECUTIVO VIALIDADES Y BOULEVAR BENITO JUÁREZ SUR DE AV. SAUCE-LA PAZ AL NORTE Y CARLOS SALINAS DE GORTARI AL SUR, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.

Ubicación: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Contrato: IP 001 E/2023

Tipo de inversión: IP INGRESOS PROPIOS 2023

Contratista: ANTONIO FRANCISCO MUÑOZ RODRIGUEZ

Programa: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DES. REG.

Inicio Vigente: sábado, 29 de abril de 2023 **Días de Obra:** **30** **270**

Subprograma: 03 SERVICIOS


Inicio Real: sábado, 29 de abril de 2023 **Monto Contratado:** **\$299,893.64** **\$137,069.08**

Residente: ARQ. LUIS FERNANDO MARTINEZ REYES

Fin Vigente: domingo, 28 de mayo de 2023 **Monto Ejercido:** **\$299,893.64** **\$137,069.08**

Fin Real: domingo, 28 de mayo de 2023

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	29/04/2023	0.00%	0.00%	0.0%
2	15/05/2023	35.04%	35.04%	0.0%
3	30/05/2023	100.00%	100.00%	100.0%
4	14/06/2023	100.00%	100.00%	100.0%
5	29/06/2023	100.00%	100.00%	100.0%
6	14/07/2023	100.00%	100.00%	100.0%

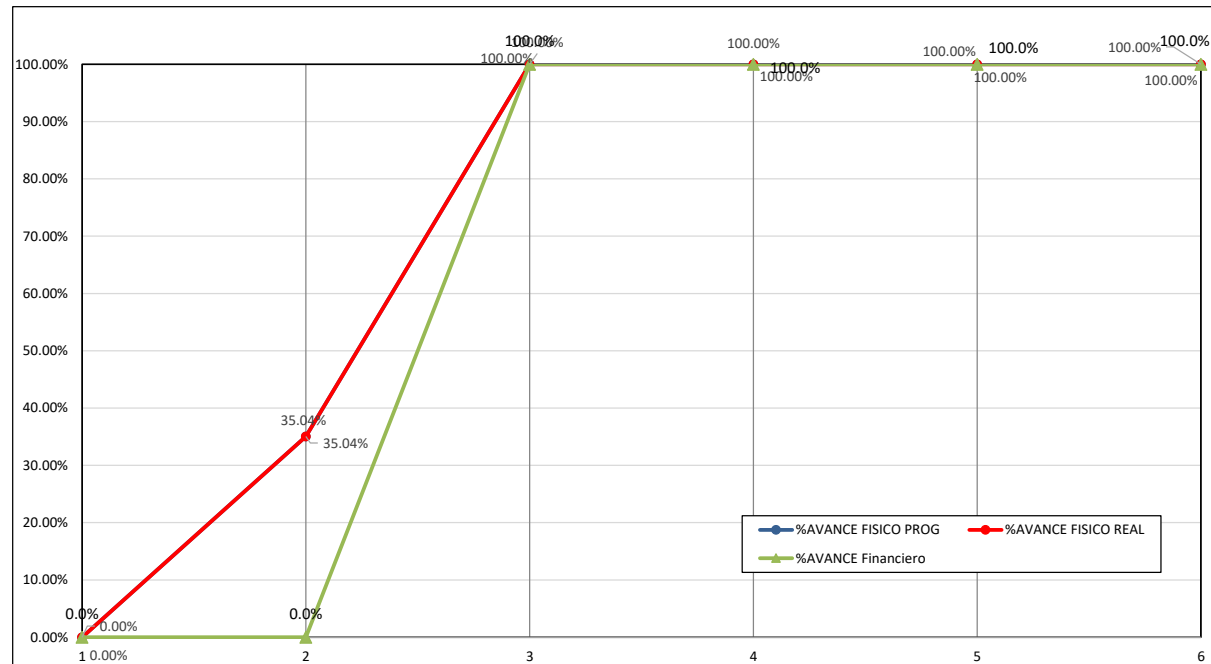

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
