

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: IP 001 G/2023 PROYECTO EJECUTIVO DE LA AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, PARA USO DOMÉSTICO, EN LAS CALLES DEL MONTE Y MISERIA, DE LA COMUNIDAD MACARIO J. GÓMEZ Y EN LA CALLE LA CONCEPCIÓN (LADO PONIENTE) Y CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA, DE LA COMUNIDAD EL PUERTECITO DE LA VIRGEN, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.;

Ubicación: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Contrato: IP 001 G/2023

Tipo de inversión: IP INGRESOS PROPIOS 2023

Contratista: Ma. de Lourdes Guerrero Flores

Programa: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DES. REG.

Inicio Vigente: viernes, 23 de junio de 2023

Días de Obra: 60

Subprograma: 03 SERVICIOS

Inicio Real: viernes, 23 de junio de 2023

Monto Contratado: \$89,674.45


Residente: ARQ. LUIS FERNANDO MARTINEZ REYES

Fin Vigente: lunes, 21 de agosto de 2023

Monto Ejercido: \$89,674.45

Fin Real: lunes, 21 de agosto de 2023

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	23/06/2023	0.00%	0.00%	0.0%
2	30/06/2023	41.54%	41.54%	0.0%
3	15/07/2023	53.57%	53.57%	0.0%
4	31/07/2023	59.16%	59.16%	0.0%
5	15/08/2023	88.61%	88.61%	0.0%
6	30/08/2023	100.00%	100.00%	0.0%
7	14/09/2023	100.00%	100.00%	100.0%
8	29/09/2023	100.00%	100.00%	100.0%
9	14/10/2023	100.00%	100.00%	100.0%

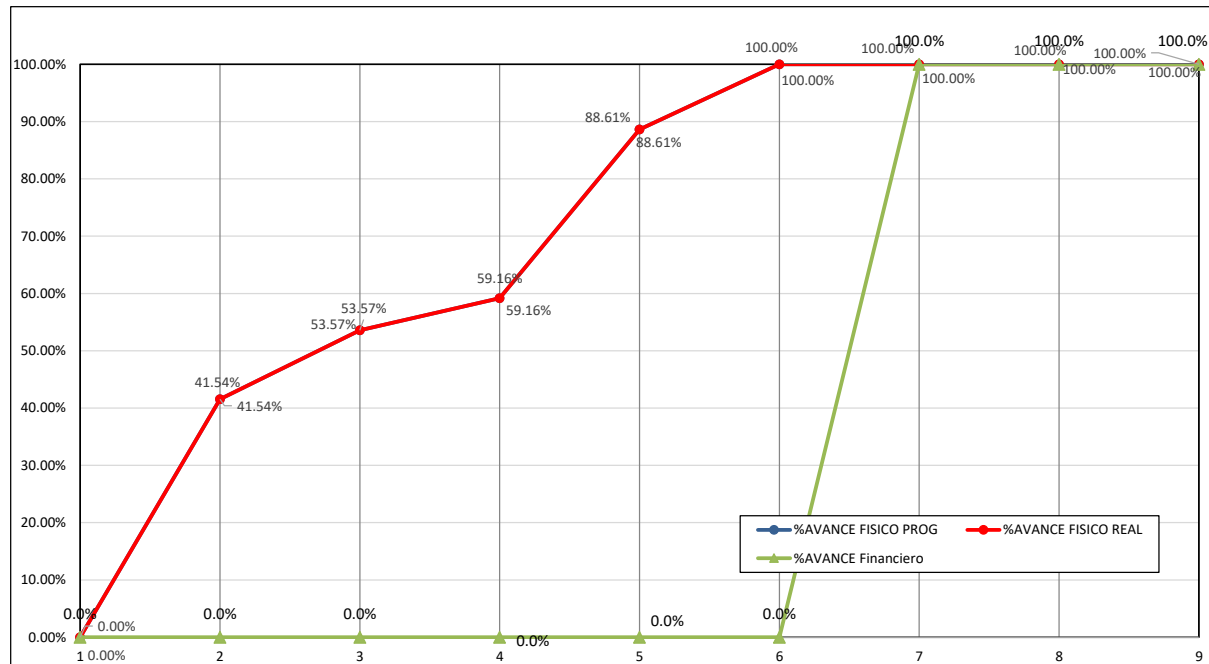

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
