


## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA


**Obra:** IP 001 I/2023 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - TRAMITE DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, PERITO RESPONSABLE DE 18 OBRAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO (CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA).

<b>Ubicación:</b> SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	<b>Contrato:</b> IP 001 I/2023	
<b>Tipo de inversión:</b> IP INGRESOS PROPIOS 2023	<b>Contratista:</b> JESUS ALEJANDRO GUTIERREZ MACIAS	
<b>Programa:</b> U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DES. REG.	<b>Inicio Vigente:</b> miércoles, 19 de julio de 2023	<b>Días de Obra:</b> 150
<b>Subprograma:</b> 03 SERVICIOS	<b>Inicio Real:</b> miércoles, 19 de julio de 2023	<b>Monto Contratado:</b> \$149,918.40
<b>Residente:</b> ARQ. LUIS FERNANDO MARTINEZ REYES	<b>Fin Vigente:</b> miércoles, 27 de diciembre de 2023	<b>Monto Ejercido:</b>
	<b>Fin Real:</b> miércoles, 27 de diciembre de 2023	

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	24/07/2023	10.00%	10.02%	0.0%
2	31/07/2023	20.00%	20.01%	0.0%
3	07/08/2023	23.30%	23.31%	0.0%
4	14/08/2023	26.60%	26.61%	0.0%
5	21/08/2023	29.90%	29.90%	0.0%
6	28/08/2023	33.30%	33.35%	0.0%
7	07/09/2023	36.50%	36.52%	0.0%
8	14/09/2023	39.90%	39.91%	0.0%
9	21/09/2023	43.30%	43.32%	0.0%
10	28/09/2023	46.60%	46.62%	0.0%
11	07/10/2023	49.90%	49.92%	0.0%
12	14/10/2023	49.90%	49.92%	53.4%
13	21/10/2023	49.90%	49.92%	53.4%
14	28/10/2023	53.50%	53.55%	53.4%
15	07/11/2023	56.60%	56.61%	53.4%
16	14/11/2023	59.90%	59.93%	80.5%
17	21/11/2023	63.20%	63.24%	80.5%
18	28/11/2023	66.60%	66.63%	80.5%
19	07/12/2023	74.90%	74.91%	80.5%
20	14/12/2023	83.20%	83.22%	92.7%
21	21/12/2023	91.60%	91.62%	92.7%
22	28/12/2023	100.00%	100.00%	
23	04/01/2024	100.00%	100.00%	

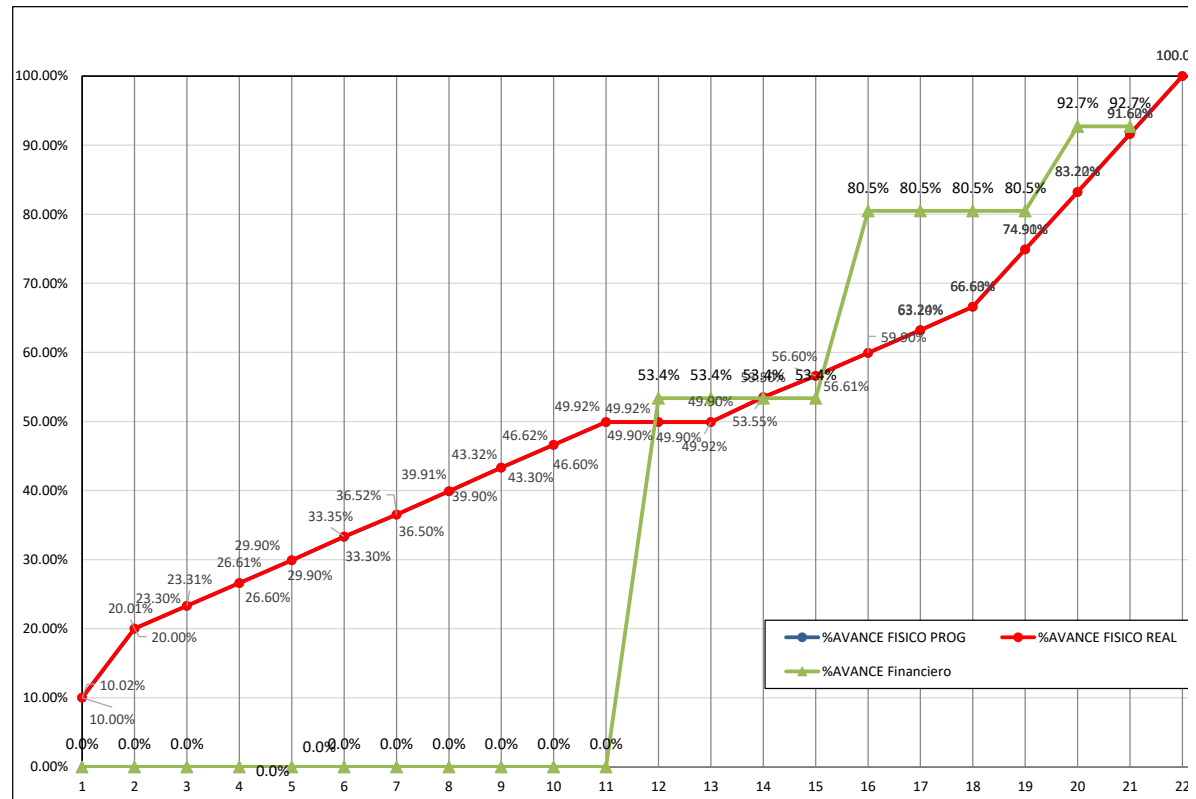

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**



DS
