


## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

**Obra:** IP 001/2023SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS  
**Ubicación:** SAN FRANCISCO DE LOS ROMO **Contrato:** IP 001 J/2023  
**Tipo de inversión:** IP INGRESOS PROPIOS 2023 **Contratista:** INGENIERIA PROYECTO Y CONTROL DE OBRA, S. DE R.L. DE C.V.  
**Programa:** U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DES. REG. **Inicio Vigente:** miércoles, 6 de diciembre de 2023 **Días de Obra:** 15  
**Subprograma:** 03 SERVICIOS **Inicio Real:** miércoles, 6 de diciembre de 2023 **Monto Contratado:** \$ 39,614.00  
**Residente:** ING. CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA **Fin Vigente:** miércoles, 20 de diciembre de 2023 **Monto Ejercido:**  
**Fin Real:** miércoles, 20 de diciembre de 2023

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	09/12/2023	48.90%	48.90%	0.0%
2	16/12/2023	70.86%	70.86%	0.0%
3	23/12/2023	100.00%	100.00%	0.0%
4	30/12/2023	100.00%	100.00%	0.0%
5	06/01/2024	100.00%	100.00%	
6	13/01/2024	100.00%	100.00%	
7	20/01/2024	100.00%	100.00%	
8	27/01/2024	100.00%	100.00%	
9	03/02/2024	100.00%	100.00%	
10	10/02/2024	100.00%	100.00%	
11	17/02/2024	100.00%	100.00%	

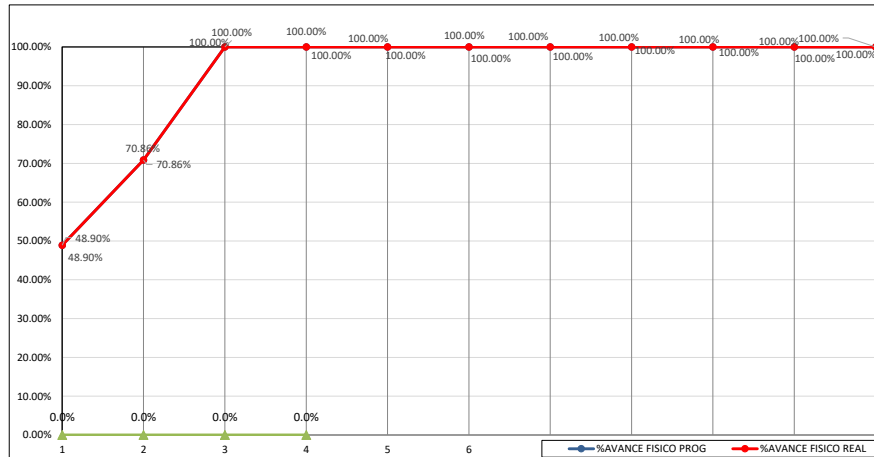

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
