

## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

**Obra:** IP 001/2023SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

ENTREGA DE OBRA A LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE LA AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, PARA USO DOMÉSTICO, EN LA CALLE LA CONCEPCIÓN (LADO PONIENTE) Y CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA, DE LA COMUNIDAD EL PUERTECITO DE LA VIRGEN, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS Y DE LA AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, PARA USO DOMÉSTICO, EN LA CALLE MISERIA Y CALLE DEL MONTE , DE LA COMUNIDAD MACARIO J. GÓMEZ, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.;

**Ubicación:** SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

**Contrato:** IP 001 K/2023

**Tipo de inversión:** IP INGRESOS PROPIOS 2023

**Contratista:** ECOSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,

**Programa:** U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DES. REG.

**Inicio Vigente:** viernes, 15 de diciembre de 2023

**Días de Obra:** 30

**Subprograma:** 03 SERVICIOS

**Inicio Real:** viernes, 15 de diciembre de 2023

**Monto Contratado:** \$ 60,466.00


**Residente:** ARQ. LUIS FERNANDO MARTINEZ REYES

**Fin Vigente:** sábado, 13 de enero de 2024

**Monto Ejercido:**

**Fin Real:** sábado, 13 de enero de 2024

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG.	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	18/12/2023	2.35%	2.38%	0.0%
2	25/12/2023	25.12%	25.14%	0.0%
3	01/01/2024	44.13%	44.16%	0.0%
4	08/01/2024	89.36%		
5	15/01/2024	100.00%		
6	22/01/2024	100.00%		
7	29/01/2024	100.00%		
8	05/02/2024	100.00%		
9	12/02/2024	100.00%		
10	19/02/2024	100.00%		
11	26/02/2024	100.00%		

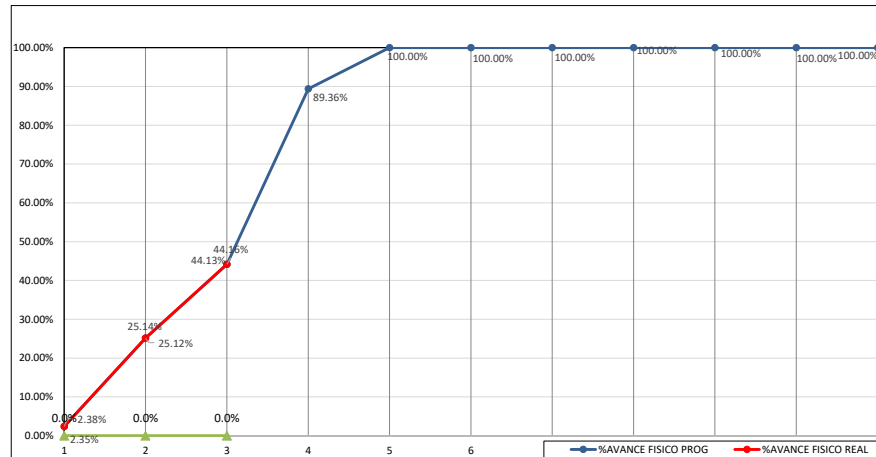

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
