


### GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

**Obra:** IPR 001/2023REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO (SEGUNDA ETAPA)  
**Ubicación:** VIÑEDOS RIBIER, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO      **Contrato:** IPR 001 /2023  
**Tipo de inversión:** INGRESOS PROPIOS REMANENTE DEL EJERCICIO 2022      **Contratista:** ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,  
**Programa:** SD ALCANTARILLADO      **Inicio Vigente:** jueves, 3 de agosto de 2023      **Días de Obra:** 75  
**Subprograma:** 01 REHABILITACIÓN      **Inicio Real:** jueves, 3 de agosto de 2023      **Monto Contratado:** \$ 1,703,798.22  
**Residente:** ING. MIGUEL ANGEL SILVA SERNA      **Fin Vigente:** lunes, 16 de octubre de 2023      **Monto Ejercido:** \$ 1,703,798.22  
**Fin Real:** lunes, 16 de octubre de 2023

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	07/08/2023	0.35%	0.38%	47.4%
2	14/08/2023	1.56%	1.58%	47.4%
3	21/08/2023	6.12%	6.15%	47.4%
4	28/08/2023	8.14%	8.16%	52.7%
5	04/09/2023	10.97%	10.99%	52.7%
6	11/09/2023	36.29%	36.30%	52.7%
7	18/09/2023	63.11%	63.14%	65.8%
8	25/09/2023	86.63%	86.66%	65.8%
9	02/10/2023	92.73%	92.74%	86.0%
10	09/10/2023	97.64%	97.66%	86.0%
11	16/10/2023	100.00%	100.00%	94.7%
12	23/10/2023	100.00%	100.00%	94.7%
13	30/10/2023	100.00%	100.00%	100.0%
14	06/11/2023	100.00%	100.00%	100.0%

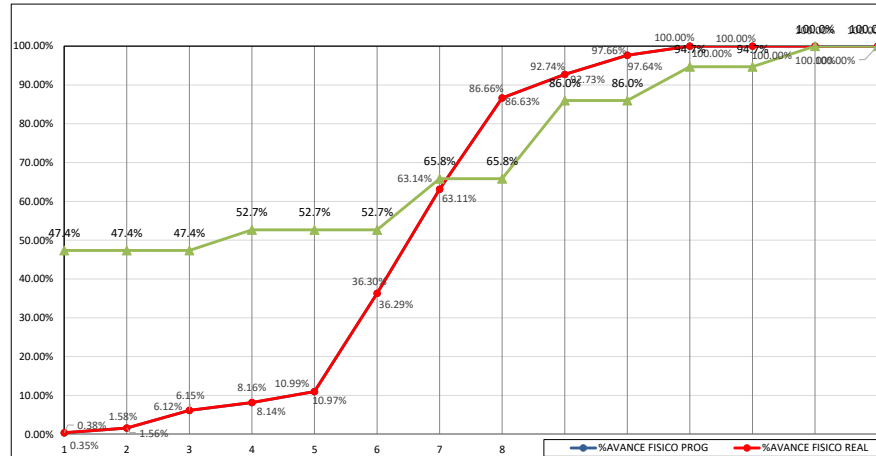

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
