

## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

**Obra:** IPR 003/2023CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CALLE NOGALES #109

**Ubicación:** LA CONCEPCIÓN, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

**Contrato:** IPR 003/2023

**Tipo de inversión:** INGRESOS PROPIOS REMANENTE DEL EJERCICIO 2022

**Contratista:** BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL CENTRO, S. A. DE C.V.

**Programa:** SH VIVIENDA DIGNA

**Inicio Vigente:** jueves, 17 de agosto de 2023

**Días de Obra:** 30

**Subprograma:** 02 AMPLIACION

**Inicio Real:** jueves, 17 de agosto de 2023

**Monto Contratado:** \$ 149,984.14

**Residente:** ING. MIGUEL ANGEL SILVA SERNA


**Fin Vigente:** viernes, 15 de septiembre de 2023

**Monto Ejercido:** \$ 135,292.29

**Fin Real:** viernes, 15 de septiembre de 2023

Se solicita Nota de credito

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	21/08/2023	0.79%	0.79%	0.0%
2	28/08/2023	15.82%	15.82%	0.0%
3	04/09/2023	33.76%	33.76%	0.0%
4	11/09/2023	71.27%	71.27%	56.1%
5	18/09/2023	100.00%	100.00%	56.1%
6	25/09/2023	100.00%	100.00%	56.1%
7	02/10/2023	100.00%	100.00%	56.1%
8	09/10/2023	100.00%	100.00%	56.1%
9	16/10/2023	100.00%	100.00%	90.2%

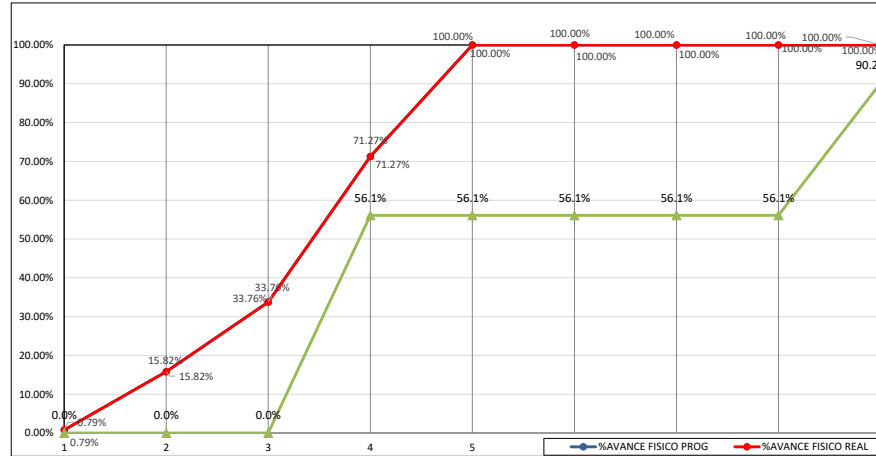

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
