

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: PF 001 /2023 CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN GALERIAS, COMPLEJO J. GUADALUPE POSADA, Y REHABILITACIÓN DE ARMERÍAS EN SUBCOMANDANCIA DEL FRACC. LA RIBERA, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Ubicación: CABECERA Y FRACC. LA RIBERA

Contrato: PF 001 /2023

Tipo de inversión: PARTICIPACIONES FEDERALES 2023

Contratista: C. Sergio Moreno Gutiérrez

Programa: DA EDIFICIOS PÚBLICOS

Inicio Vigente: viernes, 5 de mayo de 2023 **Días de Obra:** 90

Subprograma: 03,01 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN


Inicio Real: viernes, 5 de mayo de 2023 **Monto Contratado:** \$1,728,083.34

Residente: ARQ. FRANCISCO LOZANO SILVA

Fin Vigente: miércoles, 2 de agosto de 2023 **Monto Ejercido:** \$1,728,083.34

Fin Real: miércoles, 2 de agosto de 2023

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	05/05/2023	0.00%	0.00%	49.3%
2	15/05/2023	3.30%	3.33%	49.3%
3	30/05/2023	25.53%	25.55%	59.9%
4	15/06/2023	45.97%	45.98%	68.2%
5	30/06/2023	60.85%	60.88%	68.2%
6	15/07/2023	71.69%	71.70%	68.2%
7	30/07/2023	95.29%	95.32%	85.2%
8	14/08/2023	100.00%	100.00%	100.0%
9	29/08/2023	100.00%	100.00%	100.0%

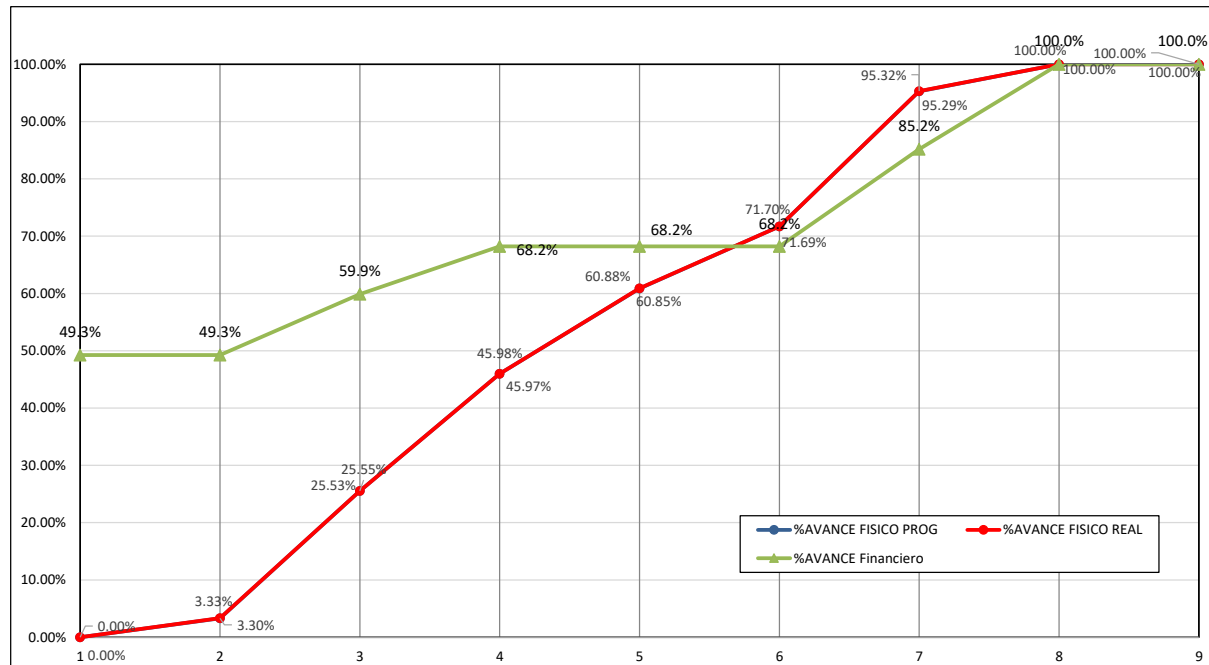

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
