

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: PF 004 /2023 RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE ALAMILLO TRAMO CALLE SABINO - MEZQUITE

Ubicación: COLONIA MACARIO J. GÓMEZ

Contrato: PF 004 /2023

Tipo de inversión: PARTICIPACIONES FEDERALES 2023

Contratista: EDIFICACIONES Y PROYECTOS MARQUE, S.A. DE C.V

Programa: SF PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

Inicio Vigente: miércoles, 8 de noviembre de 2023

Días de Obra: 30

Subprograma: 01 CONCRETO

Inicio Real: miércoles, 8 de noviembre de 2023

Monto Contratado: \$ 943,093.90


Residente: URB. SERGIO MARQUEZ LEON

Fin Vigente: jueves, 7 de diciembre de 2023

Monto Ejercido: \$ 943,093.90


Fin Real: jueves, 7 de diciembre de 2023

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	08/11/2023	0.00%	0.00%	50.0%
2	18/11/2023	22.34%	22.36%	50.0%
3	03/12/2023	71.95%	71.99%	50.0%
4	19/12/2023	100.00%	100.00%	58.4%
5	03/01/2024	100.00%	100.00%	
6	18/01/2024	100.00%	100.00%	
7	02/02/2024	100.00%	100.00%	
8	17/02/2024	100.00%	100.00%	
9	03/03/2024	100.00%	100.00%	

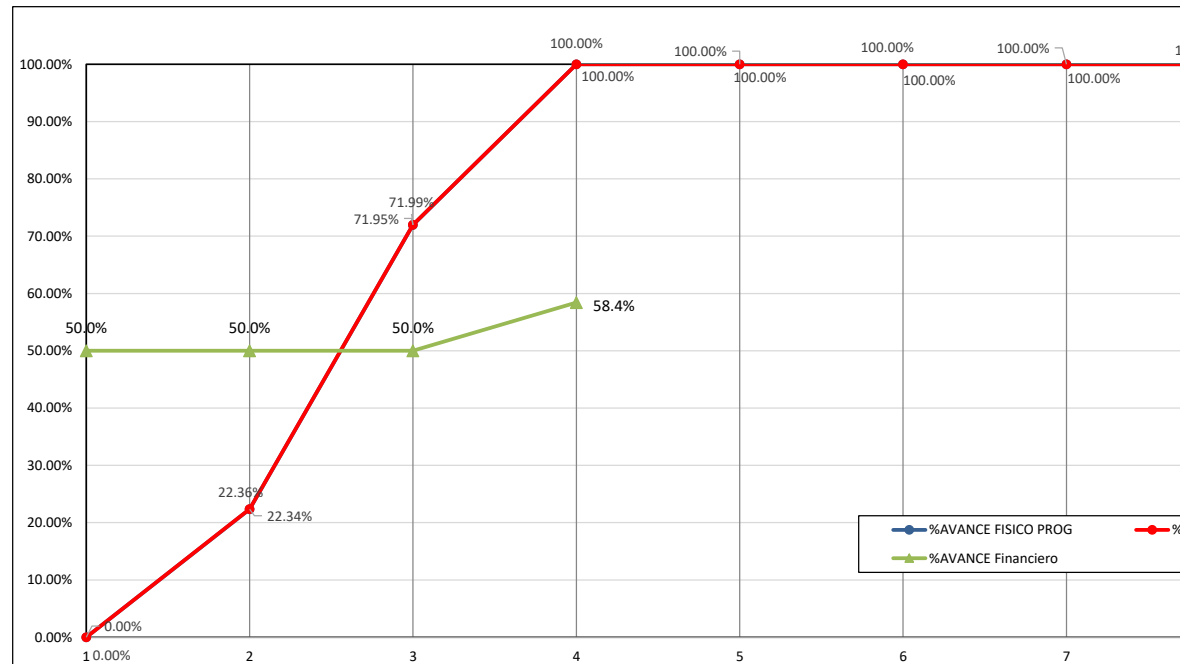

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO I

[Empty rectangular box]



DE LOS ROMO
