


## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

**Obra:** PF 006 /2023 PAVIMENTACIÓN CIRCUITO ESCUELAS

**Ubicación:** LA CONCEPCIÓN  
**Tipo de inversión:** PARTICIPACIONES FEDERALES 2023  
**Programa:** SF PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES  
**Subprograma:** 01 CONCRETO  
**Residente:** ING. CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA

**Contrato:** PF 006 /2023  
**Contratista:** BOMBAS VERTICALES BNJ, S.A. DE C.V.  
**Inicio Vigente:** miércoles, 8 de noviembre de 2023 **Días de Obra:** 60  
**Inicio Real:** miércoles, 8 de noviembre de 2023 **Monto Contratado:** \$ 1,763,000.96  
**Fin Vigente:** sábado, 6 de enero de 2024 **Monto Ejercido:**  
**Fin Real:** sábado, 6 de enero de 2024

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	11/11/2023	0.77%	0.78%	50.0%
2	18/11/2023	3.05%	3.07%	50.0%
3	25/11/2023	8.59%	8.61%	50.0%
4	02/12/2023	32.13%	32.14%	50.0%
5	09/12/2023	54.02%	54.06%	58.9%
6	16/12/2023	74.00%	74.00%	58.9%
7	23/12/2023	91.80%	91.82%	83.2%
8	30/12/2023	98.56%	98.57%	83.2%
9	14/01/2024	100.00%		
10	29/01/2024	100.00%		

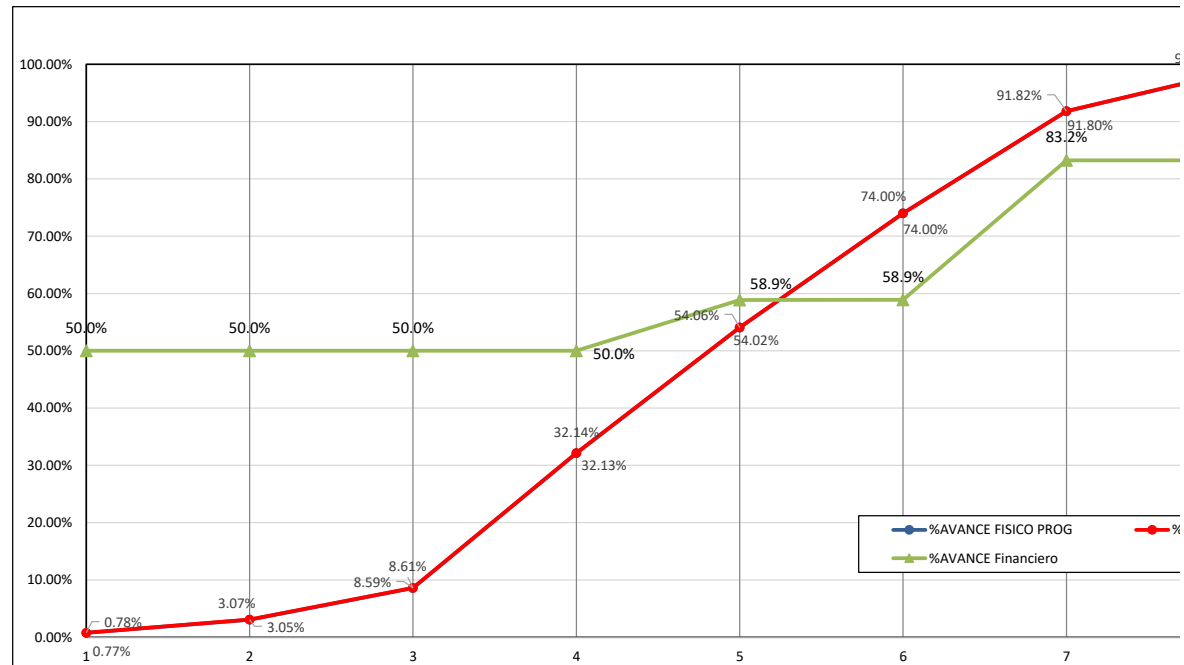

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO**



DE LOS ROMO
