


## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

**Obra:** PF 008/2023 CONSTRUCCIÓN DE FOSAS EN EL PANTEÓN MUNICIPAL DE CABECERA


**Ubicación:** CABECERA MUNICIPAL  
**Tipo de inversión:** PARTICIPACIONES FEDERALES 2023  
**Programa:** DA EDIFICIOS PUBLICOS  
**Subprograma:** 03 CONSTRUCCION  
**Residente:** ARQ. LUIS FERNANDO MARTINEZ REYES

**Contrato:** PF 008 /2023  
**Contratista:** CAMINOS Y URBANIZACIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.  
**Inicio Vigente:** martes, 12 de diciembre de 2023 **Días de Obra:** 45  
**Inicio Real:** martes, 12 de diciembre de 2023 **Monto Contratado:** \$ 1,780,466.53  
**Fin Vigente:** jueves, 25 de enero de 2024 **Monto Ejercido:**  
**Fin Real:** jueves, 25 de enero de 2024

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	12/12/2023	0.00%	0.00%	43.8%
2	22/12/2023	30.12%	30.14%	43.8%
3	06/01/2024	55.55%		
4	22/01/2024	98.35%		
5	06/02/2024	100.00%		
6	21/02/2024	100.00%		
7	07/03/2024	100.00%		
8	22/03/2024	100.00%		
9	06/04/2024	100.00%		

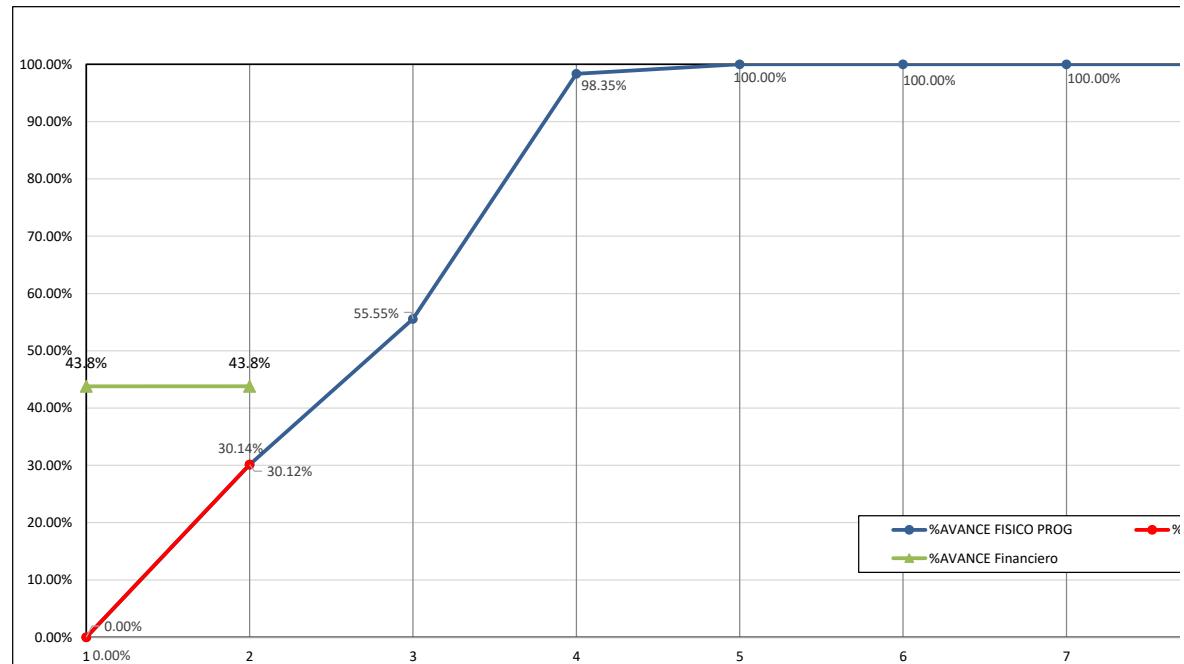

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO L**



**DE LOS ROMO**
