

## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

**Obra:** PFR 001/2022 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ALAMILLO TRAMO DE CALLE FCO. PONCE - SABINO, (1ERA ETAPA).

**Ubicación:** COLONIA MACARIO J. GÓMEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE

**Contrato:** PFR 001/2022

**Tipo de inversión:** PARTICIPACIONES FEDERALES, REMANENTE DEL EJERCICIO 2022

**Contratista:** C. ING. JORGE ARMANDO QUEZADA SOTELO

**Programa:** SF, SE PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES, URBANIZACIÓN

**Inicio Vigente:** viernes, 5 de mayo de 2023

**Días de Obra:** 75

**Subprograma:** 01, 03 CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS

**Inicio Real:** viernes, 5 de mayo de 2023

**Monto Contratado:** \$ 1,746,433.73

**Residente:** URB. SERGIO MARQUEZ LEON


**Fin Vigente:** martes, 18 de julio de 2023

**Monto Ejercido:** \$ 1,746,270.43

**Fin Real:** martes, 18 de julio de 2023

Se solicita Nota de credito

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	05/05/2023	0.00%	0.00%	40.8%
2	15/05/2023	2.62%	2.64%	40.8%
3	30/05/2023	10.24%	10.26%	40.8%
4	15/06/2023	30.32%	30.35%	49.5%
5	30/06/2023	46.91%	46.92%	72.0%
6	15/07/2023	96.60%	96.62%	80.8%
7	30/07/2023	100.00%	100.00%	82.8%
8	14/08/2023	100.00%	100.00%	99.99%
9	29/08/2023	100.00%	100.00%	99.99%

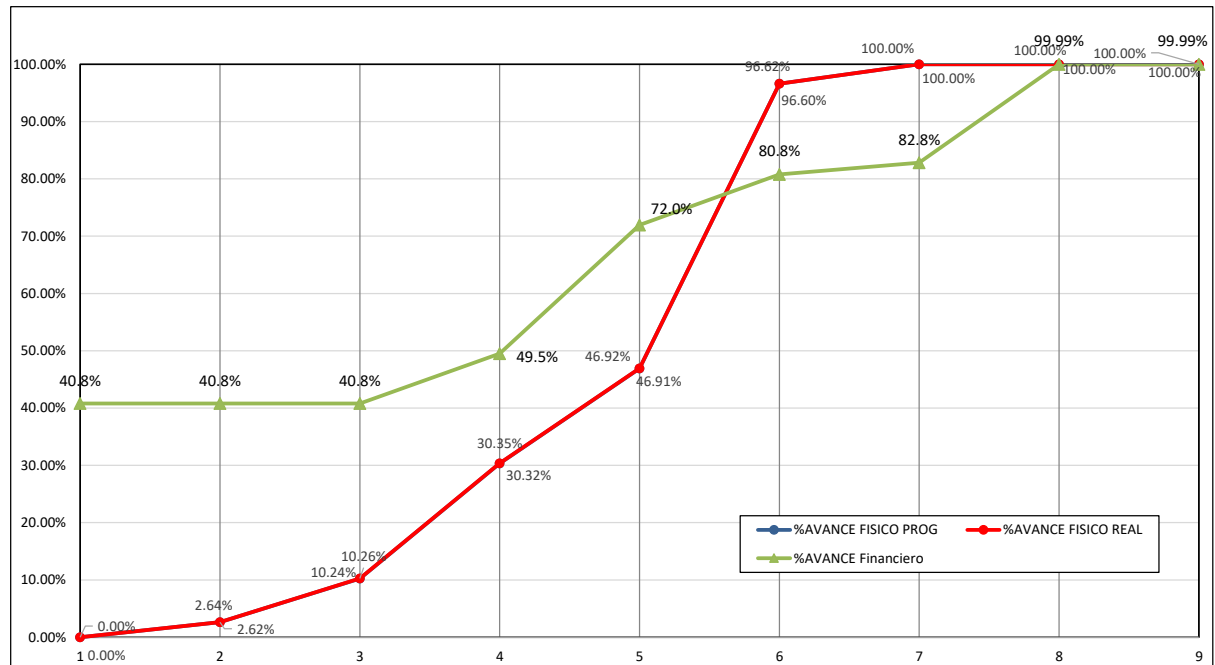

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
