



Usr: SuSaNa  
Rep: rptPoliza

**Municipio de San Francisco de los Romo**  
**ESTADO DE AGUASCALIENTES**

Póliza: C05577 Del 23/12/2022



Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2022  
Página | 02:18 p. m.  
1

Concepto: FISM 2022 PAGADO EST 4 OBRA FIS MDF 001/2022 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE NARANJO EN. GP Folio: 413


Beneficiario: **ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, SA DE CV**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-2501-K012-J04-61402-2	CONSTRUCCIÓN Y/O	\$18,858.87		GP Folio: 413
0002	8260-2501-K012-J04-61402-2	CONSTRUCCIÓN Y/O		\$18,858.87	GP Folio: 413
0003	2113-000710	ODZ ARQUITECTURA Y	\$18,858.87		GP Folio: 413
0004	1112-003-002	Bancomer Cta. 011793039-9 FISM		\$9,266.85	GP Folio: 413
0005	1134-003-008	ODZ Arquitectura y Construccion, SA		\$9,429.44	FISM 2022 PAGADO EST 4 OBRA FIS MDF 001/2022
0006	2117-9-005-001	0.1% COLEGIO DE		\$16.26	FISM 2022 PAGADO EST 4 OBRA FIS MDF 001/2022
0007	2117-9-005-002	0.2% ORGANO SUPERIOR DE		\$32.52	FISM 2022 PAGADO EST 4 OBRA FIS MDF 001/2022
0008	2117-9-005-003	0.2% INST. DE CAPACIT. DE LA		\$32.52	FISM 2022 PAGADO EST 4 OBRA FIS MDF 001/2022
0009	2117-9-005-004	0.5% CONTRALORIA MUNICIPAL		\$81.28	FISM 2022 PAGADO EST 4 OBRA FIS MDF 001/2022
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>37,717.74</u>	<u>37,717.74</u>	

MUNICIPIO DE  
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

-- 2022

**OPERADO**  
OBRA INFRA ESTRUCTURA  
SOCIAL MUNICIPAL



Fecha y hora de consulta

23/12/2022 2:11:01 PM

Contrato

00796395

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO  
DE LOS ROMO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

## Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

## Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

## Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: EST 4 FISDMF 001

Importe de la operación: 9,266.85 MXP

Cuenta de retiro: 0117930399

Cuenta de depósito: 058010000011852247

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE SAN FRA  
NCISCO DE LOS ROMOTitular de la cuenta: ODZ ARQUITECTURA Y  
CONSTRUCCIO

Nombre banco destino: BANREGIO

Fecha de creación: 23/12/2022

Fecha de aplicación: 23/12/2022

Concepto de pago: PAGO EST 4 FISDMF 11-001

Referencia numérica: 231222

Instrumento de seguridad: ASD 6550927880

Hora de captura en el canal: 14:10:54

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000021373

Clave de rastreo: 002601002212230000021373

Folio de firma: 0067660094

Folio único: 1401202212231410540067660100

## Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	100%	23/12/2022
FIRMO	ADMIN1	100%	23/12/2022



EMISOR: ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV  
R.F.C.: OAC210308CZ4  
REGIMEN: R&GIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA  
CIRCUITO AVE DE LOS SEÑORES 167 2 SENDERO DE LOS QUETZALES  
AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES MEXICO C.P. 20358

RP - 37

CFDI versión 3.3 Complemento de Recepción de Pagos  
Tipo de comprobante: P - Pagos  
Expedido en el código postal: 20358  
Uso de CFDI: P01 - Por definir

Cliente: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO  
R.F.C.: MSF920130TQ9  
Domicilio: FCO ROMO JIMENEZ 102 SAN JOSE DE BUENAVISTA San Francisco de los  
Romo Aguascalientes México C.P. 20300 Tel.

#	Cantidad	Unidad	ClaveProdServ	Descripción	Descuento	Precio	Importe
1	1	ACT	84111506	Pago	0.00	0.00	0.00

Complemento de Recepción de Pagos

Fecha de Pago: 2022-12-23 T 12:00:00  
Moneda:MXN  
RFC Emisor Cta. Ordenante:  
RFC Emisor Cta. Ben.:  
Cert. Pago:  
Cadena Pago:

Forma de Pago:03 - Transferencia electrónica de fondos  
Tipo de Cambio \$:1.0000  
Nom. Banco Ordenante:  
Cta. Beneficiario:  
Sello Pago:

Monto Total del Pago \$:9,266.85  
Número de Operación:A68  
Num. Cta. Ordenante:  
Tipo Cad. Pago:01

#	UUID	Folio	Moneda	Tipo Cambio	M. de Pago	Parcialidad	Saldo Ant.	Saldo Nuevo	Pago
1	a312c45a-e915-4314-88d4-109f6cf4aa7a	A - 68	MXN	1.0000	PPD	5	9266.88	0.03	9266.85

MUNICIPIO DE  
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

2022

OPERADO  
OBRA INFRA ESTRUCTURA  
SOCIAL MUNICIPAL



CANTIDAD CON LETRA: CERO PESOS 00/100 M.N. TOTAL \$ 0.00

MONEDA: XXX  
TIPO DE CAMBIO: N/A  
CERTIFICADO EMISOR: 00001000000507943105  
CERTIFICADO S.A.T.: 00001000000509846663  
FECHA Y HORA DE TIMBRADO: 2022-12-23 15:42:22  
FOLIO FISCAL: de53e273-6385-4cab-b727-d09c9c1e12e6



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[|1.1|de53e273-6385-4cab-b727-d09c9c1e12e6|2022-12-23T15:42:22|LSO1306189R5|aGwq9JTrEAvqHuwbdelOOhwET70lqVvPGHoECBPJ1bAbAqbaYO1sd567ugQvCH/z1vW/BqYrMjXFwSiGI7HMqrZ111mykP/Q/LIF8M89bbUGZvDihB0/TIQRZA55DZvKxSshg0uQmZ88nQf5yk6JNg6lW/C7oQI5vjzjAP1dQHBTM9rGpl+tu3P3vMh7mYb5kiZgcro9reBwndf7thqd7VGeWwhUJ5Nco3EMRSITTz4mceg3zkD8xWpEbyCaSo9+1C2pv0T1IMRgz1Wfnwir0hOGCWyNzhLMLpD+RZvYJuyckP2wWuNCtg7Nh8+u169nQh0lnbY9TT4H9o3wqO9eQ==|00001000000509846663|]

Sello Digital

aGwq9JTrEAvqHuwbdelOOhwET70lqVvPGHoECBPJ1bAbAqbaYO1sd567ugQvCH/z1vW/BqYrMjXFwSiGI7HMqrZ111mykP/Q/LIF8M89bbUGZvDihB0/TIQRZA55DZvKxSshg0uQmZ88nQf5yk6JNg6lW/C7oQI5vjzjAP1dQHBTM9rGpl+tu3P3vMh7mYb5kiZgcro9reBwndf7thqd7VGeWwhUJ5Nco3EMRSITTz4mceg3zkD8xWpEbyCaSo9+1C2pv0T1IMRgz1Wfnwir0hOGCWyNzhLMLpD+RZvYJuyckP2wWuNCtg7Nh8+u169nQh0lnbY9TT4H9o3wqO9eQ==

Sello Digital del SAT

ObeAcF7EKck2iDjc75toPolK6U6avE7jflXPEqjUIPIICd5YL667/Pu1i+ih3YI4rOldVCK81qaOZAUB8youTop7Y+WixV+rlx4YdxRwgGapuesJAE9EajYb5KoQ8+fuMKYF+MSlJ9oiC14xcFcTs/GklugLT1Eaq9AUXDXNT5Cznh/g+n7908rPukE5KHykuDGrf+0BL3Eud5hFuqibBksvzOwdA18yXc3qqbGqHxNRk542e+89bKdm07CIEYIVTG0FRNfn4ve6mXKPyNJOaZmVf5Spg35kVdu3L+c35i07BCRE6++Lyg4HAofq4ydaPRF/2SS+eh1QNnWDg==

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="aGwq9JTrEAvqHuwbdelOOhwET7OiqVyPGHoECBPJ1bAbAqbaYO1sd567ugQvCH//z1vW/BqYrMjXFwSiG17HMqrZ111mykP/Q/LIF8M89bbUGZvDtH
Certificado="MIIGJDCCBAygAw1BAGIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDc5NDMxMDUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwgGEMSAwHgYDVQDDbBdVVRPUklI
LugarExpedicion="20358" TipoDeComprobante="P" Total="0" Moneda="XXX" SubTotal="0" NoCertificado="00001000000507943105" Fecha="2022-12-23T15:42:18"
Folio="37" Serie="RP" Version="3.3" xmlns:pago10="http://www.sat.gob.mx/Pagos" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/Pagos
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pagos/Pagos10.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="626" Nombre="ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV" Rfc="OAC210308CZ4"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO" Rfc="MSF920130TQ9" UsoCFDI="P01"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="0" ValorUnitario="0" Descripcion="Pago" ClaveUnidad="ACT" Cantidad="1" ClaveProdServ="84111506"/>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Complemento>
    - <pago10:Pagos Version="1.0">
      - <pago10:Pago Monto="9266.85" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="03" FechaPago="2022-12-23T12:00:00">
        <pago10:DoctoRelacionado Folio="68" Serie="A" ImpSaldoInsoluto="0.03" ImpPagado="9266.85" ImpSaldoAnt="9266.88" NumParcialidad="5"
          MetodoDePagoDR="PPD" MonedaDR="MXN" IdDocumento="a312c45a-e915-4314-88d4-109f6cf4aa7a"/>
      </pago10:Pago>
    </pago10:Pagos>
  </cfdi:Complemento>
  <cfdi:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
    instance" xmlns:tfid="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
    SelloSAT="ObeAcF7EKck2iDjc75toPolK6U6avE7jflXPEqjUIPIICd5YL667/Pu1i+ih3Yl4rOIdVCK81qaQZAUb8youT0p7Y+WiXV+rlx4YdxRwgGa
    NoCertificadoSAT="00001000000509846663"
    SelloCFD="aGwq9JTrEAvqHuwbdelOOhwET7OiqVyPGHoECBPJ1bAbAqbaYO1sd567ugQvCH//z1vW/BqYrMjXFwSiG17HMqrZ111mykP/Q/LIF
    RfcProvCertif="LSO1306189R5" FechaTimbrado="2022-12-23T15:42:22" UUID="de53e273-6385-4cab-b727-d09c9c1e12e6"/>
  </cfdi:TimbreFiscalDigital>
</cfdi:Comprobante>

```

MUNICIPIO DE  
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO  
 -- 2022  
 OPERADO  
 OBRA INFRA ESTRUCTURA  
 SOCIAL MUNICIPAL

# PRE-FACTURA Normal



**PRE-FACTURA DEL CONTRATISTA: ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. (349)**

A NOMBRE DE: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO  
 RFC: MSF920130TQ9  
 DIRECCION: FCO ROMO JIMENEZ 102, SAN JOSE DE BUENAVISTA, SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS,  
 CIUDAD: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE L ESTADO: AGUASCALIENTES

DESCRIPCION

PAGO DE LA ESTIMACION No. 4 Del 19 Sep 2022 al 03 Oct 2022		MONTO BASE	\$16,257.63
DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE NARANJO ENTRE AVENIDA SAUCE Y CALLE LICENCIADO OTTO GRANADOS ROLDAN	AJUSTE DE COSTOS (+)	\$0.00
UBICADA EN:	COLONIA LOS CEDROS EN CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO	AMORTIZACION DE ANTICIPO (-)	\$8,128.80
CON AMPARO DEL CONTRATO No.:	FISMDF 001/2022	<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$8,128.83</b>
DE FECHA::	06/07/2022	IVA (+)	\$1,300.61
BAJO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA:		<b>SUBTOTAL CON IVA</b>	<b>\$9,429.44</b>
Inversion	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal 2022		
Programa	SD ALCANTARILLADO		
SubPrograma	01 REHABILITACION		
Obra.	FISMDF 001/2022 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE NARANJO ENTRE AVENIDA SAUCE Y CALLE LICEN		
Localizacion	COLONIA LOS CEDROS EN CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO D		
	CAPACITACION DE LOS TRABAJADORES DEL CONTRATISTA	\$32.52 (0.20%)	
	COLEGIOS DE PROFESIONISTAS SEGUN CORRESPONDA	\$16.26 (0.10%)	
	SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	\$0.00 (0.00%)	
	FISCALIZACION DEL H. CONGRESO DEL ESTADO	\$32.52 (0.20%)	
	INSPECCION DE VIGILANCIA PARA LA CONTRALORIA	\$81.29 (0.50%)	
	SERVICIOS RELATIVOS ALAS CONSTRUCCIONES	\$0.00	
		<b>\$162.59</b>	
Avance Físico Real %			
Avance Físico Programado %			
Fecha Terminación Prog.			
		TOTAL DE RETENCIONES (-)	\$162.59
		SANCION POR RETRASO (-)	\$0.00
		<b>SUBTOTAL MENOS RETENCIONES</b>	<b>\$9,266.85</b>
		RETENCION POR RETRASO(-)	\$0.00
		REINTEGRO POR RETENCION	\$0.00
		OTRAS SANCIONES(-)	\$0.00
		<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$9,266.85</b>

NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 85/100 M.N.

MUNICIPIO DE  
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO  
-- 2022  
**OPERADO**  
OBRA INFRA ESTRUCTURA  
SOCIAL MUNICIPAL

# DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

## CÉDULA DE SEGUIMIENTO A ESTIMACIONES DE OBRA

Ayuntamiento de  
**SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**  
2021 • 2024



DATOS GENERALES											
CONTRATISTA: ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.					N° DE CONTRATO: FISMDF 001/2022						
SUPERVISOR: Carlos Armando Chavez Garcia					N° DE OBRA: FISMDF 001/2022						
OBRA: Rehabilitacion de Red de Alcantarillado Calle Naranjo entre Avenida Sauce y Calle Licenciado					N° DE FACTURA: A-68						
Otto Granados Roldan					N° DE ESTIMACION: 4 (cuatro)						
FECHA DE CORTE: DEL: 19/09/2022 AL: 03/10/2022					IMPORTE LIQUIDO: \$ 9,266.85						
FORMATO DE NUMEROS GENERADORES											
INGRESO	REVISION	NOTA			CAPTURA EN SISTEMA	ENTREGA DE PRE-FACTURA					
		Sr. contratista regrese esta cédula con la estimación original de lo contrario no se le dara tramite									
07/10/2022 CONTRATISTA	21/10/2022 SUPERVISOR				21/10/2022 SUPERVISOR					21/10/2022 SUPERVISOR	
FORMATO DE ESTIMACION											
INGRESO	REGISTRO		SUPERVISOR			JEFE DE DEPARTAMENTO					
21/12/2022 CONTRATISTA	21 12 22	22 12 22								21/12/2022 RECIBIDO	21/12/2022 AUTORIZADO
DEVOLUCION					CONTENIDO						
FECHA DE DEVOLUCION: 21/10/2022					<div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO</div>					DIRECTOR GENERAL	
FECHA DE REINGRESO: 21/12/2022										ING. JOSÉ DE JESÚS CHAVEZ GARCÍA	
MOTIVO DE LA DEVOLUCION: falta soporte en generadores										22 12 22    22 12 22	
										RECIBIDO    AUTORIZADO	
										FINANZAS	
										RECIBIDO    AUTORIZADO	
										RECIBIDO    AUTORIZADO	
										RECIBIDO    AUTORIZADO	
										RECIBIDO    AUTORIZADO	
										RECIBIDO    AUTORIZADO	
TRÁMITE DE PAGO											
FECHA DE INICIO DE TRÁMITE EN DOP-SFR			FIRMA DEL DIRECTOR		OFICIO DE LIBERACION			FECHA DE ENTREGA			
07	10	22									
DÍA:	MES:	AÑO:								22	12
			DÍA: MES: AÑO:		DÍA: MES: AÑO:			DIRECCIÓN DE EGRESOS.			

## RESUMEN DE ESTIMACION

Obra.	FISMDF 001/2022 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE NARANJO ENTRE AVENIDA SAUCE Y CALLE LICENCIADO OTTO GRANADOS ROLDAN		Total Contrato	\$1,131,893.85
Localización	COLONIA LOS CEDROS EN CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO D		Total Ampliaciones	\$15,142.14
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal.		Total Contratado	\$1,147,035.99
Programa	SD ALCANTARILLADO		Anticipo ( 50 )%	\$565,946.92
SubPrograma	01 REHABILITACION		Estimado Anterior	\$1,122,464.41
Supervisor	CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA (CAGC9207139Q5)		Esta Estimacion	<b>\$9,429.44</b>
Contratista	ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. (349)		Total Estimado	\$1,131,893.85
Contrato	FISMDF 001/2022	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE NARANJO ENTRE AVENIDA SAUCE Y	Saldo por Estimar	\$15,142.14
Estimacion No.	4	CALLE LICENCIADO OTTO GRANADOS ROLDAN		
Recibí de	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	la Cantidad de:		\$9,429.44 NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N.

<u>GRUPO</u>	<u>PARTIDA</u>	
* EXTRAORDINARIOS		\$236,514.74
- EXTRAORDINARIOS		\$236,514.74
* REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE NARANJO ENTRE AVENIDA SAUCE Y CALLE LICENCIADO OT		\$-220,257.11
- GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO		\$-220,257.11
Fecha Terminación Prog.		
	<b>SUMA</b>	<b>\$16,257.63</b>
	AJUSTE DE COSTOS (+)	\$0.00
	AMORTIZACION DE ANTICIPO (-)	\$8,128.80
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$8,128.83</b>
	IVA (+)	\$1,300.61
	<b>SUBTOTAL CON IVA</b>	<b>\$9,429.44</b>

MUNICIPIO DE  
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

2022

**OPERADO**

ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. (349)  
CONTRATISTA

INGENIERO CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA  
(CAGC9207139Q5)  
SUPERVISOR

# CONCEPTOS DE ESTIMACION

Normal



Obra.	FISMDF 001/2022 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE NARANJO ENTRE AVENIDA SAUCE Y CALLE LICENCIADO OTTO GRANADOS			Total Contrato	\$1,131,893.85
Localización	ROLDAN COLONIA LOS CEDROS EN CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO D			Total Ampliaciones	\$15,142.14
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal.			Total Contratado	\$1,147,035.99
Programa	SD ALCANTARILLADO			Anticipo ( 50 )%	\$565,946.92
SubPrograma	01 REHABILITACION			Estimado Anterior	\$1,122,464.41
Supervisor	CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA (CAGC9207139Q5)			Esta Estimacion	\$9,429.44
Contratista	ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. (349)			Total Estimado	\$1,131,893.85
Contrato	FISMDF 001/2022	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE NARANJO ENTRE AVENIDA SAUCE Y CALLE		Saldo por Estimar	\$15,142.14
Estimacion No.	4	LICENCIADO OTTO GRANADOS ROLDAN Del 19 Sep 2022 al 03 Oct 2022			
Recibí de	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	la Cantidad de:	\$9,429.44 NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N.		

No.	Concepto	Unid. Med	Volumen				Precio Contratado	Importe
			Contratado	Acumulado	Anterior	Actual		

GRUPO: **REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE NARANJO ENTRE AVENIDA SAUCE Y CALLE LICENCIADO OTTO GRANADOS ROLDAN COLONIA LOS CEDROS EN CABECERA MUNIC**

PARTIDA: **GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO**

25	PAVIMENTO HIDRÁULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-38 KG/CM2, T.M.A. 1 1/2" RR 7 DÍAS, GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 10 +- 2 CMS. FRAGUADO NORMAL, DE 16 CMS. DE ESPESOR, INC: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, REGLEADO, ACABADO RAYADO CON CEPILLO DE CERDAS DE ALUMINIO, CON DOBLADOR, CORTE CON DISCO, CALAFATEO CON BACK ROAD (COLA DE RATA), SELLADOR ELASTOMERICO, JUNTAS CONSTRUCTIVAS CON CELOTEX DE 1/2", CURADO CON MEMBRANA QUIMICA BASE AGUA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. DE ACUERDO A PROYECTO.	M2	347.51	0.00	306.24	-306.24		\$666.30	\$-204,047.71
27	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE DIAMANTE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=38KG/CM2, TMA 1 1/2", RESISTENCIA RÁPIDA A LOS 7 DÍAS, DE 16 CM DE ESPESOR Y 1.50 M POR LADO. INCLUYE: FOAMTECH DE 15CMX1/2", ARMADO CON VARILLA DEL No. 3 A CADA 15 CM, ARMEX 1515-4, PELO DE ANGEL 900 GRAMOS M3, TAPA Y BROCAL DE POLIETILENO PARA TRÁFICO PESADO, CORTE 1/3 DE ESPESOR , A CADA ARISTA HACIA CENTRO DE BROCAL	pieza	4.00	0.00	4.00	-4.00		\$4,911.82	\$-19,647.28
28	LIMPIEZA FINAL , INCLUYE: BARRIDO CON AGUA , MATERIALES, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO.	M2	416.16	255.79	0.00	255.79		\$13.44	\$3,437.88
								Total Partida	\$-220,257.11
								Total Grupo	\$-220,257.11

GRUPO: **EXTRAORDINARIOS**

PARTIDA: **EXTRAORDINARIOS**

34	PAVIMENTO HIDRÁULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-38 KG/CM2, T.M.A. 1 1/2" RR 7 DÍAS, GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 10 +- 2 CMS. FRAGUADO NORMAL, DE 16 CMS. DE ESPESOR, INC: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, REGLEADO, ACABADO RAYADO CON CEPILLO DE CERDAS DE ALUMINIO, CON DOBLADOR, CORTE CON DISCO, CALAFATEO CON BACK ROAD (COLA DE RATA), SELLADOR ELASTOMERICO, JUNTAS CONSTRUCTIVAS CON CELOTEX DE 1/2", CURADO CON MEMBRANA QUIMICA BASE AGUA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. DE ACUERDO A PROYECTO.	M2	0.00	336.29	0.00	336.29	336.29	\$651.70	\$219,160.19
----	--	----	------	--------	------	--------	--------	----------	--------------

ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. (OAC210308CZ4)


**OPERADO**  
CONTRATISTA  
**OBRA INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**

INGENIERO CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA  
(CAGC9207139Q5)  
SUPERVISOR

## ESTADO DE CUENTA

Obra.	FISMDF 001/2022 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE NARANJO ENTRE AVENIDA SAUCE Y CALLE LICENCIADO OTTO	Total Contrato	1,131,893.85
Localización	GRANADOS RUI DAN COLONIA LOS CEDROS EN CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO D	Total Ampliaciones	15,142.14
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura So	Total Contratado	1,147,035.99
Programa	SD ALCANTARILLADO	Anticipo ( %)	565,946.92
SubPrograma	01 REHABILITACION	Estimado Anterior	1,122,464.41
Contratista	ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. (349) REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE NARANJO ENTRE AVENIDA SAUCE Y CALLE	Esta Estimacion	<b>9,429.44</b>
Contrato	FISMDF 001/2022 LICENCIADO OTTO GRANADOS RUI DAN	Total Estimado	1,131,893.85
Estimacion No.	4 Del 19 Sep 2022 al 03 Oct 2022	Total por Estimar	15,142.14

No. Estimac.	Período	Importe Estimacion	Amortizacion de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA (+)	Cargo a la Obra	DEDUCCIONES (-)					Retencion (-)	Reintegro (+)	Sanciones (-)	Importe a Pagar	
							CMIC(0)	Colo.Prof.(0)	SFP(0.5)	Conq. Edo.(0.2)	Municipal					ISRuOtro(0)
Anticipo				487,885.28	78,061.64	565,946.92									565,946.92	
1	Del 05 Ago 2022 al 19 Ago	330,789.68	165,394.84	322,490.44	26,463.17	191,858.01	661.58	330.79	0.00	661.58	1,653.95	0.00	0.00	0.00	0.00	188,550.11
2	Del 20 Ago 2022 al 03 Sep	384,009.61	192,004.81	130,485.63	30,720.77	222,725.57	768.02	384.01	0.00	768.02	1,920.05	0.00	0.00	0.00	0.00	218,885.47
3	Del 04 Sep 2022 al 18 Sep	244,713.65	122,356.83	8,128.80	19,577.09	141,933.91	489.43	244.71	0.00	489.43	1,223.57	0.00	0.00	0.00	0.00	139,486.77
4	Del 19 Sep 2022 al 03 Oct	16,257.63	8,128.80	0.00	1,300.61	9,429.44	32.52	16.26	0.00	32.52	81.29	0.00	0.00	0.00	0.00	9,266.85
<b>TOTALES</b>		<b>975,770.57</b>	<b>487,885.28</b>		<b>156,123.28</b>	<b>1,131,893.85</b>	<b>1,951.55</b>	<b>975.77</b>	<b>0.00</b>	<b>1,951.55</b>	<b>4,878.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,122,136.12</b>




MUNICIPIO DE  
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

-- 2022

**OPERADO**  
OBRA INFRA ESTRUCTURA  
SOCIAL MUNICIPAL

No.	Concepto	Unid. Med	Volumen					Precio Contratado	Importe
			Contratado	Acumulado	Anterior	Actual	Excedente		
35	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE DIAMANTE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=38KG/CM2, TMA 1 1/2", RESISTENCIA RÁPIDA A LOS 7 DÍAS, DE 16 CM DE ESPESOR Y 1.50 M POR LADO. INCLUYE: ARMADO CON VARILLA DEL No. 3 A CADA 15 CM, ARMEX 1515-4, PELO DE ANGEL 900 GRAMOS M3, TAPA Y BROCAL DE POLIETILENO PARA TRÁFICO PESADO, CORTE 1/3 DE ESPESOR , A CADA ARISTA HACIA CENTRO DE BROCAL	PZA	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	\$4,608.85	\$13,826.55
36	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE DIAMANTE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=38KG/CM2, TMA 1 1/2", RESISTENCIA RÁPIDA A LOS 7 DÍAS, DE 16 CM DE ESPESOR Y 1.20 M POR LADO. INCLUYE: ARMADO CON VARILLA DEL No. 3 A CADA 15 CM, ARMEX 1515-4, PELO DE ANGEL 900 GRAMOS M3, TAPA Y BROCAL DE POLIETILENO PARA TRÁFICO PESADO, CORTE 1/3 DE ESPESOR , A CADA ARISTA HACIA CENTRO DE BROCAL	PZA	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	\$3,528.00	\$3,528.00

Total Partida	\$236,514.74
Total Grupo	\$236,514.74
Total Presupuestado	\$16,257.63
Ajuste de Costos	\$0.00
Total	\$16,257.63

MUNICIPIO DE  
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

-- 2022

OPERADO  
OBRA INFRA ESTRUCTURA  
SOCIAL MUNICIPAL

ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. (CACC210308C74)

INGENIERO CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA

(CACC9207139Q05)  
SUPERVISOR

Contratista





NUMEROS GENERADORES

ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.

NO. DE OBRA:	FISDMDF 001/2022
NO. DE CONTRATO:	FISDMDF 001/2022
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE NARANJO ENT
UBICACIÓN:	HIDALGO

E S T I M A C I O N N O . 4

No.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	ACUMULADO TOTAL	CROQUIS	FOTOGRAFIA
			EJE	TRAMO	TIPO								
28	LIMPIEZA FINAL , INCLUYE: BARRIDO CON AGUA , MATERIALES, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO.	M2			NO. 118	5.50	0.70			3.85	199.56		ANEXO
					NO. 116	5.50	0.70			3.85	203.41		
					NO. 114	5.60	0.70			3.92	207.26		
					NO. 112	5.50	0.70			3.85	211.18		
					NO. 110	5.50	0.70			3.85	215.03		
					NO. 108	5.50	0.70			3.85	218.88		
					NO. 106	5.40	0.70			3.78	222.73		
					NO. 104	5.40	0.70			3.78	226.51		
					NO. 102	5.30	0.70			3.71	230.29		
				PTE							234.00		
			P2-P3	NO. 135	5.70	0.70				3.99	237.99		
				NO. 133	5.70	0.70				3.99	241.98		
				NO. 131	5.70	0.70				3.99	245.97		
				NO. 129	5.70	0.70				3.99	249.96		
				NO. 127	5.70	0.70				3.99	253.95		
			DESCARGA	NO. 125	5.50	0.70				3.85	257.80		
				NO. 123	5.70	0.70				3.99	261.79		
			P3-P4	NO. 121	5.70	0.70				3.99	265.78		
				NO. 119	5.70	0.70				3.99	269.77		
				NO. 117	5.70	0.70				3.99	273.76		
				NO. 115	5.80	0.70				4.06	277.82		
				NO. 113	5.80	0.70				4.06	281.88		
				NO. 111	5.80	0.70				4.06	285.94		
				NO. 109	5.80	0.70				4.06	290.00		

MUNICIPIO DE  
SAN FRANCISCO DEL CAYAMA

2022

**OPERADO**  
OBRA INFRA ESTRUCTURA  
SOCIAL MUNICIPAL

OBSERVACIONES :

RESIDENTE DE OBRA  
nombre de residente de obra

ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE SUPERVISION

Ing. Carlos Armando Chavez Garcia  
Dir. Obras Publicas





NUMEROS GENERADORES

ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.

NO. DE OBRA:	FISMDF 001/2022
NO. DE CONTRATO:	FISMDF 001/2022
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE NARANJO ENTRE
UBICACIÓN:	HIDALGO

ANEXO


ESTIMACION NO. 4

No.

CROQUIS

28

LIMPIEZA FINAL , INCLUYE: BARRIDO CON AGUA , MATERIALES, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO.

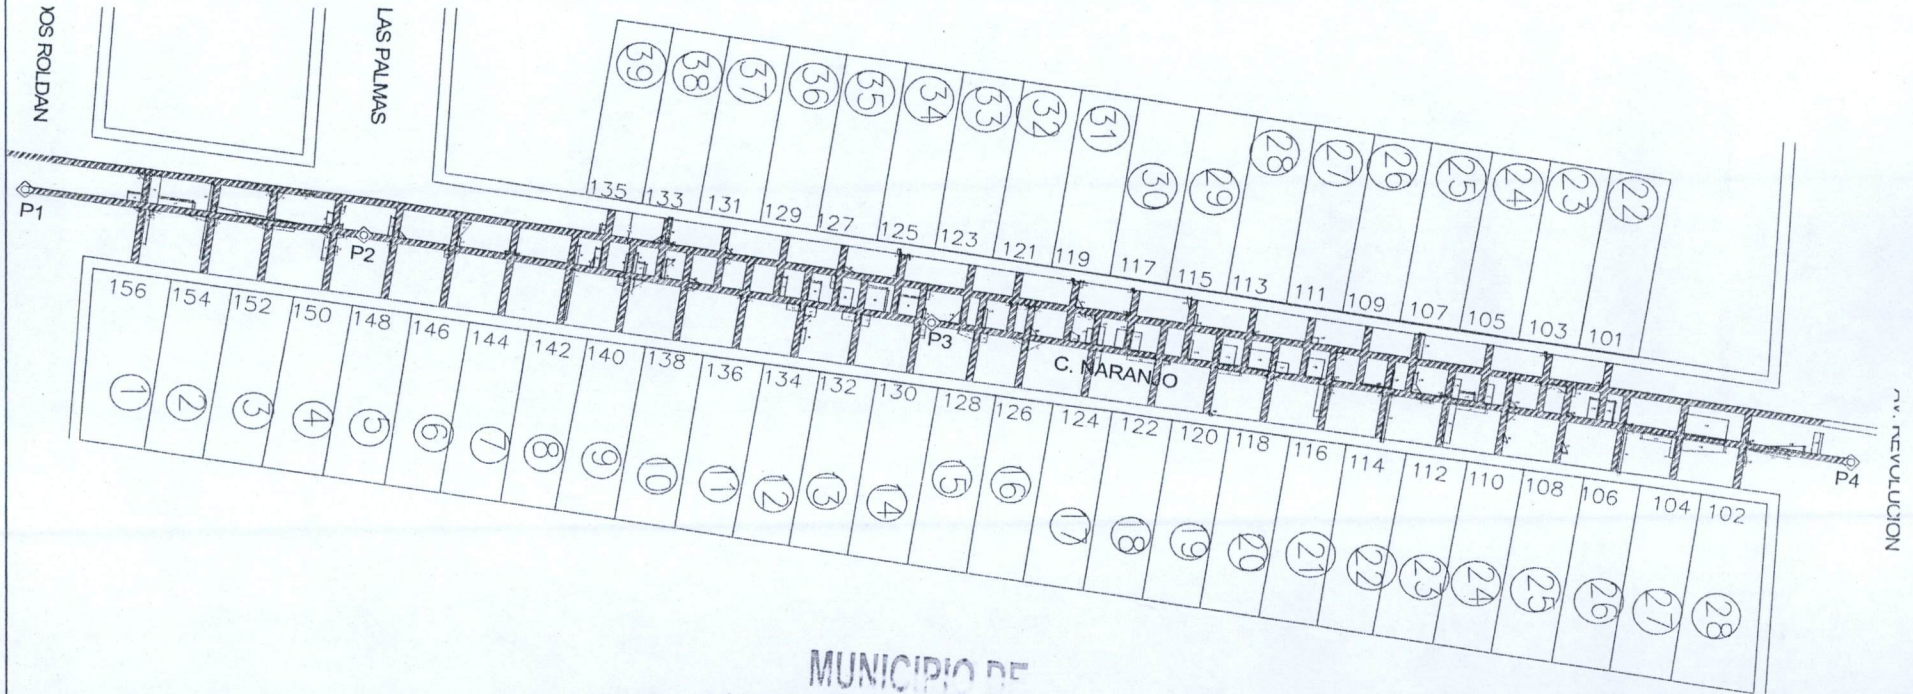

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RIOS

2022

OBSERVACIONES :

RESIDENTE DE OBRA  
nombre de residente de obra

ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

OPERADO  
OBRA INFRA ESTRUCTURA  
SOCIAL MUNICIPAL

RESIDENTE DE SUPERVISION  
Ing. Carlos Armando Chavez Garcia  
Dir. Obras Publicas

NUMEROS GENERADORES



NO. DE OBRA:	FISMDF 001/2022
NO. DE CONTRATO:	FISMDF 001/2022
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE NARANJO ENTRE
UBICACIÓN:	HIDALGO

ANEXO

E S T I M A C I O N N O . 4

No.

FOTOGRAFIAS

28

LIMPIEZA FINAL , INCLUYE: BARRIDO CON AGUA , MATERIALES, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO.

OBSERVACIONES :

RESIDENTE DE OBRA

nombre de residente de obra

ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

MUNICIPIO DE  
SAN FRANCISCO

2022

**OPERADO**  
OBRA INFRA ESTRUCTURA  
SOCIAL MUNICIPAL

RESIDENTE DE SUPERVISION

Ing. Carlos Armando Chavez Garcia  
Dir. Obras Publicas



NUMEROS GENERADORES

ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.

NO. DE OBRA:	FISMDF 001/2022
NO. DE CONTRATO:	FISMDF 001/2022
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE NARANJO ENT
UBICACIÓN:	HIDALGO

E S T I M A C I O N N O . 4

No.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	ACUMULADO TOTAL	CROQUIS	FOTOGRAFIA	
			EJE	TRAMO	TIPO									
34	PAVIMENTO HIDRÁULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-38 KG/CM2, T.M.A. 1 1/2" RR 7 DÍAS, GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 10 +- 2 CMS. FRAGUADO NORMAL, DE 16 CMS. DE ESPESOR, INC: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, REGLEADO, ACABADO RAYADO CON CEPILLO DE CERDAS DE ALUMINIO, CON DOBLADOR, CORTE CON DISCO, CALAFATEO CON BACK ROAD (COLA DE RATA), SELLADOR ELASTOMERICO, JUNTAS CONSTRUCTIVAS CON CELOTEX DE 1/2", CURADO CON MEMBRANA QUIMICA BASE AGUA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. DE ACUERDO A PROYECTO.	M2	CENTRAL	P1-P2		34.17	0.70			23.92	23.92	ANEXO		
P2-P3					58.42	0.70		40.89	64.81					
P3-P4					94.50	0.70		66.15	130.96					
				BROCAL P2		-1.50	0.70		3.00	-3.15	127.81			
				OTE							127.81			
			DESCARG.		P1-P2	NO. 156	4.60	0.70			3.22		131.03	
						NO. 154	4.60	0.70			3.22		134.25	
						NO. 152	5.10	0.70			3.57		137.82	
						NO. 150	5.40	0.70			3.78		141.60	
						P2-P3	NO. 148	5.50	0.70				3.85	145.45
							NO. 146	5.50	0.70				3.85	149.30
							NO. 144	5.60	0.70				3.92	153.22
							NO. 142	5.50	0.70				3.85	157.07
							NO. 140	5.50	0.70				3.85	160.92
							NO. 138	5.50	0.70				3.85	164.77
							NO. 136	5.60	0.70				3.92	168.69
							NO. 134	5.60	0.70				3.92	172.61
							NO. 132	5.60	0.70				3.92	176.53
							NO. 130	5.50	0.70				3.85	180.38
							P3-P4	NO. 128	5.50	0.70				3.85
							NO. 126	5.50	0.70			3.85	188.08	
							NO. 124	5.50	0.70			3.85	191.93	
					NO. 122	5.50	0.70			3.85	195.78			
					NO. 120	5.40	0.70			3.78	199.56			

OBSERVACIONES:

**OPERADO**  
OBRA INFRA ESTRUCTURA  
SOCIAL MUNICIPAL

RESIDENTE DE OBRA  
nombre de residente de obra  
ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE SUPERVISION  
Ing. Carlos Armando Chavez Garcia  
Dir. Obras Públicas



NUMEROS GENERADORES

ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.

NO. DE OBRA:	FISMDF 001/2022
NO. DE CONTRATO:	FISMDF 001/2022
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE NARANJO ENT
UBICACIÓN:	HIDALGO

E S T I M A C I O N N O . 4

No.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	ACUMULADO TOTAL	CROQUIS	FOTOGRAFIA
			EJE	TRAMO	TIPO								
34	PAVIMENTO HIDRÁULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-38 KG/CM2, T.M.A. 1 1/2" RR 7 DÍAS, GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 10 +- 2 CMS. FRAGUADO NORMAL, DE 16 CMS. DE ESPESOR, INC: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, REGLEADO, ACABADO RAYADO CON CEPILLO DE CERDAS DE ALUMINIO, CON DOBLADOR, CORTE CON DISCO, CALAFATEO CON BACK ROAD (COLA DE RATA), SELLADOR ELASTOMERICO, JUNTAS CONSTRUCTIVAS CON CELOTEX DE 1/2", CURADO CON MEMBRANA QUIMICA BASE AGUA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. DE ACUERDO A PROYECTO.	M2			NO. 118	5.50	0.70			3.85	199.56	ANEXO	
				NO. 116	5.50	0.70	3.85	203.41					
				NO. 114	5.60	0.70	3.85	207.26					
				NO. 112	5.50	0.70	3.92	211.18					
				NO. 110	5.50	0.70	3.85	215.03					
				NO. 108	5.50	0.70	3.85	218.88					
				NO. 106	5.50	0.70	3.85	222.73					
				NO. 106	5.40	0.70	3.78	226.51					
				NO. 104	5.40	0.70	3.78	230.29					
				NO. 102	5.30	0.70	3.71	234.00					
			PTE					234.00					
			P2-P3	NO. 135	5.70	0.70	3.99	237.99					
				NO. 133	5.70	0.70	3.99	241.98					
				NO. 131	5.70	0.70	3.99	245.97					
				NO. 129	5.70	0.70	3.99	249.96					
				NO. 127	5.70	0.70	3.99	253.95					
			DESCARGA	NO. 125	5.50	0.70	3.85	257.80					
				NO. 123	5.70	0.70	3.99	261.79					
			P3-P4	NO. 121	5.70	0.70	3.99	265.78					
				NO. 119	5.70	0.70	3.99	269.77					
				NO. 117	5.70	0.70	3.99	273.76					
				NO. 115	5.80	0.70	4.06	277.82					
				NO. 113	5.80	0.70	4.06	281.88					
			NO. 111	5.80	0.70	4.06	285.94						
			NO. 109	5.80	0.70	4.06	290.00						

MUNICIPIO DE  
SAN FRANCISCO  
2022  
OPERADO

OBSERVACIONES

OBRA INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

RESIDENTE DE OBRA  
nombre de residente de obra  
ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE SUPERVISION  
Ing. Carlos Armando Chavez Garcia  
Dir. Obras Publicas





NUMEROS GENERADORES

ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.


NO. DE OBRA:	FISDMDF 001/2022
NO. DE CONTRATO:	FISDMDF 001/2022
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE NARANJO ENTRE
UBICACIÓN:	HIDALGO

ANEXO

ESTIMACION NO. 4

No. CROQUIS

34 PAVIMENTO HIDRÁULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-38 KG/CM2, T.M.A. 1 1/2" RR 7 DÍAS, GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 10 +- 2 CMS. FRAGUADO NORMAL, DE 16 CMS. DE ESPESOR, INC: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, REGLEADO, ACABADO RAYADO CON CEPILLO DE CERDAS DE ALUMINIO, CON DOBLADOR, CORTE CON DISCO, CALAFATEO CON BACK ROAD (COLA DE RATA), SELLADOR ELASTOMERICO, JUNTAS CONSTRUCTIVAS CON CELOTEX DE 1/2", CURADO CON MEMBRANA QUIMICA BASE AGUA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. DE ACUERDO A PROYECTO.

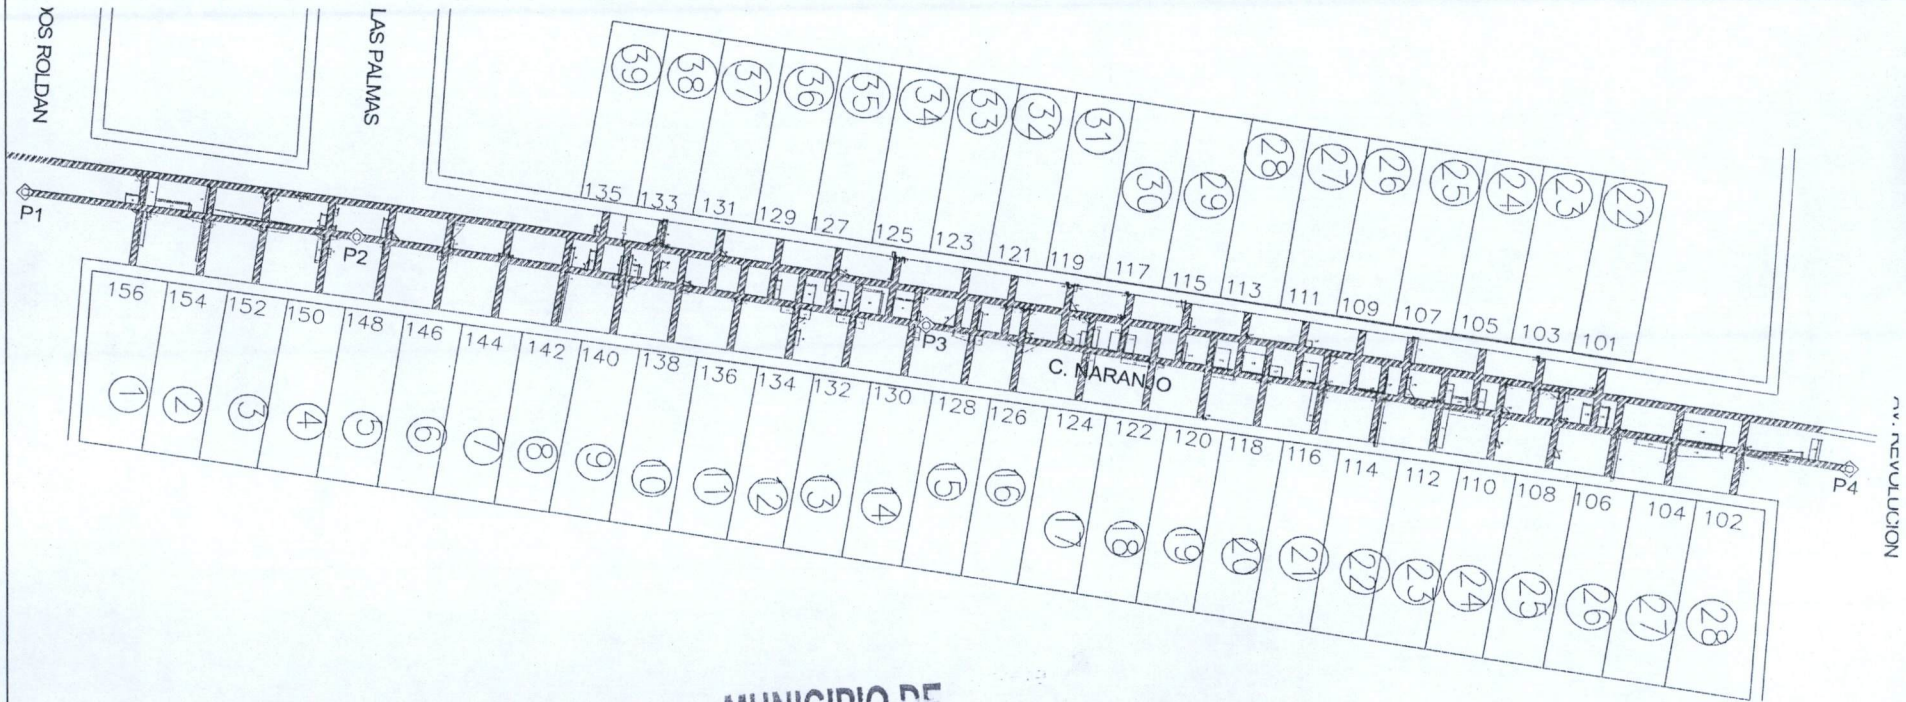

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

2022

OPERADO OBRA INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA  
 nombre de residente de obra  
 ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE SUPERVISION  
 Ing. Carlos Armando Chavez Garcia  
 Dir. Obras Publicas

NUMEROS GENERADORES



NO. DE OBRA: FISDMF 001/2022  
 NO. DE CONTRATO: FISDMF 001/2022  
 DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE NARANJO ENTRE  
 UBICACIÓN: HIDALGO

ANEXO



E S T I M A C I O N N O . 4

No.

FOTOGRAFIAS

34

PAVIMENTO HIDRÁULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-38 KG/CM2, T.M.A. 1 1/2" RR 7 DÍAS, GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 10 +- 2 CMS. FRAGUADO NORMAL, DE 16 CMS. DE ESPESOR, INC: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, REGLEADO, ACABADO RAYADO CON CEPILLO DE CERDAS DE ALUMINIO, CON DOBLADOR, CORTE CON DISCO, CALAFATEO CON BACK ROAD (COLA DE RATA), SELLADOR ELASTOMERICO, JUNTAS CONSTRUCTIVAS CON CELOTEX DE 1/2", CURADO CON MEMBRANA QUIMICA BASE AGUA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. DE ACUERDO A PROYECTO.

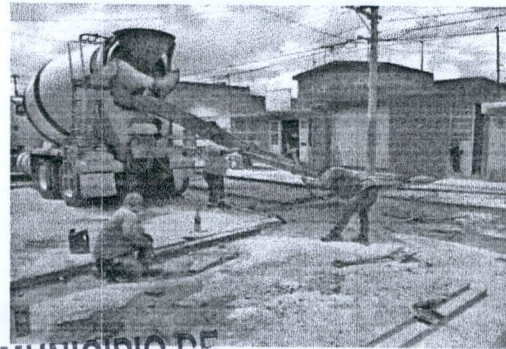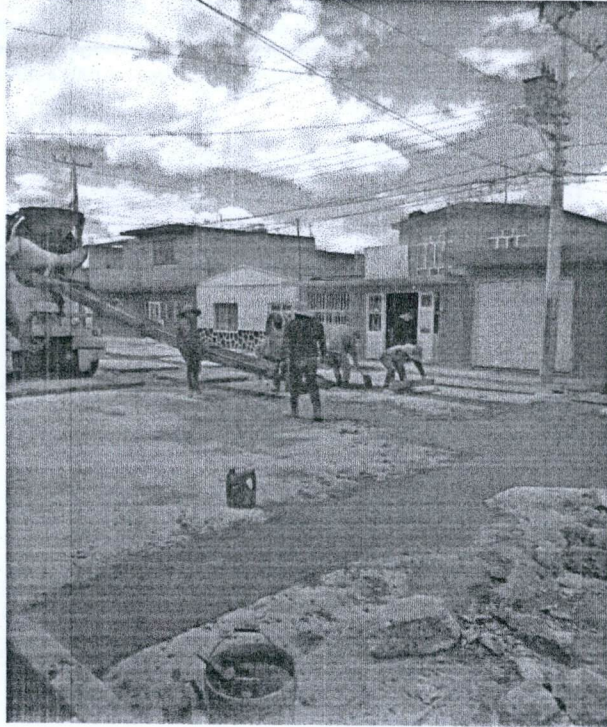

OBSERVACIONES :

RESIDENTE DE OBRA

nombre de residente de obra

ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

MUNICIPIO DE  
SAN FRANCISCO DEL RINCON

2022

OPERADO  
OBRA INFRA ESTRUCTURA  
SOCIAL MUNICIPAL

RESIDENTE DE SUPERVISION

Ing. Carlos Armando Chavez Garcia  
Dir. Obras Publicas

NUMEROS GENERADORES



NO. DE OBRA:	FISMDF 001/2022
NO. DE CONTRATO:	FISMDF 001/2022
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE NARANJO ENTRE
UBICACIÓN:	HIDALGO

ANEXO

E S T I M A C I O N N O . 4

No.

FOTOGRAFIAS

35

CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE DIAMANTE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=38KG/CM2, TMA 1 1/2", RESISTENCIA RÁPIDA A LOS 7 DÍAS, DE 16 CM DE ESPESOR Y 1.50 M POR LADO. INCLUYE: ARMADO CON VARILLA DEL No. 3 A CADA 15 CM, ARMEY 1515, 4, RELO DE ANGEI 900 GRAMOS M3, TAPA Y BROCAL DE POLIETILENO PARA TRÁFICO PESADO, CORTE 1/3 DE ESPESOR, A CADA ARISTA HACIA CENTRO DE BROCAL



MUNICIPIO DE  
SAN FRANCISCO DE LOS RIOS

2022

OBSERVACIONES :

RESIDENTE DE OBRA  
nombre de residente de obra

ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

**OPERADO**  
OBRA INFRA ESTRUCTURA  
SOCIAL MUNICIPAL

RESIDENTE DE SUPERVISION  
Ing. Carlos Armando Chavez Garcia  
Dir. Obras Publicas



NUMEROS GENERADORES




NO. DE OBRA:	FISMDF 001/2022
NO. DE CONTRATO:	FISMDF 001/2022
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE NARANJO ENTRE
UBICACIÓN:	HIDALGO

ANEXO

E S T I M A C I O N N O . 4

No. **CROQUIS**

36 CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE DIAMANTE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=38KG/CM2, TMA 1 1/2", RESISTENCIA RÁPIDA A LOS 7 DÍAS, DE 16 CM DE ESPESOR Y 1.20 M POR LADO. INCLUYE: ARMADO CON VARILLA DEL No. 3 A CADA 15 CM, ARMEX 1515-4, PELO DE ANGEL 900 GRAMOS M3, TAPA Y BROCAL DE POLIETILENO PARA TRÁFICO PESADO, CORTE 1/3 DE ESPESOR , A CADA ARISTA HACIA CENTRO DE BROCAL

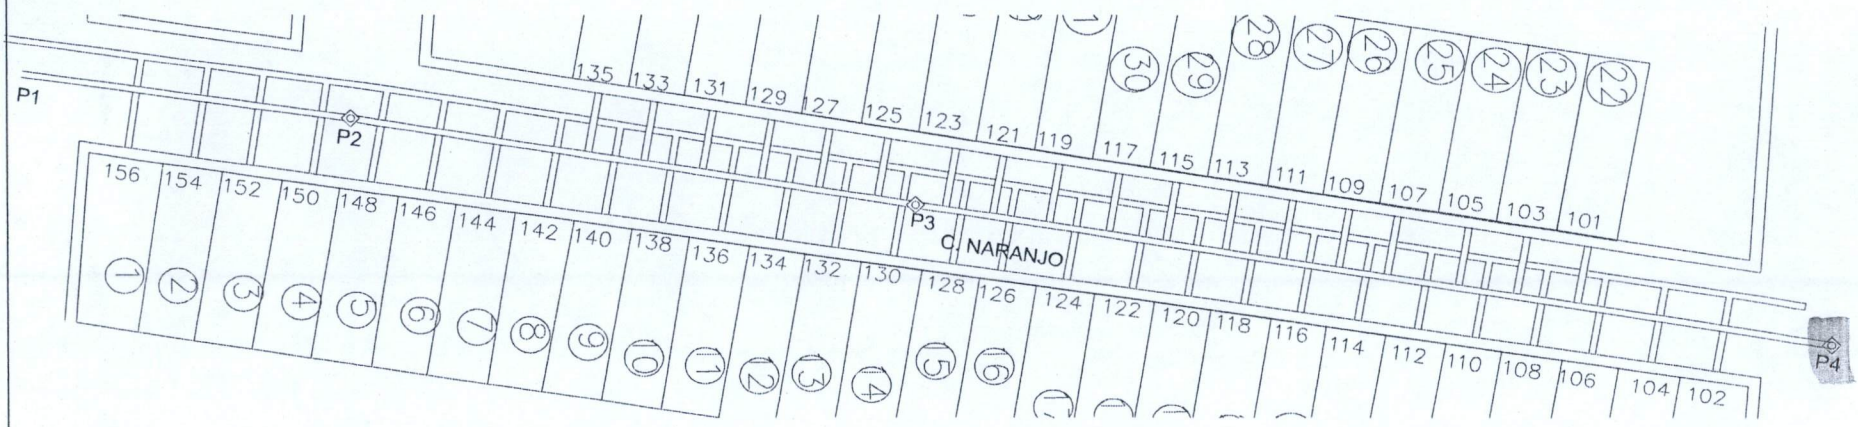

MUNICIPIO DE  
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

OBSERVACIONES :

RESIDENTE DE OBRA  
nombre de residente de obra  
ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

2022  
**OPERADO**  
OBRA INFRA ESTRUCTURA  
SOCIAL MUNICIPAL

RESIDENTE DE SUPERVISION  
Ing. Carlos Armando Chavez Garcia  
Dir. Obras Publicas

NUMEROS GENERADORES



NO. DE OBRA:	FIS MDF 001/2022
NO. DE CONTRATO:	FIS MDF 001/2022
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE NARANJO ENTRE
UBICACIÓN:	HIDALGO

ANEXO



E S T I M A C I O N N O . 4

No.

FOTOGRAFIAS

36

CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE DIAMANTE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=38KG/CM2, TMA 1 1/2", RESISTENCIA RÁPIDA A LOS 7 DÍAS, DE 16 CM DE ESPESOR Y 1.20 M POR LADO. INCLUYE: ARMADO CON VARILLA DEL No. 3 A CADA 15 CM, ARMEX 1515-4, PELO DE ANGEL 900 GRAMOS M3, TAPA Y BROCAL DE POLIETILENO PARA TRÁFICO PESADO, CORTE 1/3 DE ESPESOR , A CADA ARISTA HACIA CENTRO DE BROCAL

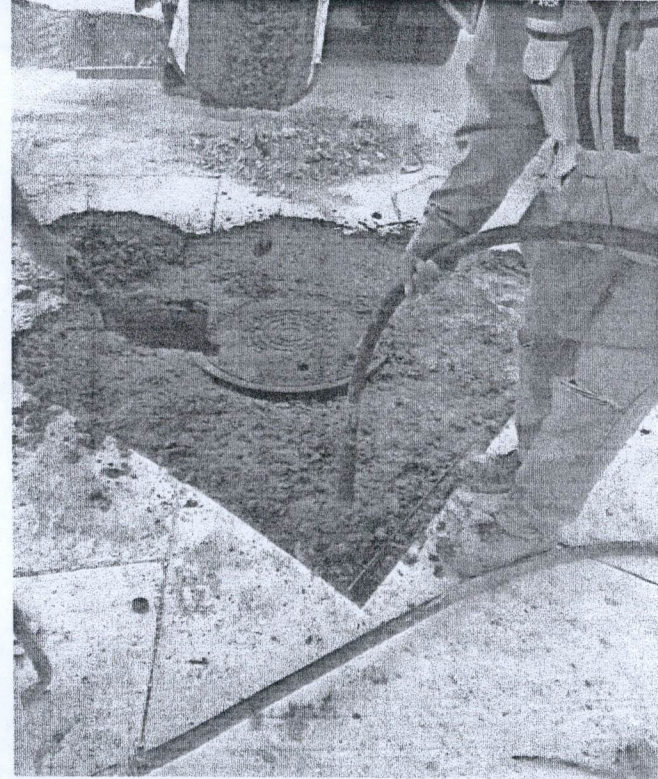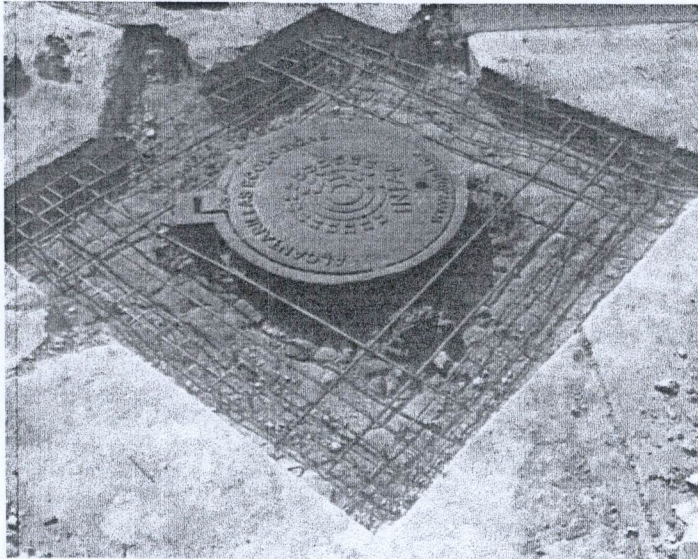

MUNICIPIO DE  
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

2022

OBSERVACIONES :

RESIDENTE DE OBRA

nombre de residente de obra

ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

**OPERADO**  
OBRA INFRA ESTRUCTURA  
SOCIAL MUNICIPAL

RESIDENTE DE SUPERVISION

Ing. Carlos Armando Chavez Garcia

Dir. Obras Publicas

BITÁCORA DE OBRA



HOLA \_\_\_\_\_

CONTRATO FOND 001/2022

OBRA FOND 001/2022

Nota  
 21 de Octubre del 2022  
 Con esta fecha se concluye la revisión del resumen y números generados de obra correspondientes a la primera y (lectio) con periodo del 19 de Septiembre del 2022 al 03 de octubre del 2022 se autoriza bajo la siguiente Estructura:

Monto Base	\$ 16,257.63
Amortización Anticipo (-)	\$ 8,128.80
Subtotal con I.V.A.	\$ 9,429.44
Retenciones (-)	\$ 162.59
Total a Pagar	\$ 9,266.85

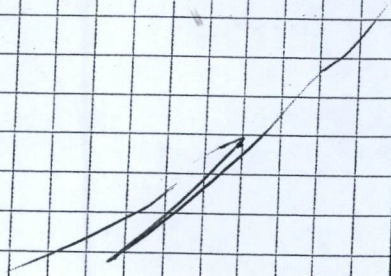MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RIOS  
 OPERADO  
 OBRA INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 2022

Dirección de  
**OBRAS PÚBLICAS**

Ayuntamiento de  
**SAN FRANCISCO  
DE LOS ROMO**

2021 ♦ 2024



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO  
No. Oficio: DOP/617/22  
San Francisco de los Romo, Ags., 22 de diciembre de 2022  
Asunto: LIBERACIÓN DE PAGO

2360

**C.P. MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ**  
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
PRESENTE

Por medio del presente le remito la documentación de la estimación No. 4, para que se realicen los trámites necesarios para su pago.

No. de Obra: FIS MDF 001/2022

Nombre de la Obra: REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE NARANJO ENTRE AVENIDA SAUCE Y CALLE LICENCIADO OTTO GRANADOS ROLDAN

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal

Contratista: ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. (OAC210308CZ4 )

Contrato: FIS MDF 001/2022 No Factura: A-68

Objeto del Contrato: REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE NARANJO ENTRE AVENIDA SAUCE Y CALLE LICENCIADO OTTO GRANADOS ROLDAN, COLONIA LOS CEDROS EN CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Monto del Contrato: \$1,147,035.99 ( UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL TREINTA Y CINCO PESOS 99/100 M.N. )

Monto a Pagar: \$9,266.85 (NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 85/100 M.N.)

Sin otro particular de momento, me es grato enviarle un cordial saludo agradeciendo de antemano las atenciones al presente.

2  
ATENTAMENTE

ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA  
DIRECTOR DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

C.c.p. Archivo

2022  
Av. Benito Juárez S/N, Rancho La Trinidad,  
San Francisco de los Romo, Ags., Tel: (465) 967 0124 ext. 1654

OPERADO  
OBRA INFRA ESTRUCTURA  
SOCIAL MUNICIPAL  
www.sanfranciscodelosromo.gob.mx
