



Usr: SuSaNa
Rep: rptPoliza

Municipio de San Francisco de los Romo
ESTADO DE AGUASCALIENTES

Póliza: C05731 Del 28/12/2022



Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2023 08:58 a. m.
Página | 1

Concepto: FISM 2022 PAGADO EST 2 OBRA FIS MDF 026/2022 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE
RAFAL RAM. GP Folio: 464

Beneficiario: GRUPO CONSTRUCTOR MED CER SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-2501-K022-J04-61401-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$65,842.52		GP Folio: 464
0002	8260-2501-K022-J04-61401-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y		\$65,842.52	GP Folio: 464
0003	2113-000272	CONSTRUCCIÓN Y/O	\$65,842.52		GP Folio: 464
0004	1112-003-002	Bancomer Cta. 011793039-9 FISM		\$32,353.66	GP Folio: 464
0005	1134-003-005	Grupo Constructor MED CER, SA de		\$32,921.26	FISM 2022 PAGADO EST 2 OBRA FIS MDF 026/2022
0006	2117-9-005-001	0.1% COLEGIO DE		\$56.76	FISM 2022 PAGADO EST 2 OBRA FIS MDF 026/2022
0007	2117-9-005-002	0.2% ORGANO SUPERIOR DE		\$113.52	FISM 2022 PAGADO EST 2 OBRA FIS MDF 026/2022
0008	2117-9-005-003	0.2% INST. DE CAPACIT. DE LA		\$113.52	FISM 2022 PAGADO EST 2 OBRA FIS MDF 026/2022
0009	2117-9-005-004	0.5% CONTRALORIA MUNICIPAL		\$283.80	FISM 2022 PAGADO EST 2 OBRA FIS MDF 026/2022
Sumas iguales =>			<u>131,685.04</u>	<u>131,685.04</u>	

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
-- 2022
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL



Fecha y hora de consulta

28/12/2022 5:45:00 PM

Contrato

00796395

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO
DE LOS ROMO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: EST 2 FIS MDF 026

Importe de la operación: 32,353.66 MXP

Cuenta de retiro: 0117930399

Cuenta de depósito: 014010655083510074

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE SAN FRA
NCISCO DE LOS ROMOTitular de la cuenta: GRUPO CONSTRUCTOR MED
CER SA D

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 28/12/2022

Fecha de aplicación: 28/12/2022

Concepto de pago: PAGO EST 2 FIS MDF 11-026

Referencia numérica: 281222

Instrumento de seguridad: ASD 6550927880

Hora de captura en el canal: 17:44:54

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000549133

Clave de rastreo: 002601002212280000549133

Folio de firma: 0090753119

Folio único: 1401202212281744540090753125

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	28/12/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	28/12/2022

RFC emisor: GCM120227RL6
Nombre emisor: GRUPO CONSTRUCTOR MED CER SA DE CV
Folio: 284
RFC receptor: MSF920130TQ9
Nombre receptor: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: 5db7edf4-11c7-444b-91ec-a83974d90ff7
No. de serie del CSD: 00001000000506436295
Serie: DP
Código postal, fecha y hora de emisión: 20285 2023-01-04 09:01:10
Efecto de comprobante: Pago
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
84111506		1	ACT		0	0			
Descripción	Pago								

Moneda: Los códigos asignados para las transacciones en que interviene ninguna moneda
Subtotal Total \$ 0.00 \$ 0.00

Información del pago

Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Fecha de pago: 2022-12-28 12:00:00
RFC emisor cuenta ordenante: BBA830831LJ2 Moneda de pago: Peso Mexicano
Cuenta ordenante: 012010001179303990 Monto: 32353.66
Número operación: 281222
RFC emisor cuenta beneficiario: BSM970519DU8
Cuenta beneficiario: 014010655083510074

Documento relacionado

Id documento: 80e2caac-238a-4426-8b38-f9190ae5cad9 Moneda del documento relacionado: Peso Mexicano
Folio: 851 Método de pago del documento relacionado: Pago en parcialidades o diferido
Número parcialidad: 3 Importe de saldo anterior: 32353.66
Importe pagado: 32353.66
Importe de saldo insoluto: 0.00

Sello digital del CFDI:

fifCbmkrfv91chURXm0yd3UhVeqeXMmZTvsTNE35cdyZ/N34hd7/JmBC/7AaHOKp1z3F8+SoorxNctIWz8QFgvVx8ELWxlC/mEVy61XLjDkgGplOr/d4a/6X691gSpE92LzX1IH2BJxlqAAGhWp6GV/w8wHXF5rHS1hhR2RtNXxv0/SPKFrC8FQomgK6svUldm8at6Ba3hUf05SaOq8iS2KGwk3ezMYwSLh3IE+IQ/YSTHIFRYmpuWGF8Epyv+4w4rTUg6HwVbkJSQNsFCcn1+/U4xpxG11U7ellj/oUFH0ooGNKXBXuQwL9+1aTPVrjTYKe+7SJ50fegQ==

Sello digital del SAT:

fI+VITJRJa1Pmj/Y5WVu1VSHfp4sCe5hezMOsl3TgHgVHabw5ITcy2zvtks3QhkIRRxJxSLMG8lucKLSvdUgGspLQkvBHCb00DmXkftN1dluCIAfg5DnbROpH7sibdLATYhX/8kaE1fZ3d4pIC6wMqFODrBJgs8vUEnZjubFhBLrJA2xzWAhh+j0o23SjhquN7vwcE9mFCDe/OPYy8yuNC0soMH+CwuTCCfMIF2B+DENa64XHw0SkhFRIFTYxiUoutd/RZ4aAHkgHpxylhuybXuzbjL86p rak6T3xa+zD5xcXX7gEzZdL4dMtyQ2rIBaNVHf3rJ50w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5db7edf4-11c7-444b-91ec-a83974d90ff7|2023-01-04T09:01:11|LSO1306189R5||fifCbmkrfv91chURXm0yd3UhVeqeXMmZTvsTNE35cdyZ/N34hd7/JmBC/7AaHOKp1z3F8+SoorxNctIWz8QFgvVx8ELWxlC/mEVy61XLjDkgGplOr/d4a/6X691gSpE92LzX1IH2BJxlqAAGhWp6GV/w8wHXF5rHS1hhR2RtNXxv0/SPKFrC8FQomgK6svUldm8at6Ba3hUf05SaOq8iS2KGwk3ezMYwSLh3IE+IQ/YSTHIFRYmpuWGF8Epyv+4w4rTUg6HwVbkJSQNsFCcn1+/U4xpxG11U7ellj/oUFH0ooGNKXBXuQwL9+1aTPVrjTYKe+7SJ50fegQ==||00001000000509846663||

RFC del proveedor de certificación: LSO1306189R5

Fecha y hora de certificación: 2023-01-04 09:01:11

No. de serie del certificado SAT: 00001000000509846663



MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

2022

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GCM120227RL6	GRUPO CONSTRUCTOR MED CER SA DE CV	MSF920130TQ9	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5DB7EDF4-11C7-444B-91EC-A83974D90FF7	2023-01-04T09:01:10	2023-01-04T09:01:11	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$0.00	Pago	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
-- 2022
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

CÉDULA DE SEGUIMIENTO A ESTIMACIONES DE OBRA

Ayuntamiento de
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
2021 • 2024



DATOS GENERALES											
CONTRATISTA: GRUPO COSTRUCTOR MED CER, S.A. DE C.V.						N° DE CONTRATO: FISMDF 026/2022					
SUPERVISOR: T.C. FERNANDO LUNA MEDINA						N° DE OBRA: FISMDF 026/2022					
OBRA: REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE A						N° DE FACTURA:					
FECHA DE CORTE: DEL: 01.ago.2022 AL: 31.ago.2022						N° DE ESTIMACION: 2 (DOS)					
						IMPORTE LIQUIDO: \$ 32,353.66					
FORMATO DE NUMEROS GENERADORES											
INGRESO		REVISIÓN		NOTA Sr. contratista regrese esta cédula con la estimación original de lo contrario no se le da trámite				CAPTURA EN SISTEMA		ENTREGA DE PRE-FACTURA	
07-sep-22		09-sep-20						09-sep-20		09-sep-20	
CONTRATISTA		SUPERVISOR						SUPERVISOR		SUPERVISOR	
FORMATO DE ESTIMACION											
INGRESO		REGISTRO		SUPERVISOR				JEFE DE DEPARTAMENTO			
16/12/22		18/12/22		16/12/22		16/12/22		ARQ. ALFREDO FLORES MARMOLEJO		16/12/22	
CONTRATISTA		CONTROL DE ESTIMACIONES		RECIBIDO		AUTORIZADO		RECIBIDO		AUTORIZADO	
DEVOLUCION				CONTENIDO				DIRECTOR GENERAL			
FECHA DE DEVOLUCION: 09/09/2022				CÁRATULA				X			
FECHA DE REINGRESO: 15/12/2022				RESUMEN				X			
MOTIVO DE LA DEVOLUCION: - FALTAN FOTOGRAFIA - CONREGIA CADENA				CONCEPTOS				X			
				ESTADO DE CUENTA				X			
				CONCENTRADO DE CONCEPTOS (FIN)				X			
				GENERADORES Y RESUMEN				X			
				CROQUIS				X			
				FOTOGRAFIAS				X			
				ANALISIS PRECIO UNITARIO							
				REPORTE(S) DE LABORATORIO							
				FIANZA(S) (FIN)							
				NOTA DE BITACORA DE OBRA				X			
								RECIBIDO			
								AUTORIZADO			
TRAMITE DE PAGO											
FECHA DE INICIO DE TRAMITE EN DOP-SFR			FIRMA DEL DIRECTOR			OFICIO DE LIBERACION			FECHA DE ENTREGA		
07 09 22			16 12 22			16 12 22					
DÍA: MES: AÑO:			DÍA: MES: AÑO:			DÍA: MES: AÑO:			DIRECCION DE EGRESOS.		

OPERADO
 MUNICIPAL
 SOCIAL
 OBRA
 MUNICIPAL
 2022
 MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

PRE-FACTURA Normal



PRE-FACTURA DEL CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR MED CER, S.A. DE C.V. (201)

A NOMBRE DE: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 RFC: MSF920130TQ9
 DIRECCION: FCO ROMO JIMENEZ 102, SAN JOSE DE BUENAVISTA, SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS,
 CIUDAD: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE L ESTADO: AGUASCALIENTES

DESCRIPCION

PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 Del 01 Ago 2022 al 31 Ago 2022		MONTO BASE	\$56,760.79
DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE RAFAEL RAMÍREZ ENTRE LA CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA Y CALLE PLAN DE SAN LUIS	AJUSTE DE COSTOS (+)	\$0.00
UBICADA EN:	EJIDO OJO DE AGUA DEL MEZQUITE EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCA	AMORTIZACION DE ANTICIPO (-)	\$28,380.39
CON AMPARO DEL CONTRATO No.:	FISMDF 026/2022	SUBTOTAL	\$28,380.40
DE FECHA::	18/07/2022	IVA (+)	\$4,540.86
BAJO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA:		SUBTOTAL CON IVA	\$32,921.26
Inversion	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal 2022		
Programa	SE URBANIZACIÓN		
SubPrograma	03 GUARNICIONES Y BANQUETAS		
Obra.	FISMDF 026/2022 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE RAFAEL RAMÍREZ ENTRE LA CALLE REVOLUCI		
Localizacion	EJIDO OJO DE AGUA DEL MEZQUITE EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCAL		
	CAPACITACION DE LOS TRABAJADORES DEL CONTRATISTA	\$113.52 (0.20%)	
	COLEGIOS DE PROFESIONISTAS SEGUN CORRESPONDA	\$56.76 (0.10%)	TOTAL DE RETENCIONES (-) \$567.60
	SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	\$0.00 (0.00%)	SANCION POR RETRASO (-) \$0.00
	FISCALIZACION DEL H. CONGRESO DEL ESTADO	\$113.52 (0.20%)	SUBTOTAL MENOS RETENCIONES \$32,353.66
Avance Fisico Real %	INSPECCION DE VIGILANCIA PARA LA CONTRALORIA	\$283.80 (0.50%)	RETENCION POR RETRASO(-) \$0.00
Avance Fisico Proaramado %	SERVICIOS RELATIVOS ALAS CONSTRUCCIONES	\$0.00	REINTEGRO POR RETENCION \$0.00
Fecha Terminación Prog. 16/09/2022		\$567.60	OTRAS SANCIONES(-) \$0.00
			TOTAL A PAGAR \$32,353.66

TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 66/100 M.N.

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 2022

RESUMEN DE ESTIMACION

Obra.	FIS MDF 026/2022 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE RAFAEL RAMÍREZ ENTRE LA CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA Y CALLE PLAN DE SAN LUIS		Total Contrato	\$501,931.94
Localización	EJIDO OJO DE AGUA DEL MEZQUITE EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCAL		Total Ampliaciones	\$2,471.92
Fuente Financ.			Total Contratado	\$504,403.86
Programa	SE URBANIZACIÓN		Anticipo (50)%	\$250,965.97
SubPrograma	03 GUARNICIONES Y BANQUETAS		Estimado Anterior	\$469,010.68
Supervisor	FERNANDO LUNA MEDINA (LUMF740415)		Esta Estimacion	\$32,921.26
Contratista	GRUPO CONSTRUCTOR MED CER, S.A. DE C.V. (201)		Total Estimado	\$501,931.94
Contrato	FIS MDF 026/2022	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE RAFAEL RAMÍREZ ENTRE LA CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA Y CALLE PLAN DE SAN LUIS	Saldo por Estimar	\$2,471.92
Estimacion No.	2			
Recibí de	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	la Cantidad de:	\$32,921.26	TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO PESOS 26/100 M.N.

<u>GRUPO</u>	<u>PARTIDA</u>		
	* CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE RAFAEL RAMÍREZ ENTRE LA CALLE REVOLUCIÓN MEX		\$56,760.79
	- GUARNICIONES Y BANQUETAS		\$56,760.79
Fecha Terminación Prog.		SUMA	\$56,760.79
		AJUSTE DE COSTOS (+)	\$0.00
		AMORTIZACION DE ANTICIPO (-)	\$28,380.39
		SUBTOTAL	\$28,380.40
		IVA (+)	\$4,540.86
		SUBTOTAL CON IVA	\$32,921.26

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

 2022
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

GRUPO CONSTRUCTOR MED CER, S.A. DE C.V. (GCM120227RL6)

[Handwritten Signature]

CONTRATISTA

T.C. FERNANDO LUNA MEDINA (LUMF740415)

[Handwritten Signature]

SUPERVISOR

CONCEPTOS DE ESTIMACION

Normal



Obra.	FISMDF 026/2022 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE RAFAEL RAMÍREZ ENTRE LA CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA Y CALLE PLAN DE SAN LUIS					Total Contrato	\$501,931.94
Localizacion	EJIDO OJO DE AGUA DEL MEZQUITE EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCAL					Total Ampliaciones	\$2,471.92
Fuente Financ.						Total Contratado	\$504,403.86
Programa	SE URBANIZACIÓN					Anticipo (50)%	\$250,965.97
SubPrograma	03 GUARNICIONES Y BANQUETAS					Estimado Anterior	\$469,010.68
Supervisor	FERNANDO LUNA MEDINA (LUMF740415)					Esta Estimacion	\$32,921.26
Contratista	GRUPO CONSTRUCTOR MED CER, S.A. DE C.V. (201)					Total Estimado	\$501,931.94
Contrato	FISMDF 026/2022 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE RAFAEL RAMÍREZ ENTRE LA CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA Y CALLE PLAN DE SAN LUIS					Saldo por Estimar	\$2,471.92
Estimacion No.	2 Del 01 Ago 2022 al 31 Ago 2022						
Recibí de	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO la Cantidad de: \$32,921.26 TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO PESOS 26/100 M.N.						

No.	Concepto	Unid. Med	Volumen					Precio Contratado	Importe
			Contratado	Acumulado	Anterior	Actual	Excedente		

GRUPO: **CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE RAFAEL RAMÍREZ ENTRE LA CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA Y CALLE PLAN DE SAN LUIS EJIDO OJO DE**

AGUA DEL MEZQU

PARTIDA: **GUARNICIONES Y BANQUETAS**

1	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. INCLUYE: EQUIPO NECESARIO, PUENTE, SEÑALIZACION DEL BANCO Y PUNTOS QUE SE REQUIERAN EN LA NIVELACION CON PINTURA, RENIVELACIONES NECESARIAS, LIMPIEZAS.	M2	470.84	673.29	568.06	105.23	202.45	\$6.87	\$722.94
2	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II 0.00 A 2.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUDES, TRASPALEOS, ACARREOS A MAQUINA O A MANO HASTA PRIMERA ESTACIÓN 20 MTS, MEDIDO COMPACTO, COMPACTACIÓN DE LA BASE POR MEDIOS MECÁNICOS, TRABAJO TERMINADO.	M3	141.25	11.79	10.69	1.10	\$463.09	\$511.46	
5	RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM CON BAILARINA EN CAPAS DE HASTA 20 cm. DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINISTRO DE TEPETATE, AGUA LE NECESARIA, MEDIDO COMPACTO, SELECCIÓN DEL MATERIAL, TENIDO, PAPEADO DE MATERIAL, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS.	M3	141.25	165.51	137.25	28.26	\$380.81	\$10,760.21	
6	GUARNICIÓN DE 15X20X40 CM DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=150 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA Y DESCIBRADO, TRABAJO TERMINADO	m	369.85	448.12	374.49	73.63	\$300.66	\$22,137.60	
7	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO, T.M.A. 3/4", GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 10+2 CM ACABADO RAYADO FINO CON BROCHA DE PELO, JUNTAS FRIAS CON DOBLADOR DE 2", SECCION DE LOSAS DE ACUERDO A LA EXISTENTE, INCLUYE: COLADO, CURADO CON MEMBRANA A BASE DE AGUA Y TRABAJO TERMINADO SEGUN FICHA TECNICA FT-200.	M2	470.84	571.53	511.89	59.64	\$379.41	\$22,628.58	

Total Partida	\$56,760.79
Total Grupo	\$56,760.79
Total Presupuestado	\$56,760.79
Ajuste de Costos	\$0.00
Total	\$56,760.79

GRUPO CONSTRUCTOR MED CER, S.A. DE C.V. (GCM120227RL6)

CONTRATISTA

T.C. FERNANDO LUNA MEDINA (LUMF740415)

SUPERVISOR

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURAL
SOCIAL MUNICIPAL
MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
2022



Ayuntamiento de
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
2021 • 2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
RESUMEN DE ESTIMACIÓN

FECHA: 15 de septiembre de 2022

NOMBRE DE LA OBRA : CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE RAÍ LOCALIDAD: EJIDO OJO DE AGUA DEL MEZQUITE
 No. DE CONTRATO Y OBRA : FISDMF 008-008-009-026/2022 FISDMF 026/2022
 IMPORTE DE CONTRATO : \$432,699.95 (CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 95/100 M.N.)
 FECHA DE INICIO REAL : 1 de agosto de 2022
 FECHA DE INICIO VIGENTE (REPROGRAMACION SEGÚN ANTICIPO) : 26 DE JULIO DE 2022
 PLAZO DEL CONTRATO : 60 (SESENTA) DIAS CALENDARIO
 FECHA DE TERMINO VIGENTE : 24 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FECHA DE TERMINO REAL : 29 de septiembre de 2022

No. DE ESTIMACION : 2 (DOS)
 PERIODO DEL : 01.ago.22 AL 31 Ago.22
 AVANCE FISICO 100%
 AVANCE FINANCIERO 13%

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN			PU.	IMPORTE
			CONTRATADO	EXCEDENTE	EJECUTADO		
GUARNICIONES Y BANQUETAS							
1	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. INCLUYE: EQUIPO NECESARIO, PUENTE, SEÑALIZACION DEL BANCO	M2	470.84	-365.61	105,2315	\$6.87	\$ 722.84
2	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II 0.00 A 2.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUDES, TRASPALOS, ACARREOS A MAQUINA O A MANO HASTA	M3	141.25	-140.15	1,1045	\$463.09	\$ 511.46
3	CARGA MECÁNICA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE ESCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO AL 1er. KM, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3	141.25	-141.25	0.0000	\$38.51	\$ -
4	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES AL TIRADERO OFICIAL AUTORIZADO MÁS	M3/KM	565.01	-565.01	0.0000	\$14.77	\$ -
5	RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% DE SU PVSU CON BAILARINA EN CAPAS DE HASTA 20 cm. DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINISTRO DE TEPETATE, AGUA LE	M3	141.25	-112.99	28,2561	\$380.81	\$ 10,760.21
6	GUARNICIÓN DE 15X20X40 CM DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=150 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA Y DESCIBRADO, TRABAJO	M	369.85	-296.22	73,6300	\$300.66	\$ 22,137.60
7	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO, T.M.A. 3/4", GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 10+-2 CM ACABADO	M2	470.84	-411.20	59,6415	\$379.41	\$ 22,628.58
8	LIMPIEZA FINAL, INCLUYE: BARRIDO CON AGUA, MATERIALES, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO.	M2	470.84	-470.84	0.0000	\$14.10	\$ -

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 SUB-TOTAL: \$ 56,760.78
 ANTICIPO 50%: \$ 216,349.97
 TOTAL: \$ 159,589.19

2022

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

Carlos Medrano Cervantes
 CARLOS MEDRANO CERVANTES
 GRUPO CONSTRUCTOR MED CER S.A. DE C.V.

NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA

T.C. Fernando Luna Medina
 T.C. FERNANDO LUNA MEDINA
 Residente de Obra

Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo

Arq. Alfredo Flores Marmolejo
 ARQ. ALFREDO FLORES MARMOLEJO
 Jefe Departamento de Supervisión

**PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA
PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.**




NO. DE OBRA:	FISMDF 026/2022
NO. DE CONTRATO:	FISMDF 006-008-009-026/2022
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE RAFAEL RAMÍREZ ENT
UBICACIÓN:	EJIDO OJO DE AGUA DEL MEZQUITE

NUMEROS GENERADORES

ESTIMACION No. 1

CROQUIS

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO
LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. INCLUYE: EQUIPO NECESARIO, PUENTE, SEÑALIZACION DEL BANCO Y PUNTOS QUE SE REQUIERAN EN LA NIVELACION CON PINTURA, RENIVELACIONES NECESARIAS, LIMPIEZAS.

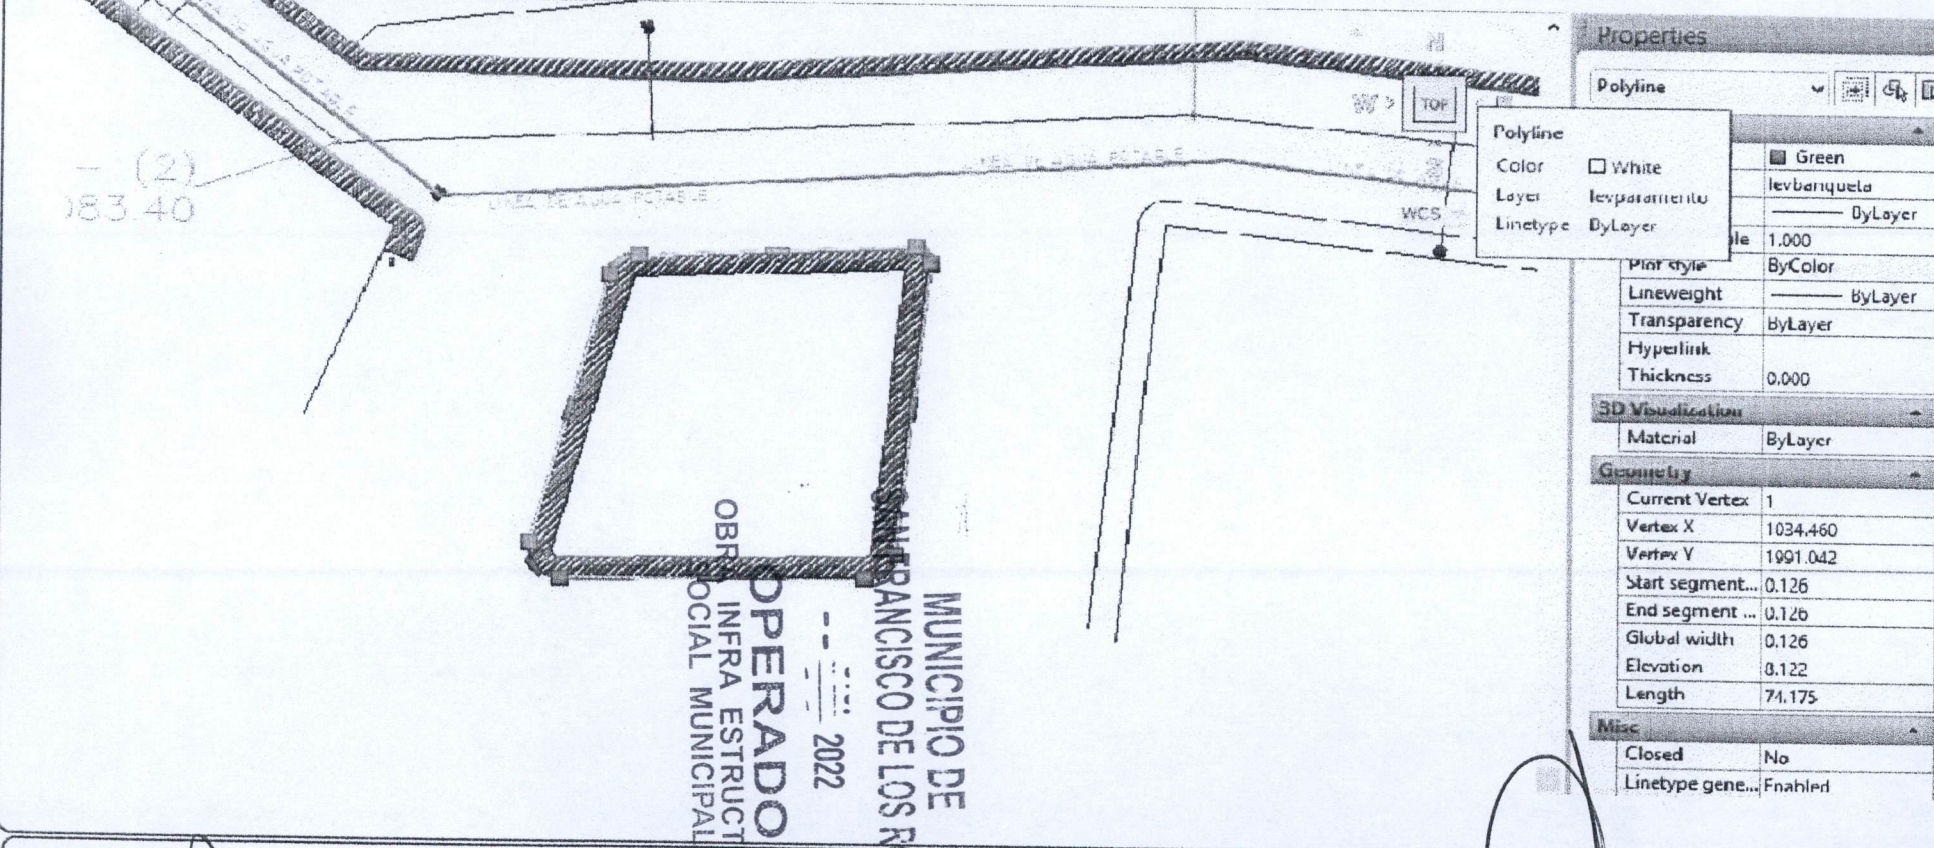

OBSERVACIONES:

SUPERINTENDENTE DE OBRA
GRUPO CONSTRUCTOR MED CER S.A. DE C.V.
NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA

RESIDENTE DE OBRA
Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
T.C. FERNANDO LUNA MEDINA

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA
PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

NUMEROS GENERADORES

NO. DE OBRA:	FIS MDF 026/2022
NO. DE CONTRATO:	FIS MDF 006-008-009-026/2022
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE RAFAEL RAMÍREZ ENT
UBICACIÓN:	EJIDO OJO DE AGUA DEL MEZQUITE





ESTIMACION No 1

FOTOGRAFIA

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. INCLUYE: EQUIPO NECESARIO, PUENTE, SEÑALIZACION DEL BANCO Y PUNTOS QUE SE REQUIERAN EN LA NIVELACION CON PINTURA, RENIVELACIONES NECESARIAS, LIMPIEZAS.

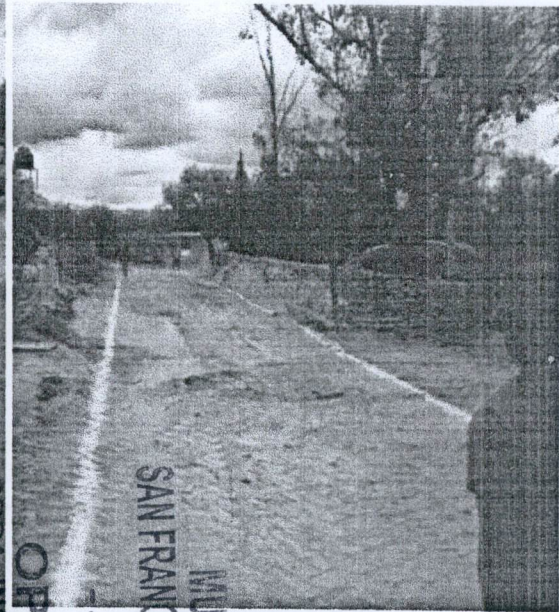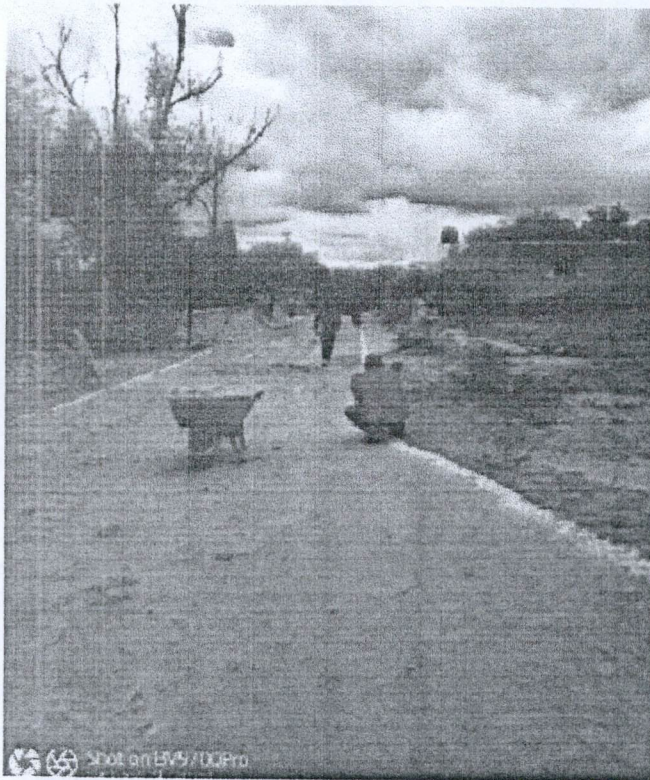

OBSERVACIONES:

SUPERINTENDENTE DE OBRA
GRUPO CONSTRUCTOR MED CER S.A. DE C.V.
NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA

OPERA DO
MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

RESIDENTE DE OBRA
Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
T.C. FERNANDO LUNA MEDINA



NUMEROS GENERADORES


NO. DE OBRA:	FISDMF 026/2022
NO. DE CONTRATO:	FISDMF 006-008-009-026/2022
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE RAFAEL RAMÍREZ ENT
UBICACIÓN:	EJIDO OJO DE AGUA DEL MEZQUITE

E S T I M A C I O N N o . 1

CROQUIS

DESCRIPCION DE CONCEPTO

EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II 0.00 A 2.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUDES, TRASPALEOS, ACARREOS A MAQUINA O A MANO HASTA PRIMERA ESTACIÓN 20 MTS, MEDIDO COMPACTO, COMPACTACIÓN DE LA BASE POR MEDIOS MECÁNICOS, TRABAJO TERMINADO.

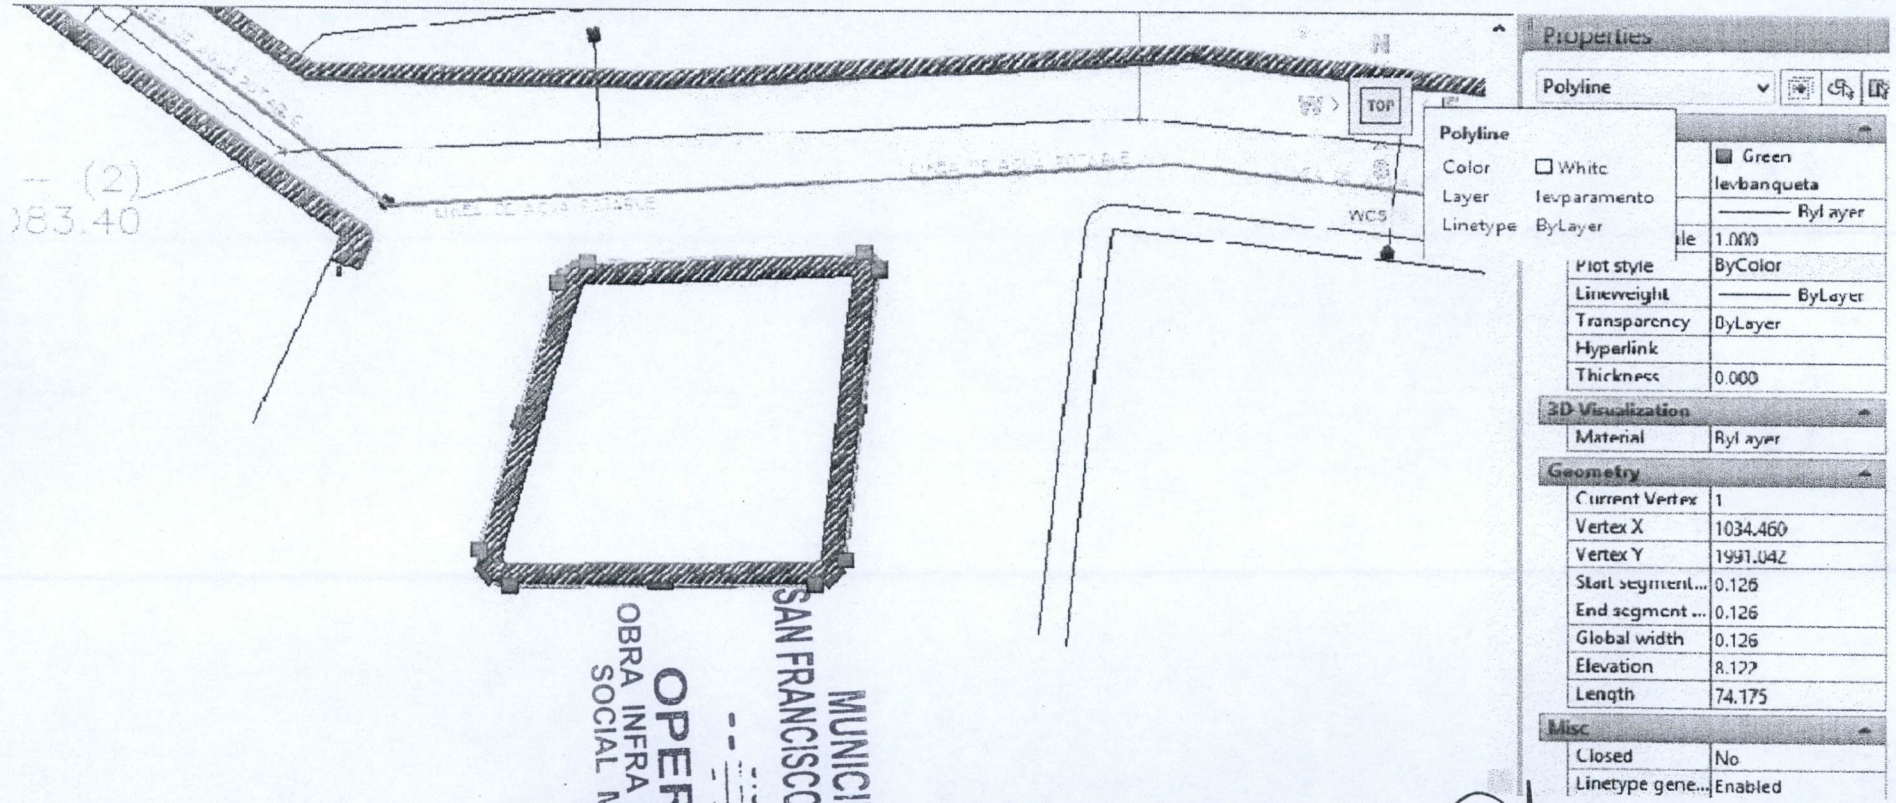

OBSERVACIONES

SUPERINTENDENTE DE OBRA
GRUPO CONSTRUCTOR MED CER S.A. DE C.V.
NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL
MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
2022

RESIDENTE DE OBRA
Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
T.C. FERNANDO LUNA MEDINA

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA
PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

NUMEROS GENERADORES

NO. DE OBRA:	FSMDF 026/2022
NO. DE CONTRATO:	FSMDF 006-008-009-026/2022
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE RAFAEL RAMÍREZ ENT
UBICACIÓN:	EJIDO OJO DE AGUA DEL MEZQUITE



Ayuntamiento de
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
2021 - 2024

ESTIMACION No. 1

FOTOGRAFIA

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO

EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II 0.00 A 2.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUDES, TRASPALEOS, ACARREOS A MAQUINA O A MANO HASTA PRIMERA ESTACIÓN 20 MTS, MEDIDO COMPACTO, COMPACTACIÓN DE LA BASE POR MEDIOS MECÁNICOS, TRABAJO TERMINADO.



OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL
MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
7-1-2022

OBSERVACIONES

SUPERINTENDENTE DE OBRA
GRUPO CONSTRUCTOR MED CER S.A. DE C.V.
NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA

RESIDENTE DE OBRA
Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
T.C. FERNANDO LUNA MEDINA

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.




NO. DE OBRA: FIS MDF 026/2022
 NO. DE CONTRATO: FIS MDF 006-008-009-026/2022
 DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE RAFAEL RAMÍREZ ENT
 UBICACIÓN: EJIDO OJO DE AGUA DEL MEZQUITE

NUMEROS GENERADORES

ESTIMACION No. 1

CROQUIS

DESCRIPCION DE CONCEPTO
 RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM CON BAILARINA EN CAPAS DE HASTA 20 cm. DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINSTRO DE TEPETATE, AGUA LE NECESARIA, MEDIDO COMPACTO, SELECCIÓN DEL MATERIAL, TENIDO, PAPEADO DE MATERIAL, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS.

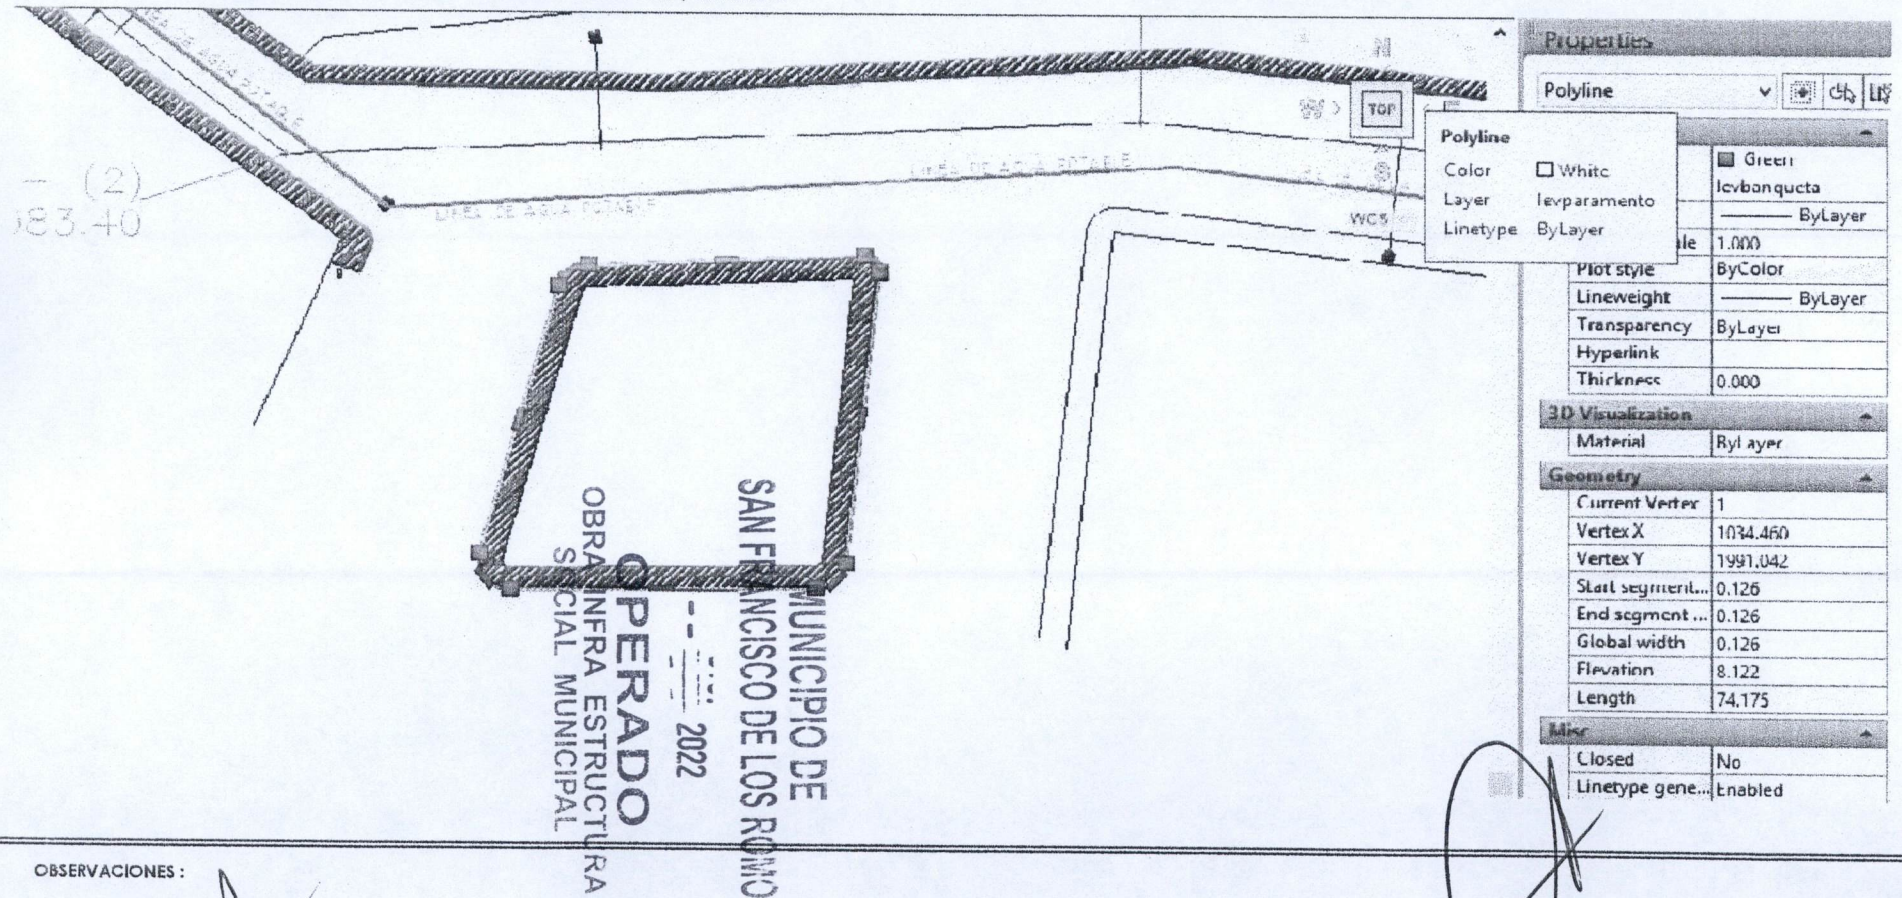

Properties

Polyline

Polyline

Color White

Layer levparamento

Linetype ByLayer

Color Green

Layer lcvbanqueta

Linetype ByLayer

Plot style ByColor

Lineweight ByLayer

Transparency ByLayer

Hyperlink

Thickness 0.000

3D Visualization

Material ByLayer

Geometry

Current Vertex 1

Vertex X 1034.460

Vertex Y 1991.042

Start segment... 0.126

End segment... 0.126

Global width 0.126

Elevation 8.122

Length 74.175

Misc

Closed No

Linetype gene... Enabled

OBSERVACIONES :

SUPERINTENDENTE DE OBRA
 GRUPO CONSTRUCTOR MED CER S.A. DE C.V.
 NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA

RESIDENTE DE OBRA
 Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
 T.C. FERNANDO LUNA MEDINA

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA
PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

NUMEROS GENERADORES

NO. DE OBRA:	FISMDF 026/2022
NO. DE CONTRATO:	FISMDF 006-008-009-026/2022
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE RAFAEL RAMÍREZ ENT
UBICACIÓN:	EJIDO OJO DE AGUA DEL MEZQUITE






ESTIMACION No. 1

FOTOGRAFIA

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO

GUARNICIÓN DE 15X20X40 CM DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=150 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA Y DESCIBRADO, TRABAJO TERMINADO

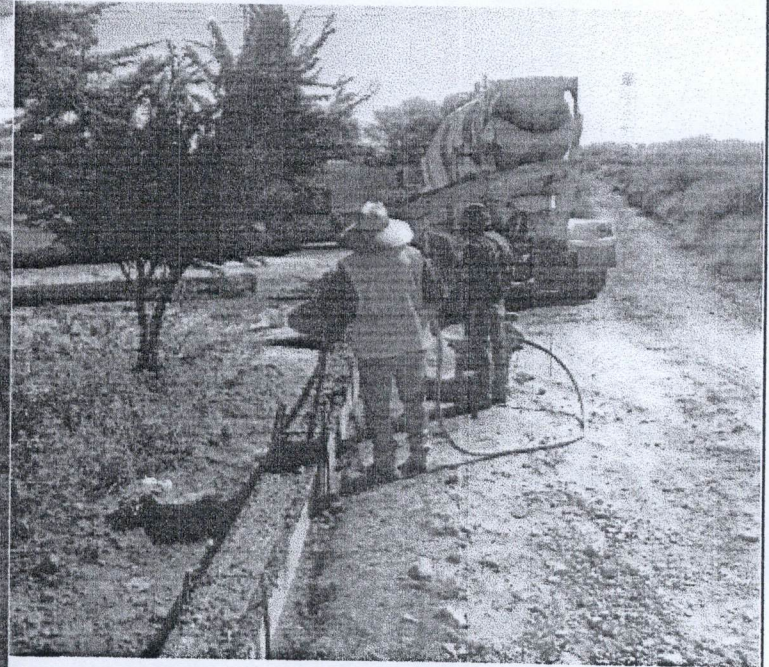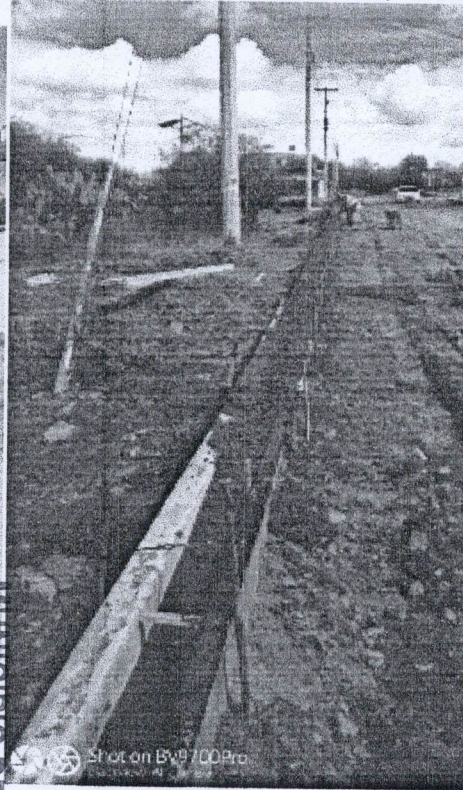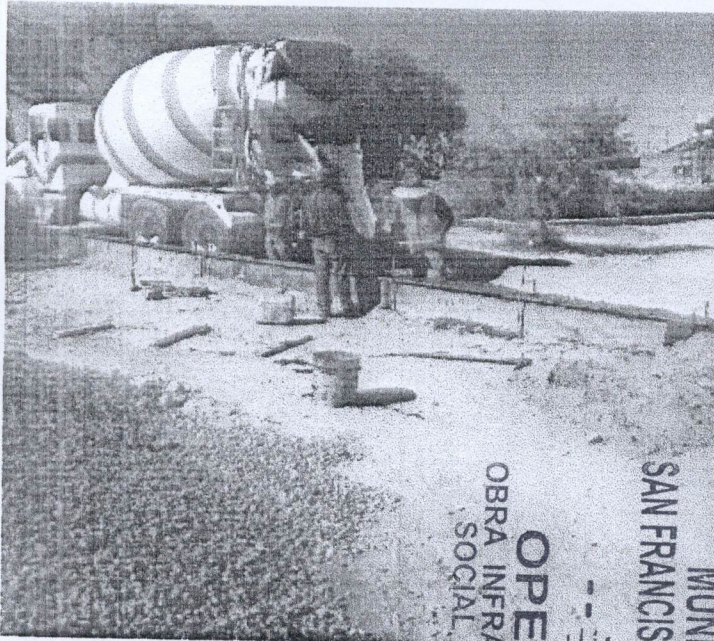

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL
2022

OBSERVACIONES :

SUPERINTENDENTE DE OBRA
GRUPO CONSTRUCTOR MED CER S.A. DE C.V.
NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA

RESIDENTE DE OBRA
Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
T.C. FERNANDO LUNA MEDINA

**PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA
PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.**



NUMEROS GENERADORES

NO. DE OBRA: FIS MDF 026/2022
 NO. DE CONTRATO: FIS MDF 006-008-009-026/2022
 DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE RAFAEL RAMÍREZ ENT
 UBICACIÓN: EJIDO OJO DE AGUA DEL MEZQUITE

ESTIMACION No. 1

No.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	AREA	ESPESOR	LADO	TOTAL	CROQUIS	FOTOGRAFIA
			EJE	TRAMO	TRAMO								
7	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO, T.M.A. 3/4", GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 10+-2 CM ACABADO RAYADO FINO CON BROCHA DE PELO, JUNTAS FRIAS CON DOBLADOR DE 2", SECCION DE LOSAS DE ACUERDO ALA EXISTENTE, INCLUYE: COLADO CURADO CON MEMBRANA A BASE DE AGUA Y TRABAJO TERMINADO SEGUN FICHA TECNICA FT-200.	M2	BANQUETA	0+000.00	0+073.63	73.63	1.28	94.19		N/A	94.19	ANEXO SE ANEXA PLANO EN DWG PARA CORROBORAR AREAS Y MEDIDAS.	
TOTAL											94.19		

OPERADO
 OBRA INFRA ESTRUCTURA
 SOCIAL MUNICIPAL
 2022
 MUNICIPIO DE
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

OBSERVACIONES:

SUPERINTENDENTE DE OBRA
 GRUPO CONSTRUCTOR MED CEP S.A. DE C.V.
 NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA

RESIDENTE DE OBRA
 Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
 T.C. FERNANDO LUNA MEDINA

**PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA
PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.**



NO. DE OBRA:	FISMDF 026/2022
NO. DE CONTRATO:	FISMDF 006-008-009-026/2022
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE RAFAEL RAMÍREZ ENT
UBICACIÓN:	EJIDO OJO DE AGUA DEL MEZQUITE


NUMEROS GENERADORES

ESTIMACION No. 1

CROQUIS

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO

CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO, T.M.A. 3/4", GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 10+-2 CM ACABADO RAYADO FINO CON BROCHA DE PELO, JUNTAS FRÍAS CON DOBLADOR DE 2", SECCION DE LOSAS DE ACUERDO ALA EXISTENTE, INCLUYE: COLADO, CURADO CON MEMBRANA A BASE DE AGUA Y TRABAJO TERMINADO SEGUN FICHA TECNICA FT-200.

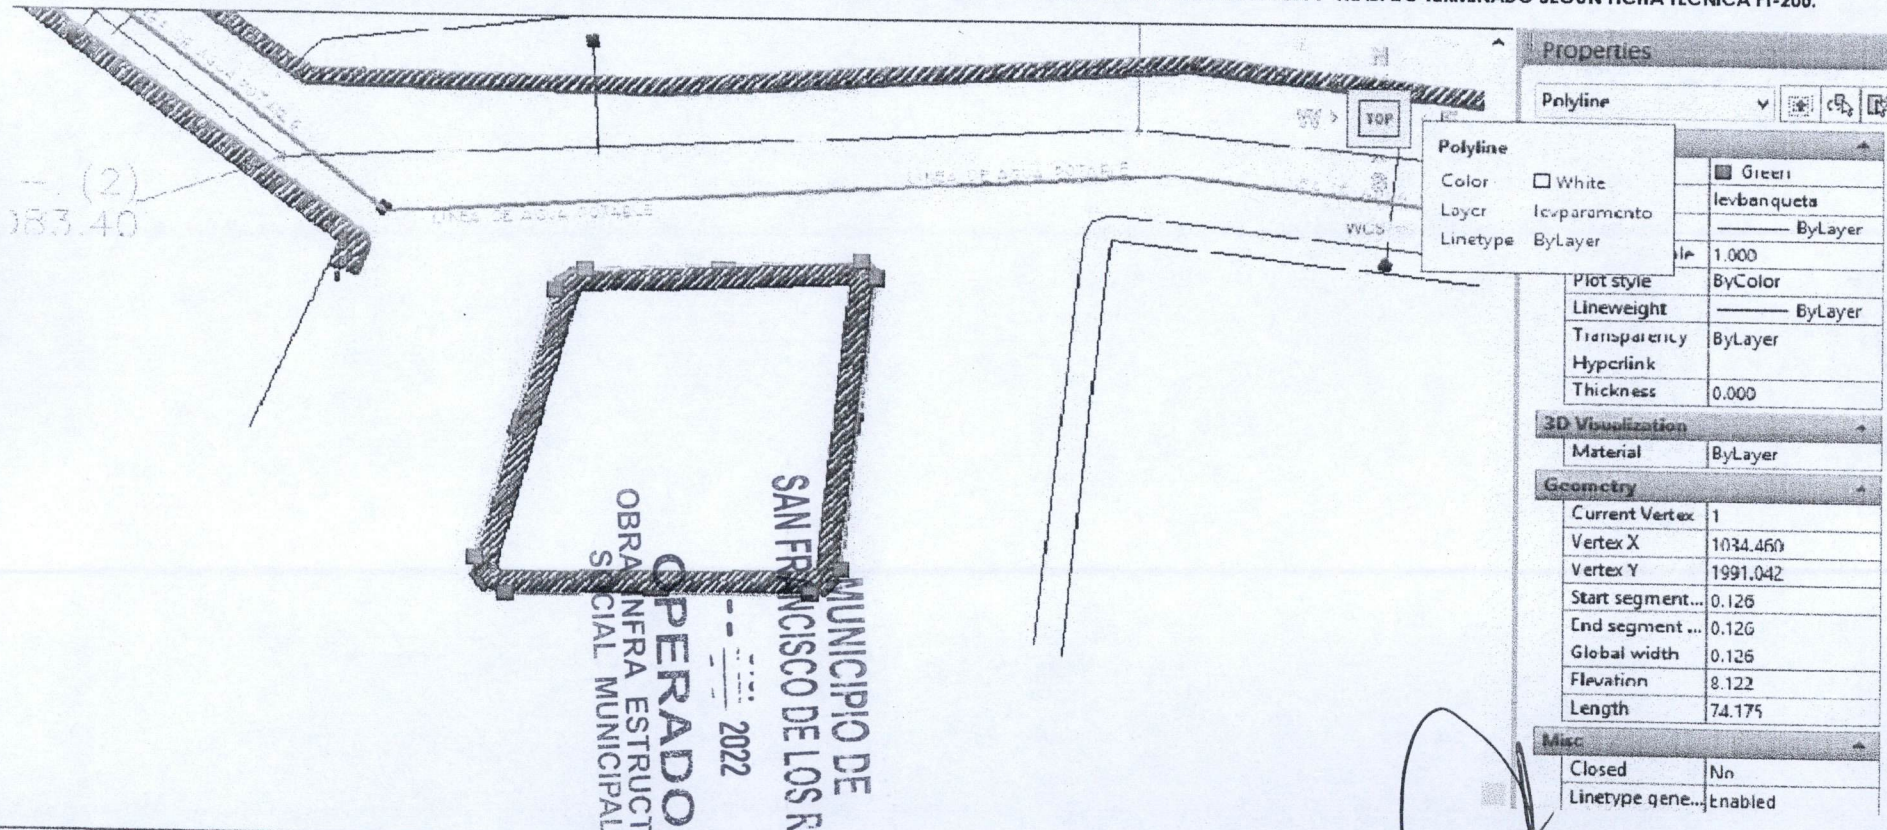

OBSERVACIONES:

SUPERINTENDENTE DE OBRA
GRUPO CONSTRUCTOR MED CER S.A. DE C.V.
NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA

RESIDENTE DE OBRA
Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
T.C. FERNANDO LUNA MEDINA

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA
PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.



NUMEROS GENERADORES



NO. DE OBRA:	FISMDF 026/2022
NO. DE CONTRATO:	FISMDF 006-008-009-026/2022
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE RAFAEL RAMÍREZ ENT
UBICACIÓN:	EJIDO OJO DE AGUA DEL MEZQUITE

E S T I M A C I O N N o . 1

FOTOGRAFIA


DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO

CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO, T.M.A. 3/4", GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 10+-2 CM ACABADO RAYADO FINO CON BROCHA DE PELO, JUNTAS FRIAS CON DOBLADOR DE 2", SECCION DE LOSAS DE ACUERDO ALA EXISTENTE, INCLUYE: COLADO, CURADO CON MEMBRANA A BASE DE AGUA Y TRABAJO TERMINADO SEGUN FICHA TECNICA FT-200.

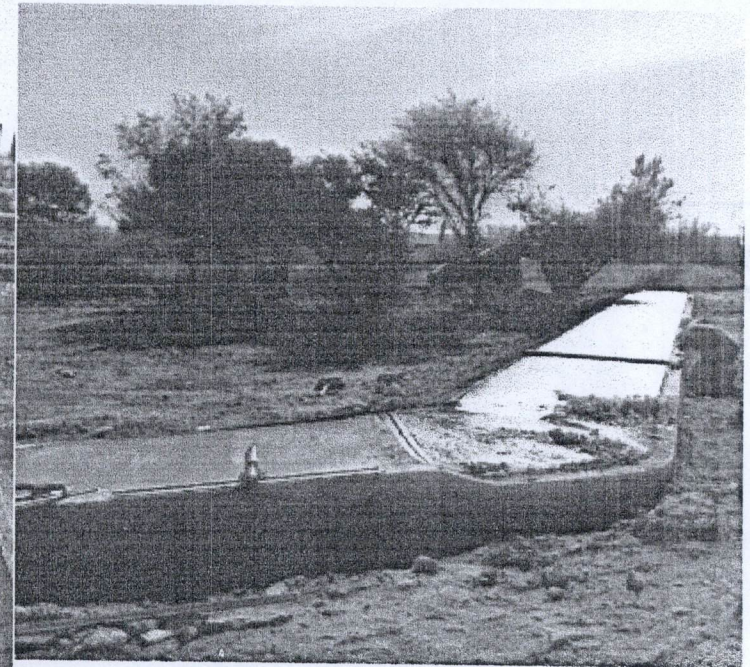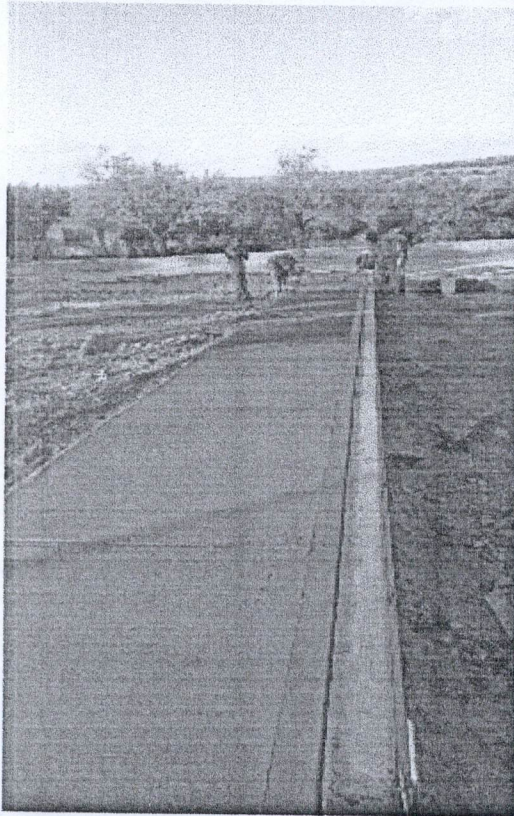

OBSERVACIONES:

~~_____
SUPERINTENDENTE DE OBRA
GRUPO CONSTRUCTOR MED CER S.A. DE C.V.
NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA~~


RESIDENTE DE OBRA
Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
TC. FERNANDO LUNA MEDINA

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA
PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

NUMEROS GENERADORES

NO. DE OBRA:	FISMDF 026/2022
NO. DE CONTRATO:	FISMDF 006-008-009-026/2022
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE RAFAEL RAMÍREZ ENT
UBICACIÓN:	EJIDO OJO DE AGUA DEL MEZQUITE




ESTIMACION No. 1

CROQUIS

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO

LIMPIEZA FINAL, INCLUYE: BARRIDO CON AGUA, MATERIALES, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO.

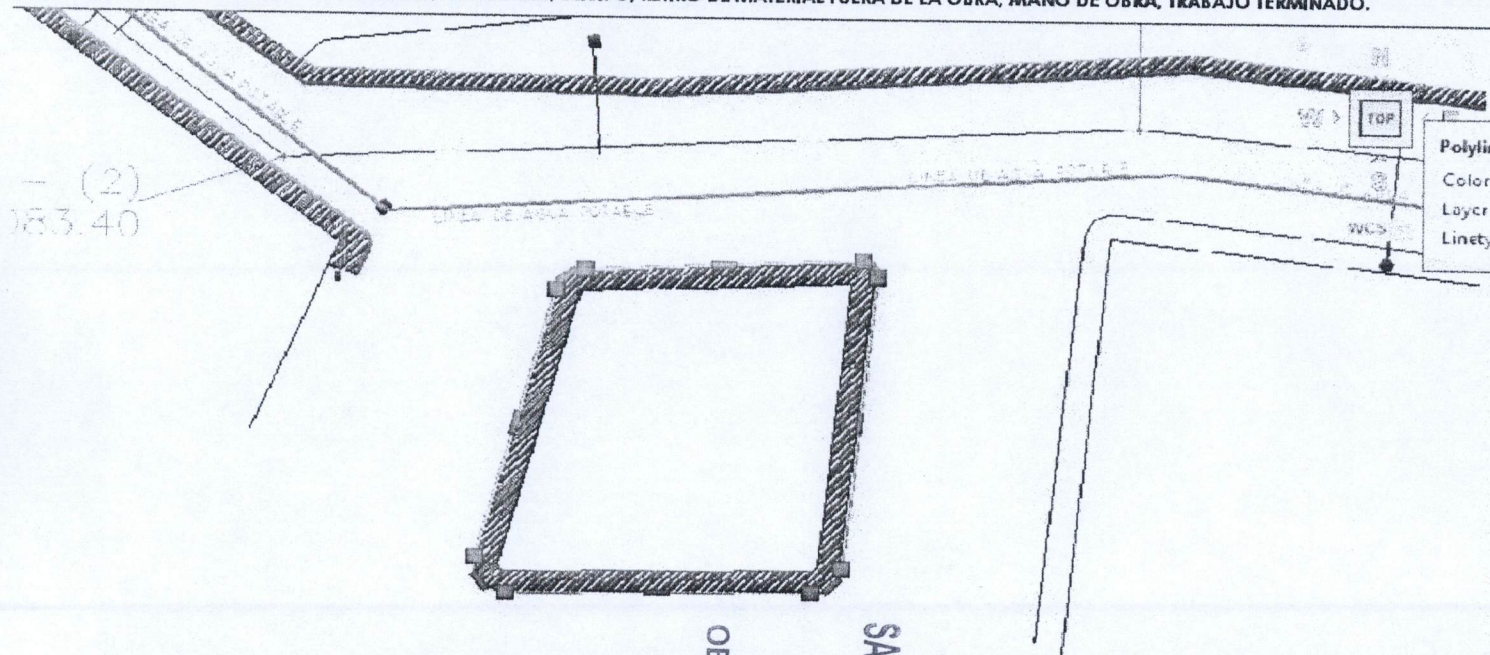

Properties

Polyline

Color White

Layer levbanqueta

Linetype ByLayer

Plot style ByColor

Lineweight ByLayer

Transparency ByLayer

Hyperlink

Thickness 0.000

3D Visualization

Material ByLayer

Geometry

Current Vertex 1

Vertex X 1034.460

Vertex Y 1441.047

Start segment... 0.126

End segment... 0.126

Global width 0.126

Elevation 8.122

Length 74.175

Misc

Closed No

Linetype gene... Enabled

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

OBSERVACIONES

SUPERINTENDENTE DE OBRA
GRUPO CONSTRUCTOR MED CER S.A. DE C.V.
NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA

RESIDENTE DE OBRA
Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
T.C. FERNANDO LUNA MEDINA

**PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA
PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.**

NUMEROS GENERADORES



San Francisco de los Romo
2021 - 2024


NO. DE OBRA: FISMDF 0261/2022
NO. DE CONTRATO: FISMDF 006-008-009-026/2022
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE RAFAEL RAMÍREZ ENT
UBICACIÓN: EJIDO OJO DE AGUA DEL MEZQUITE

E S T I M A C I O N N o.

FOTOGRAFIA

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO

LIMPIEZA FINAL , INCLUYE: BARRIDO CON AGUA , MATERIALES, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO.

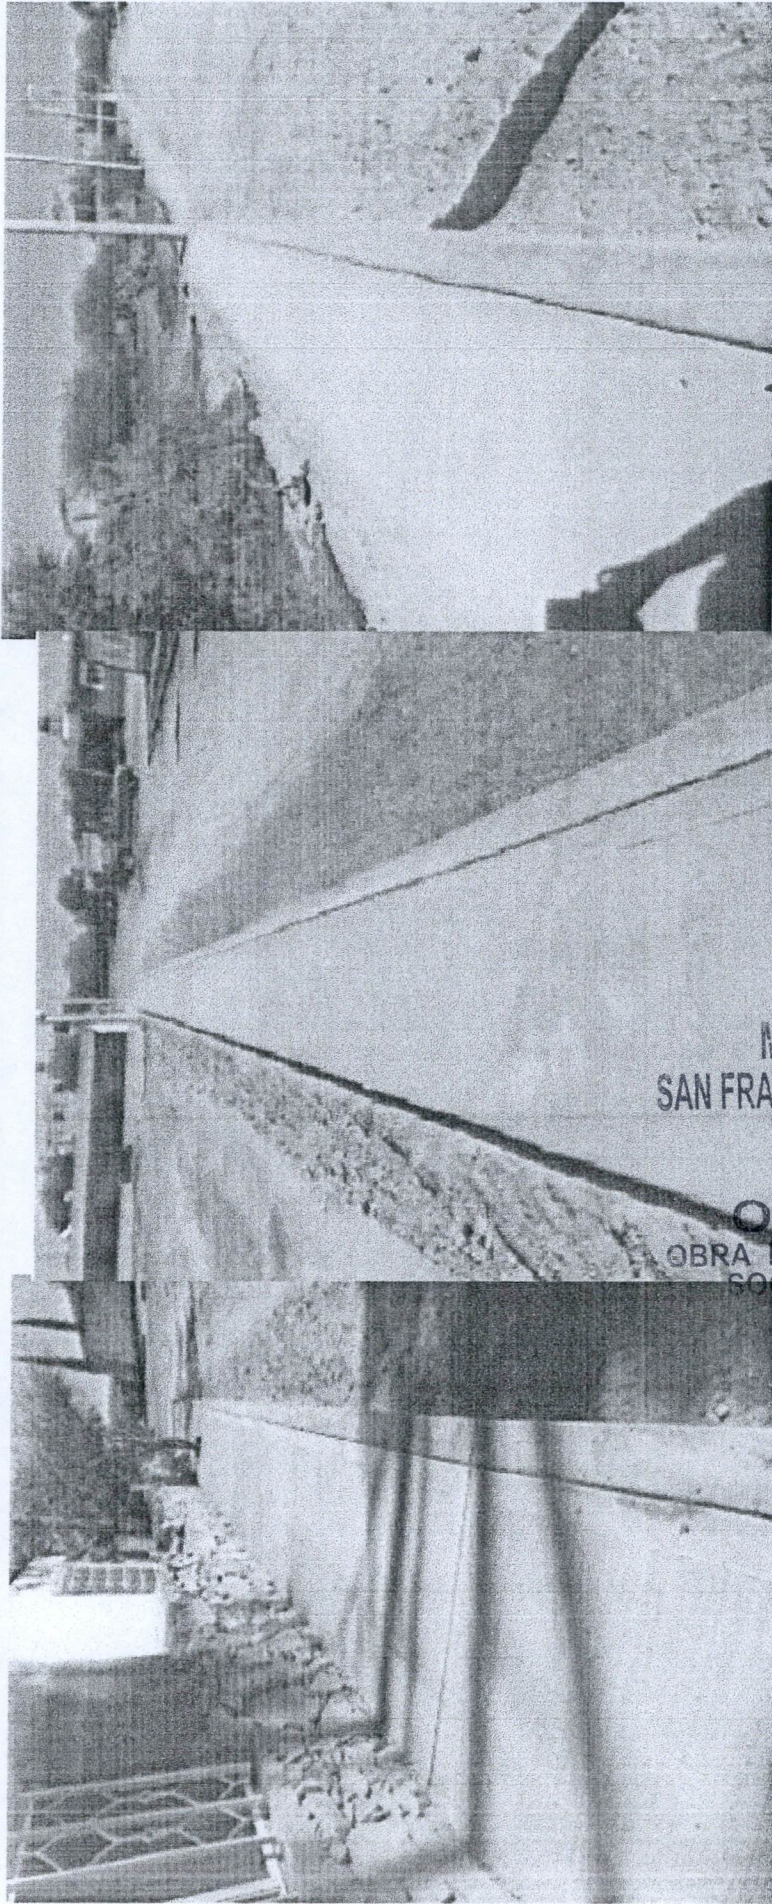

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

2022

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

OBSERVACIONES :

RESIDENTE DE OBRA
GRUPO CONSTRUCTOR MEDICER S.A. DE C.V.
NOMBRE Y FIRMA/CONTRATISTA

RESIDENTE DE OBRA
Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
T.C. FERNANDO LUNA MEDINA



CONTRATO FISMDF 026/2022

OBRA FISMDF 026/2022
15/ Dic / 2022

Con fecha de hoy esta supervisión autoriza la estimación número 2 (DOS) de la obra número FISMDF 026/2022 de la empresa denominada Grupo Constructor Mac Cor, S.A. de C.V. dicha estimación del contrato de esta obra, bajo las siguientes características:

- Periodo del 1 al 31 de Agosto 2022
- Entrega de generadores 07 Septiembre 2022
- Monto base \$ 56,760.79
- Amortización de Anticipo \$ 28,380.39
- Total de retenciones \$ 587.60
- Total a pagar \$ 32,353.66

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
2022
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

Dirección de
OBRAS PÚBLICAS

Ayuntamiento de
**SAN FRANCISCO
DE LOS ROMO**
2021 ♦ 2024



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
No. Oficio: DOP/568/22
San Francisco de los Romo, Ags., 16 de diciembre de 2022
Asunto: LIBERACIÓN DE PAGO

C.P.MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
PRESENTE

Por medio del presente le remito la documentación de la estimación No. 2, para que se realicen los trámites necesarios para su pago.

No. de Obra: FIS MDF 026/2022

Nombre de la Obra: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE RAFAEL RAMÍREZ ENTRE LA CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA Y CALLE PLAN DE SAN LUIS

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal

Contratista: GRUPO CONSTRUCTOR MED CER, S.A. DE C.V. (GCM120227RL6)

Contrato: FIS MDF 026/2022 No Factura: 851

Objeto del Contrato: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE RAFAEL RAMÍREZ ENTRE LA CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA Y CALLE PLAN DE SAN LUIS, EJIDO OJO DE AGUA DEL MEZQUITE EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCAL

Monto del Contrato: \$504,403.87 (QUINIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 87/100 M.N.)

Monto a Pagar: \$32,353.66 (TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 66/100 M.N.)

Sin otro particular de momento, me es grato enviarle un cordial saludo agradeciendo de antemano las atenciones al presente.

2
ATENTAMENTE

ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

2022

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

C.c.p. Archivo

Av. Benito Juárez S/N, Rancho La Trinidad,
San Francisco de los Romo, Ags. Tel: (465) 967 0124 ext. 1654
