



Usr: susana
Rep: rptPoliza

Municipio de San Francisco de los Romo
ESTADO DE AGUASCALIENTES

Póliza: C05749 Del 28/12/2022



Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2023 03:09 p. m.
Página | 1

Concepto: FISM 2022 PAGADO EST 3 FINIQUITO OBRA FISMDF 026/2022 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS
CALLE. GP Folio: 469

Beneficiario: GRUPO CONSTRUCTOR MED CER SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-2501-K014-J04-61402-2	CONSTRUCCIÓN Y/O	\$14,375.87		GP Folio: 469
0002	8270-2501-K022-J04-61401-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$2,471.93		GP Folio: 469
0003	8260-2501-K014-J04-61402-2	CONSTRUCCIÓN Y/O		\$14,375.87	GP Folio: 469
0004	8260-2501-K022-J04-61401-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y		\$2,471.93	GP Folio: 469
0005	1112-003-002	Bancomer Cta. 011793039-9 FISM		\$2,326.69	GP Folio: 469
0006	2117-9-005-001	0.1% COLEGIO DE		\$14.52	FISM 2022 PAGADO EST 3 FINIQUITO OBRA FISMDF 026/2022
0007	2117-9-005-002	0.2% ORGANO SUPERIOR DE		\$29.05	FISM 2022 PAGADO EST 3 FINIQUITO OBRA FISMDF 026/2022
0008	2117-9-005-003	0.2% INST. DE CAPACIT. DE LA		\$29.05	FISM 2022 PAGADO EST 3 FINIQUITO OBRA FISMDF 026/2022
0009	2117-9-005-004	0.5% CONTRALORIA MUNICIPAL		\$72.62	FISM 2022 PAGADO EST 3 FINIQUITO OBRA FISMDF 026/2022
0010	1134-003-005	Grupo Constructor MED CER, SA de		\$14,375.87	FISM 2022 PAGADO EST 3 FINIQUITO OBRA FISMDF 026/2022
0011	2113-000272	CONSTRUCCIÓN Y/O	\$16,847.80		GP Folio: 469
Sumas iguales =>			33,695.60	33,695.60	

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

2022

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL



Fecha y hora de consulta

28/12/2022 5:47:30 PM

Contrato

00796395

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: EST 3 FI FIS MDF 026

Importe de la operación: 2,326.69 MXP

Cuenta de retiro: 0117930399

Cuenta de depósito: 014010655083510074

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Titular de la cuenta: GRUPO CONSTRUCTOR MED CER SA D

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 28/12/2022

Fecha de aplicación: 28/12/2022

Concepto de pago: PAGO EST 3 FIN FIS MDF 11-026

Referencia numérica: 281222

Instrumento de seguridad: ASD 6550927880

Hora de captura en el canal: 17:47:24

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000549408

Clave de rastreo: 002601002212280000549408

Folio de firma: 0090753134

Folio único: 1401202212281747240090753140

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
2022
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	---	28/12/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	28/12/2022



GRUPO CONSTRUCTOR MED CER SA DE CV
GCM120227RL6
 LIMA 1906
 VERSALLES 1A SECCIÓN
 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES.
 AGUASCALIENTES, México C.P. 20285
 (601) General de Ley Personas Morales
 Teléfonos:
 Tipo Comprobante: (P) Pago

Documento Pago DP 285
Folio fiscal
 a74a36b4-6d41-4585-9c19-de1ab0d1d94a
RFC Certificador
 LSO1306189R5
No. certificado del SAT
 00001000000509846663
Fecha y hora certificación
 2023-01-04 09:03:35
Lugar Expedición: Aguascalientes, 20285

RFC	MSF920130TQ9	Fecha expedición	04/01/2023 09:03:34
Nombre	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	Uso CFDI	(P01) Por definir
Calle	FRANCISCO ROMO JIMENEZ 102		
Colonia	SAN JOSE DE BUENAVISTA Municipio SAN FRANCISCO DE LOS ROMO C.P. 20300		
Ciudad, Estado	SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES. México		

Clave	ProdServ	Cantidad	Cve. Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
	84111506	1	(ACT) Actividad	Pago	0	0
Subtotal						0.00
Total						0.00

CERO XXX 00/100

Ordenante	BBA830831LJ2	012010001179303990	Beneficiario	BSM970519DU8	014010655083510074
Forma Pago	(03) Transferencia electrónica de fondos			Número Operación	281222
Fecha Pago	2022-12-28T12:00:00				

Documentos Pagados

UUID	Documento	Metodo Pago	Importe	Moneda
9b137232-b240-48fe-8f92-4ad1271ffa21	982	PPD	2,326.69	MXN
<i>Parcialidad : 1</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Insoluto</i>	123.94	
Total			2,326.69	MXN

DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 69/100 M.N.

Número Certificado 00001000000506436295

Sello digital del CFDI

Dh1zbbYKpbVz6sED4cf0tK2gfelwNDqMwnHCgH591XKRBAU/Uv9iFv0C3MGLYZBpruKXdoh2fUqXReulPvVihvevOQ65M1tX1HCCn1Mo8TISLSzv46SxyaTIHwvTRR
 JWGCb/4CpfO+6C4HyI7H8CIACHJv+vmNjMVAjKJBY7/6PdT80/dNqI7eHq84IefjYXbSjPlSYUm0ToFwFRXnicoXjKSNX73HKBikRvVxxr0jswlG0nNH0m5PUpfZ0T
 8+EwX7fD4UXU4fDboT6NNHdIuKiZRBXxSnMWngCqPugPDYLRrJzJi+eMZTavv25nI9kgFUXIIYilbGZSNggHSmA==

Sello del SAT

QbV+KTtQg1a16LcvHv6A+9674Lj8xygQiFAwh2uZFSWI+3PeElCrQ7qqgRleBNIUz6gv819bN6PHr5ZBNs4F3o6pAwjiMeMFwicsJqqaT9vJMNAl2pEz7RZ3y1gCeko
 FQfEvJJa6fd5po65g7oZL2T35wImztd8sMKJTCfMnw0kg8uf0pD+YFKVSDk+Y1NeDOVgW11Btw27ct1Fy4Uy7kz2/S+u0Eh4hR1qXZT4caaFmly/dRON1KPNvSRmQOC
 pBFGj5niysuGqxJLGHudaDqJPcahG/Fn61oSrUneceWJr4EmhvCyG1fLxUlhQudKrrp6TAauwiYBS/ZOor9yk+w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|a74a36b4-6d41-4585-9c19-delab0d1d94a|2023-01-04T09:03:35|LSO1306189R5|Dh1zbbYKpbVz6sED4cf0tK2gfelwNDqMwnHCgH591XKRBAU/Uv
 9iFv0C3MGLYZBpruKXdoh2fUqXReulPvVihvevOQ65M1tX1HCCn1Mo8TISLSzv46SxyaTIHwvTRR JWGCb/4CpfO+6C4HyI7H8CIACHJv+vmNjMVAjKJBY7/6PdT80/
 dNqI7eHq84IefjYXbSjPlSYUm0ToFwFRXnicoXjKSNX73HKBikRvVxxr0jswlG0nNH0m5PUpfZ0T8+EwX7fD4UXU4fDboT6NNHdIuKiZRBXxSnMWngCqPugPDYLRrJ
 zJi+eMZTavv25nI9kgFUXIIYilbGZSNggHSmA=|00001000000509846663||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3



MUNICIPIO DE
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.
PAGADO
 FINANZAS

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 -- 2022
OPERADO
 OBRA INFRA ESTRUCTURA
 SOCIAL MUNICIPAL

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/Pagos
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pagos/Pagos10.xsd" xmlns:pago10="http://www.sat.gob.mx/Pagos" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
Certificado="MIIGGzCCBAOgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDY0MzYyOTUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQOQDBdBVVRPUkl
Sello="Dh1zbbYKpbVz6sED4cf0tK2gfelwNDqQMwnHCgH59IXKRBau/Uv9iFv0C3MG1YZBpruKXdoH2fUqXReu1pVvihvevOQ65MltX1HCCnlMo8TISLszv46S
NoCertificado="00001000000506436295" LugarExpedicion="20285" TipoDeComprobante="P" Total="0" Moneda="XXX" SubTotal="0" Fecha="2023-01-04T09:03:34"
Folio="285" Serie="DP" Version="3.3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="GRUPO CONSTRUCTOR MED CER SA DE CV" Rfc="GCM120227RL6"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO" Rfc="MSF920130TQ9" UsoCFDI="P01"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="0" ValorUnitario="0" Descripcion="Pago" ClaveUnidad="ACT" Cantidad="1" ClaveProdServ="84111506"/>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Complemento>
    - <pago10:Pagos Version="1.0">
      - <pago10:Pago CtaBeneficiario="014010655083510074" RfcEmisorCtaBen="BSM970519DU8" CtaOrdenante="012010001179303990"
        RfcEmisorCtaOrd="BBA830831LJ2" NumOperacion="281222" Monto="2326.69" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="03" FechaPago="2022-12-
        28T12:00:00">
          <pago10:DoctoRelacionado Folio="982" ImpSaldoInsoluto="123.94" ImpPagado="2326.69" ImpSaldoAnt="2450.63" NumParcialidad="1"
            MetodoDePagoDR="PPD" MonedaDR="MXN" IdDocumento="9b137232-b240-48fe-8f92-4ad1271ffa21"/>
        </pago10:Pago>
      </pago10:Pagos>
    </cfdi:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>

```

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

-- 2022

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

CÉDULA DE SEGUIMIENTO A ESTIMACIONES DE OBRA

Ayuntamiento de
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
2021 • 2024



DATOS GENERALES

CONTRATISTA: GRUPO COSTRUCTOR MED CER, S.A. DE C.V.
 SUPERVISOR T.C. FERNANDO LUNA MEDINA
 OBRA: REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE A
 FECHA DE CORTE: DEL: 01 sep.2022 AL: 29.sep.2022

N° DE CONTRATO: FISMDF 026/2022
 N° DE OBRA: FISMDF 026/2022
 N° DE FACTURA:
 N° DE ESTIMACION: 3 (TRES FINIQUITO)
 IMPORTE LIQUIDO: \$ 2,326.69

FORMATO DE NUMEROS GENERADORES

INGRESO	REVISIÓN	NOTA	CAPTURA EN SISTEMA	ENTREGA DE PREFACTURA
24-oct-22	28-oct-20	<i>Sr. contratista regrese esta cédula con la estimación original de lo contrario no se le da trámite</i>	28-oct-20	28-oct-20
CONTRATISTA	SUPERVISOR		SUPERVISOR	SUPERVISOR

FORMATO DE ESTIMACION

INGRESO	REGISTRO	SUPERVISOR	JEFE DE DEPARTAMENTO
15/12/2022	16/12/22	15/12/2022	16/12/22
CONTRATISTA	CONTROL DE ESTIMACIONES	RECIBIDO	AUTORIZADO

DEVOLUCIÓN

FECHA DE DEVOLUCIÓN: 28/10/2022
 FECHA DE REINGRESO: 15/12/2022
 MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN:
 - FACTAN FOTOS
 - CONFECHA CROQUIS
 - FIANZA Y.O.

CONTENIDO

CÁRATULA	X
RESUMEN	X
CONCEPTOS	X
ESTADO DE CUENTA	X
CONCENTRADO DE CONCEPTOS (FIN)	X
GENERADORES Y RESUMEN	X
CROQUIS	X
FOTOGRAFIAS	X
ANÁLISIS PRECIO UNITARIO	
REPORTE(S) DE LABORATORIO	
FIANZA(S) (FIN)	
NOTA DE BITACORA DE OBRA	X

DIRECTOR GENERAL

ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA
 16/12/22 16/12/22
 RECIBIDO AUTORIZADO

FINANZAS

RECIBIDO AUTORIZADO

TRAMITE DE PAGO

FECHA DE INICIO DE TRÁMITE EN DOP-SFR	FIRMA DEL DIRECTOR	OFICIO DE LIBERACION	FECHA DE ENTREGA
24 10 22	16 12 22	16 12 22	
DÍA: MES: AÑO:	DÍA: MES: AÑO:	DÍA: MES: AÑO:	DIRECCIÓN DE EGRESOS.

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES

OBRA: FISMDF 006/2022
 LOCALIZACIÓN: LA CONCEPCIÓN
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2022
 PROGRAMA: SD ALCANTARILLADO
 SUB-PROGRAMA: 01 REHABILITACIÓN
 CONSTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR MED CER, S.A. DE C.V.
 CONTRATO: FISMDF 006-008-009-026/2022

OBRA: FISMDF 026/2022
 LOCALIZACIÓN: OJO DE AGUA DEL MEZQUITE
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2022
 PROGRAMA: SE URBANIZACIÓN
 SUB-PROGRAMA: 03 GUARNICIONES Y BANQUETAS
 CONSTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR MED CER, S.A. DE C.V.
 CONTRATO: FISMDF 006-008-009-026/2022

OPERADO
 OBRA INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 2022

FISMDF 006/2022 MONTO CONTRATADO \$387,258.72
 FISMDF 026/2022 MONTO CONTRATADO \$501,931.94
 FISMDF 026/2022 1) AMPLIACIÓN \$2,471.93
(FISM 006-026/2022) CONTRATOADO + AMPLIACIÓN \$891,662.59
 FISMDF 006/2022 ANTICIPO \$193,629.36
 FISMDF 026/2022 ANTICIPO \$250,965.97
(FISM 006-026/2022) ANTICIPO \$444,595.33
 FISMDF 006/2022 TOTAL ESTIMADO \$358,690.08
 FISMDF 026/2022 TOTAL ESTIMADO \$504,403.87
(FISM 006-026/2022) ESTIMADO \$863,093.95

No. Estimación	Período	Importe Estimación	Amortización de Anticipo (-)	Anticipo por amortizar	IVA (+)	Cargo de la obra	DEDUCCIONES (-)						RETENCIÓN (-)	REINTEGRO (+)	SANCIONES (-)	IMPORTE A PAGAR
							CMIC (0.2)	COL. PROF (0.1)	SFP (0.0)	CONG. EDO (0.2)	MUNICIPAL (0.5)	ISR (0.0)				
ANTICIPO FISMDF 006/2022				\$166,921.86	\$26,707.50	\$193,629.36										\$193,629.36
ANTICIPO FISMDF 026/2022				\$216,349.97	\$34,616.00	\$250,965.97										\$250,965.97
TOTAL DE ANTICIPO FISMDF 006-026/2022				\$383,271.83	\$61,323.50	\$444,595.33										\$444,595.33
1 FISMDF 006/2022	DEL 01 AGL 2022 AL 17 SEP 2022	\$283,057.73	\$141,528.87	\$25,392.99	\$22,644.62	\$164,173.48	\$566.12	\$283.06	\$0.00	\$566.12	\$1,415.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,342.89
2 FISMDF 006/2022	DEL 18 SEP 2022 AL 29 SEP	\$13,764.86	\$13,000.00	\$12,392.99	\$122.38	\$887.24	\$27.53	\$13.76	\$0.00	\$27.53	\$68.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749.60
TOTAL FISM 006/2022		\$296,822.59	\$154,528.87	\$12,392.99	\$49,474.50	\$358,690.08	\$593.65	\$296.82	\$0.00	\$593.65	\$1,484.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355,721.85
1 FISMDF 026/2022	DEL 01 AGL 2022 AL 17 SEP 2022	\$375,939.16	\$187,969.58	\$28,380.39	\$30,075.13	\$218,044.71	\$751.88	\$375.94	\$0.00	\$751.88	\$1,879.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,285.31
2 FISMDF 026/2022	DEL 01 AGL 2022 AL 31 AGO 2022	\$56,760.79	\$28,380.39	\$0.00	\$4,540.86	\$32,921.26	\$113.52	\$56.76	\$0.00	\$113.52	\$283.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,353.66
3 FISMDF 026/2022	DEL 01 SEP 2022 AL 29 SEP 2022	\$14,523.96	\$12,392.99	-\$12,392.99	\$340.96	\$2,471.93	\$29.05	\$14.52	\$0.00	\$29.05	\$72.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,326.69
TOTAL FISM 026/2022		\$447,223.91	\$228,742.96	-\$12,392.99	\$69,572.95	\$504,403.87	\$894.45	\$447.22	\$0.00	\$894.45	\$2,236.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,931.63
TOTAL 006-0226/2022		\$744,046.50	\$383,271.83	\$0.00	\$119,047.45	\$863,093.95	\$1,488.10	\$744.04	\$0.00	\$1,488.10	\$3,720.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$855,653.48

[Handwritten signature]

PRE-FACTURA De Cierre



PRE-FACTURA DEL CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR MED CER, S.A. DE C.V. (201)

A NOMBRE DE: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 RFC: MSF920130TQ9
 DIRECCION: FCO ROMO JIMENEZ 102, SAN JOSE DE BUENAVISTA, SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS,
 CIUDAD: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE L ESTADO: AGUASCALIENTES

DESCRIPCION


PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 Del 01 Sep 2022 al 29 Sep 2022		MONTO BASE	\$14,523.96
DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE RAFAEL RAMÍREZ ENTRE LA CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA Y CALLE PLAN DE SAN LUIS	AJUSTE DE COSTOS (+)	\$0.00
		AMORTIZACION DE ANTICIPO (-)	\$12,392.99
UBICADA EN:	EJIDO OJO DE AGUA DEL MEZQUITE EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCA	SUBTOTAL	\$2,130.97
CON AMPARO DEL CONTRATO No.:	FISMDF 026/2022	IVA (+)	\$340.96
DE FECHA: 18/07/2022		SUBTOTAL CON IVA	\$2,471.93
BAJO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA:			
Inversion	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal 2022		
Programa	SE URBANIZACIÓN		
SubPrograma	03 GUARNICIONES Y BANQUETAS		
Obra.	FISMDF 026/2022 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE RAFAEL RAMÍREZ ENTRE LA CALLE REVOLUCI		
Localizacion	EJIDO OJO DE AGUA DEL MEZQUITE EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCAL		
	CAPACITACION DE LOS TRABAJADORES DEL CONTRATISTA	\$29.05 (0.20%)	
	COLEGIOS DE PROFESIONISTAS SEGUN CORRESPONDA	\$14.52 (0.10%)	
	SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	\$0.00 (0.00%)	
	FISCALIZACION DEL H. CONGRESO DEL ESTADO	\$29.05 (0.20%)	
	INSPECCION DE VIGILANCIA PARA LA CONTRALORIA	\$72.62 (0.50%)	
	SERVICIOS RELATIVOS A LAS CONSTRUCCIONES	\$0.00	
Avance Fisico Real %		\$145.24	
Avance Fisico Programado 100.00%			
Fecha Terminación Prog. 16/09/2022			
	TOTAL DE RETENCIONES (-)		\$145.24
	SANCION POR RETRASO (-)		\$0.00
	SUBTOTAL MENOS RETENCIONES		\$2,326.69
	RETENCION POR RETRASO(-)		\$0.00
	REINTEGRO POR RETENCION		\$0.00
	OTRAS SANCIONES(-)		\$0.00
	TOTAL A PAGAR		\$2,326.69
DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 69/100 M.N.			

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 2022

ESTADO DE CUENTA

Obra.	FISMDF 026/2022 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE RAFAEL RAMÍREZ ENTRE LA CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA Y CALLE PLAN DE SAN JUAN	Total Contrato	501,931.94
Localización	EJIDO OJO DE AGUA DEL MEZQUITE EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCAL	Total Ampliaciones	2,471.92
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura So	Total Contratado	504,403.86
Programa	SE URBANIZACIÓN	Anticipo ()%	250,965.97
SubPrograma	03 GUARNICIONES Y BANQUETAS	Estimado Anterior	501,931.94
Contratista	GRUPO CONSTRUCTOR MED CER, S.A. DE C.V. (201) CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE RAFAEL RAMÍREZ ENTRE LA CALLE	Esta Estimacion	2,471.92
Contrato	FISMDF 026/2022 REVOLUCIÓN MEXICANA Y CALLE PLAN DE SAN JUAN	Total Estimado	504,403.86
Estimacion No.	3 Del 01 Sep 2022 al 29 Sep 2022	Total por Estimar	0.00


No. Estimac.	Período	Importe Estimación	Amortización de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA (+)	Cargo a la Obra	DEDUCCIONES (-)						Retención (-)	Reintegro (+)	Sanciones (-)	Importe a Pagar
							CMIC(0)	Cofo.Prof.(0)	SFP(0.5)	Cong. Edo.(0.2)	Municipal	ISRuOtro(0)				
Anticipo				216,349.97	34,616.00	250,965.97										250,965.97
1	Del 01 Ago 2022 al 17 Sep	375,939.16	187,969.58	28,380.39	30,075.13	218,044.71	751.88	375.94	0.00	751.88	1,879.70	0.00	0.00	0.00	0.00	214,285.31
2	Del 01 Ago 2022 al 31 Ago	56,760.79	28,380.39	0.00	4,540.86	32,921.26	113.52	56.76	0.00	113.52	283.80	0.00	0.00	0.00	0.00	32,353.66
3	Del 01 Sep 2022 al 29 Sep	14,523.96	12,392.99	-12,392.99	340.96	2,471.92	29.05	14.52	0.00	29.05	72.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2,326.69
TOTALES		447,223.91	228,742.96		69,572.95	504,403.86	894.45	447.22	0.00	894.45	2,236.12	0.00	0.00	0.00	0.00	499,931.63



OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

2022

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO



RESUMEN DE ESTIMACION

Obra.	FIS MDF 026/2022 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE RAFAEL RAMÍREZ ENTRE LA CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA Y CALLE PLAN DE SAN LUIS		Total Contrato	\$501,931.94
Localización	EDIDO OJO DE AGUA DEL MEZQUITE EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCAL		Total Ampliaciones	\$2,471.92
Fuente Financ.			Total Contratado	\$504,403.86
Programa	SE URBANIZACIÓN		Anticipo (50)%	\$250,965.97
SubPrograma	03 GUARNICIONES Y BANQUETAS		Estimado Anterior	\$501,931.94
Supervisor	FERNANDO LUNA MEDINA (LUMF740415)		Esta Estimacion	\$2,471.92
Contratista	GRUPO CONSTRUCTOR MED CER, S.A. DE C.V. (201)		Total Estimado	\$504,403.86
Contrato	FIS MDF 026/2022 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE RAFAEL RAMÍREZ ENTRE LA CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA Y CALLE PLAN DE SAN LUIS		Saldo por Estimar	\$0.00
Estimacion No.	3 (De Cierre)			
Recibí de	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	la Cantidad de:	\$2,471.93 DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO PESOS 93/100 M.N.	

GRUPO PARTIDA

* CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE RAFAEL RAMÍREZ ENTRE LA CALLE REVOLUCIÓN MEX			\$14,523.96
- GUARNICIONES Y BANQUETAS			\$14,523.96
		SUMA	\$14,523.96
Fecha Terminación Prog.		AJUSTE DE COSTOS (+)	\$0.00
		AMORTIZACION DE ANTICIPO (-)	\$12,392.99
		SUBTOTAL	\$2,130.97
		IVA (+)	\$340.96
		SUBTOTAL CON IVA	\$2,471.92

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL
 2022

GRUPO CONSTRUCTOR MED CER, S.A. DE C.V. (GCM120227RL6)

Contratista

T.C. FERNANDO LUNA MEDINA (LUMF740415)

SUPERVISOR

CONCEPTOS DE ESTIMACION

De Cierre



Obra.	FISMDF 026/2022 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE RAFAEL RAMÍREZ ENTRE LA CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA Y CALLE PLAN DE SAN LUIS		Total Contrato	\$501,931.94
Localizacion	EJIDO OJO DE AGUA DEL MEZQUITE EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCAL		Total Ampliaciones	\$2,471.92
Fuente Financ.			Total Contratado	\$504,403.86
Programa	SE URBANIZACIÓN		Anticipo (50)%	\$250,965.97
SubPrograma	03 GUARNICIONES Y BANQUETAS		Estimado Anterior	\$501,931.94
Supervisor	FERNANDO LUNA MEDINA (LUMF740415)		Esta Estimacion	\$2,471.92
Contratista	GRUPO CONSTRUCTOR MED CER, S.A. DE C.V. (201)		Total Estimado	\$504,403.86
Contrato	FISMDF 026/2022 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE RAFAEL RAMÍREZ ENTRE LA CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA Y CALLE PLAN DE SAN LUIS		Saldo por Estimar	\$0.00
Estimacion No.	3 (De Cierre) Del 01 Sep 2022 al 29 Sep 2022			
Recibí de	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	la Cantidad de:	\$2,471.93 DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO PESOS 93/100 M.N.	

No.	Concepto	Unid. Med	Volumen					Precio Contratado	Importe
			Contratado	Acumulado	Anterior	Actual	Excedente		

GRUPO: **CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE RAFAEL RAMÍREZ ENTRE LA CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA Y CALLE PLAN DE SAN LUIS EJIDO OJO DE AGUA DEL MEZQU**

PARTIDA: **GUARNICIONES Y BANQUETAS**

7	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO, T.M.A. 3/4", GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 10+-2 CM ACABADO RAYADO FINO CON BROCHA DE PELO, JUNTAS FRIAS CON DOBLADOR DE 2". SECCION DE LOSAS DE ACUERDO ALA EXISTENTE, INCLUYE: COLADO , CURADO CON MEMBRANA BASE DE AGUA Y TRABAJO TERMINADO SEGUN FICHA TECNICA FT-200.	M2	470.84	606.08	571.53	34.55	135.24	\$379.41	\$13,106.91
8	LIMPIEZA FINAL , INCLUYE: BARRIDO CON AGUA , MATERIALES, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO.	M2	470.84	668.56	568.06	100.50	197.72	\$14.10	\$1,417.05

Total Partida	\$14,523.96
Total Grupo	\$14,523.96
Total Presupuestado	\$14,523.96
Ajuste de Costos	\$0.00
Total	\$14,523.96

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 2022

GRUPO CONSTRUCTOR MED CER, S.A. DE C.V. (GCM120227RL6)

CONTRATISTA

T.C. FERNANDO LUNA MEDINA (LUMF740415)

SUPERVISOR



Ayuntamiento de
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
2021 • 2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
RESUMEN DE ESTIMACIÓN

FECHA: 15 de septiembre de 2022

NOMBRE DE LA OBRA : CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE RAÍ LOCALIDAD: EJIDO OJO DE AGUA DEL MEZQUITE
 No. DE CONTRATO Y OBRA : FISMDF 006-008-009-026/2022 FISMDF 026/2022
 IMPORTE DE CONTRATO : \$432,699.95 (CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 95/100 M.N.)
 FECHA DE INICIO REAL : 1 de agosto de 2022
 FECHA DE INICIO VIGENTE (REPROGRAMACION SEGÚN ANTICIPO) : 26 DE JULIO DE 2022
 PLAZO DEL CONTRATO : 60 (SESENTA) DIAS CALENDARIO
 FECHA DE TERMINO VIGENTE : 24 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FECHA DE TERMINO REAL : 29 de septiembre de 2022

No. DE ESTIMACION : 3 (TRES FINIQUITO)
 PERIODO DEL : 1 SEP .22 AL 29 sep.22
 AVANCE FISICO 100%
 AVANCE FINANCIERO 3%

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN			PU.	IMPORTE
			CONTRATADO	EXCEDENTE	EJECUTADO		
GUARNICIONES Y BANQUETAS							
1	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. INCLUYE: EQUIPO NECESARIO, PUENTE, SEÑALIZACION DEL BANCO	M2	470.84	-470.84	0.0000	\$6.87	\$ -
2	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II 0.00 A 2.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUDES, TRASPALOS, ACARREOS A MAQUINA O A MANO HASTA	M3	141.25	-141.25	0.0000	\$463.09	\$ -
3	CARGA MECÁNICA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE ESCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO AL 1er. KM, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3	141.25	-141.25	0.0000	\$38.51	\$ -
4	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES AL TIRADERO OFICIAL AUTORIZADO MÁS	M3/KM	565.01	-565.01	0.0000	\$14.77	\$ -
5	RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM CON BAILARINA EN CAPAS DE HASTA 20 cm. DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINSTRO DE TEPETATE, AGUA LE	M3	141.25	-141.25	0.0000	\$380.81	\$ -
6	GUARNICIÓN DE 15X20X40 CM DE CONCRETO PREMEZCLADO F' C=150 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA Y DESCRIBADO, TRABAJO	M	369.85	-369.85	0.0000	\$300.66	\$ -
7	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO, T.M.A. 3/4", GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 10+2 CM ACABADO	M2	470.84	-436.29	34.5455	\$379.41	\$ 13,106.91
8	LIMPIEZA FINAL, INCLUYE: BARRIDO CON AGUA, MATERIALES, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO.	M2	470.84	-365.61	105.2315	\$14.10	\$ 1,483.76
SUB-TOTAL: \$							14,590.67
ANTICIPO 50%: \$							216,349.97
TOTAL: -\$							201,759.30

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
2022

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

CARLOS MEDRANO CERVANTES
GRUPO CONSTRUCTOR MED CER S.A. DE C.V.
NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA

T.C. FERNANDO LUNA MEDINA
Residente de Obra

Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo

ARG. ALFREDO FLORES MARMOLEJO
Jefe Departamento de Supervisión

**PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA
PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.**




NO. DE OBRA:	FISMDF 026/2022
NO. DE CONTRATO:	FISMDF 006-008-009-026/2022
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE RAFAEL RAMÍREZ ENT
UBICACIÓN:	EJIDO OJO DE AGUA DEL MEZQUITE

NUMEROS GENERADORES

E S T I M A C I O N No. 1

CROQUIS

DESCRIPCION DE CONCEPTO
 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO, T.M.A. 3/4", GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 10+-2 CM ACABADO RAYADO FINO CON BROCHA DE PELO, JUNTAS FRIAS CON DOBLADOR DE 2", SECCION DE LOSAS DE ACUERDO ALA EXISTENTE, INCLUYE: COLADO, CURADO CON MEMBRANA A BASE DE AGUA Y TRABAJO TERMINADO SEGUN FICHA TECNICA FT-200.

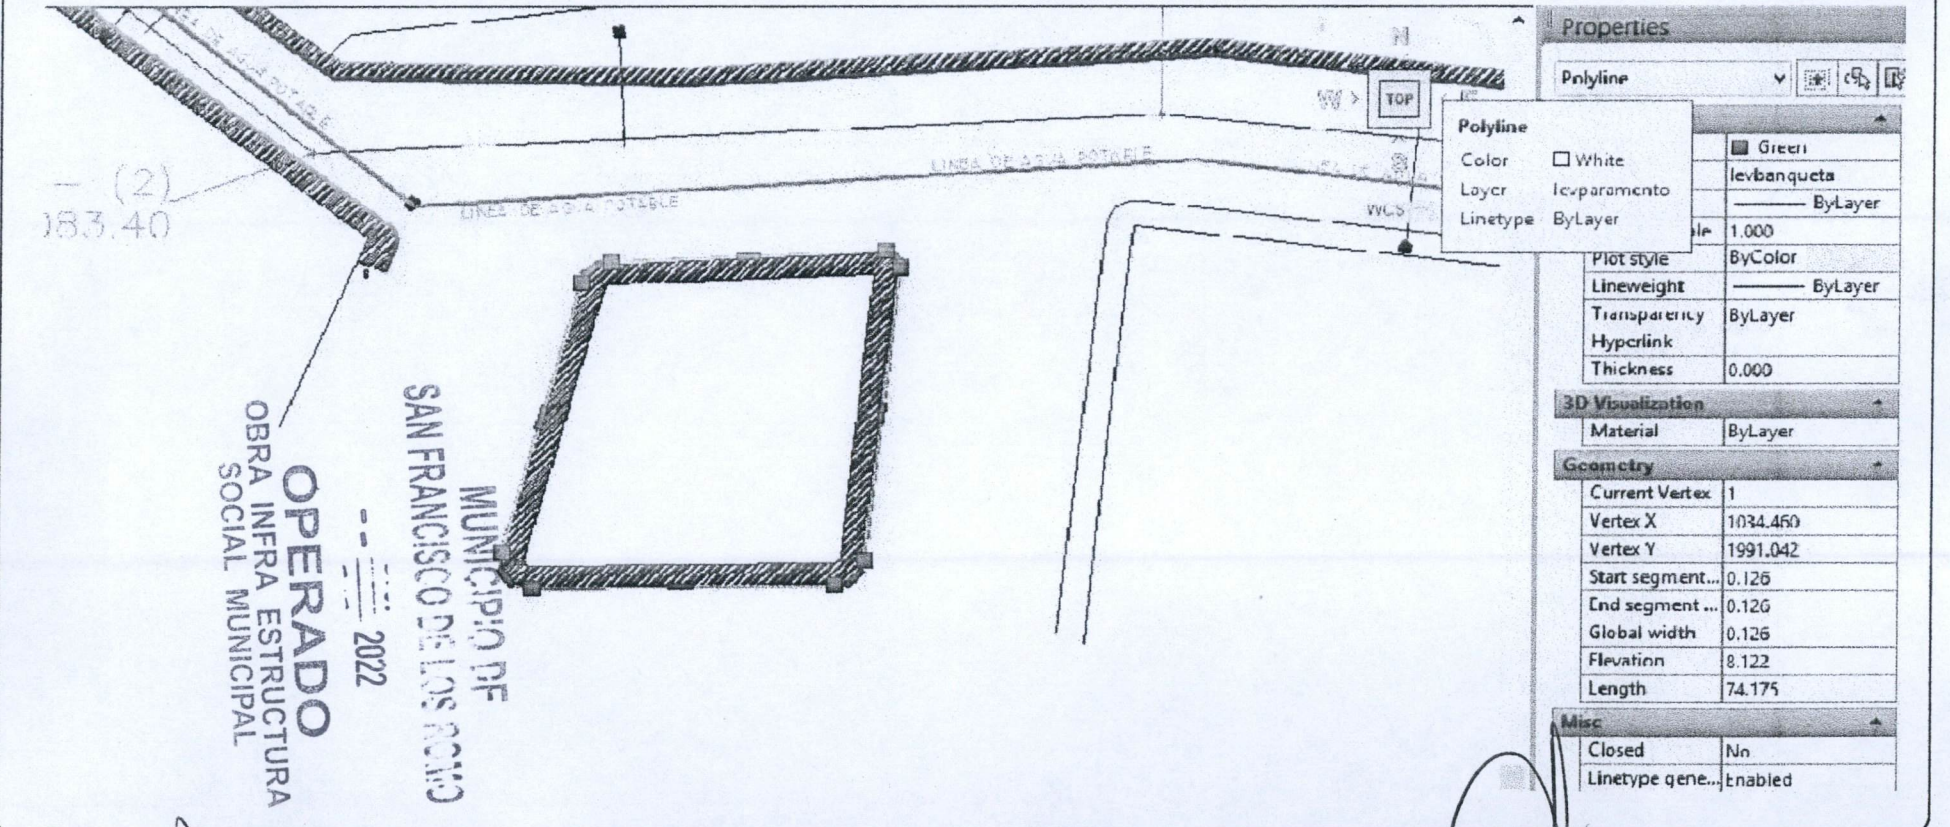

OBSERVACIONES:

SUPERINTENDENTE DE OBRA
 GRUPO CONSTRUCTOR MED CER S.A. DE C.V.
 NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA

RESIDENTE DE OBRA
 Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
 E.C. FERNANDO LUNA MEDINA

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA
PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

NO. DE OBRA: FISMDF 026/2022
NO. DE CONTRATO: FISMDF 006-008-009-026/2022
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE RAFAEL RAMÍREZ ENT
UBICACIÓN: EJIDO OJO DE AGUA DEL MEZQUITE





NUMEROS GENERADORES

ESTIMACION No. 1

FOTOGRAFIA

DESCRIPCION DE CONCEPTO

CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO, T.M.A. 3/4", GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 10+-2 CM ACABADO RAYADO FINO CON BROCHA DE PELO, JUNTAS FRIAS CON DOBLADOR DE 2", SECCION DE LOSAS DE ACUERDO ALA EXISTENTE, INCLUYE: COLADO, CURADO CON MEMBRANA A BASE DE AGUA Y TRABAJO TERMINADO SEGUN FICHA TECNICA FT-200.

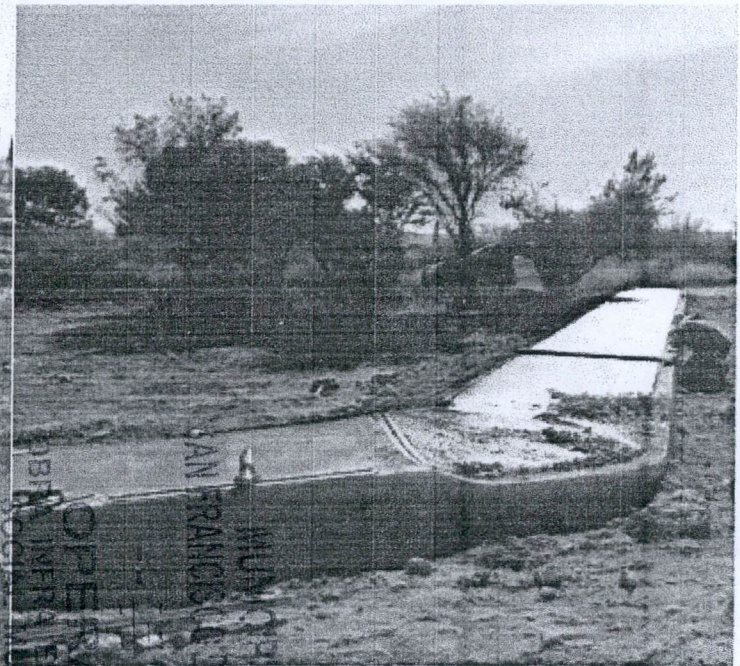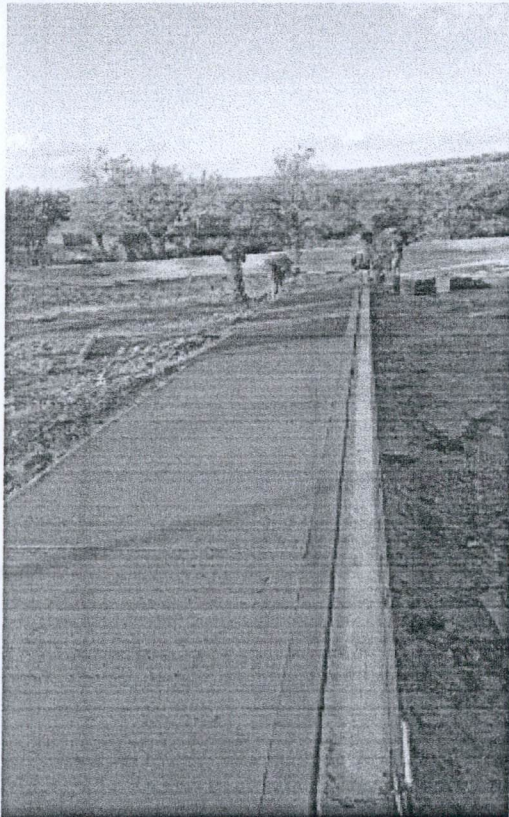

OBSERVACIONES:

~~SUPERINTENDENTE DE OBRA
GRUPO CONSTRUCTOR MED CER S.A. DE C.V.
NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA~~

RESIDENTE DE OBRA
Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
T.C. FERNANDO LUNA MEDINA

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.




NO. DE OBRA:	FISMDF 026/2022
NO. DE CONTRATO:	FISMDF 006-008-009-026/2022
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE RAFAEL RAMÍREZ ENT
UBICACIÓN:	EJIDO OJO DE AGUA DEL MEZQUITE

NUMEROS GENERADORES

ESTIMACION No. 1

CROQUIS

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO
 LIMPIEZA FINAL, INCLUYE: BARRIDO CON AGUA, MATERIALES, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO.

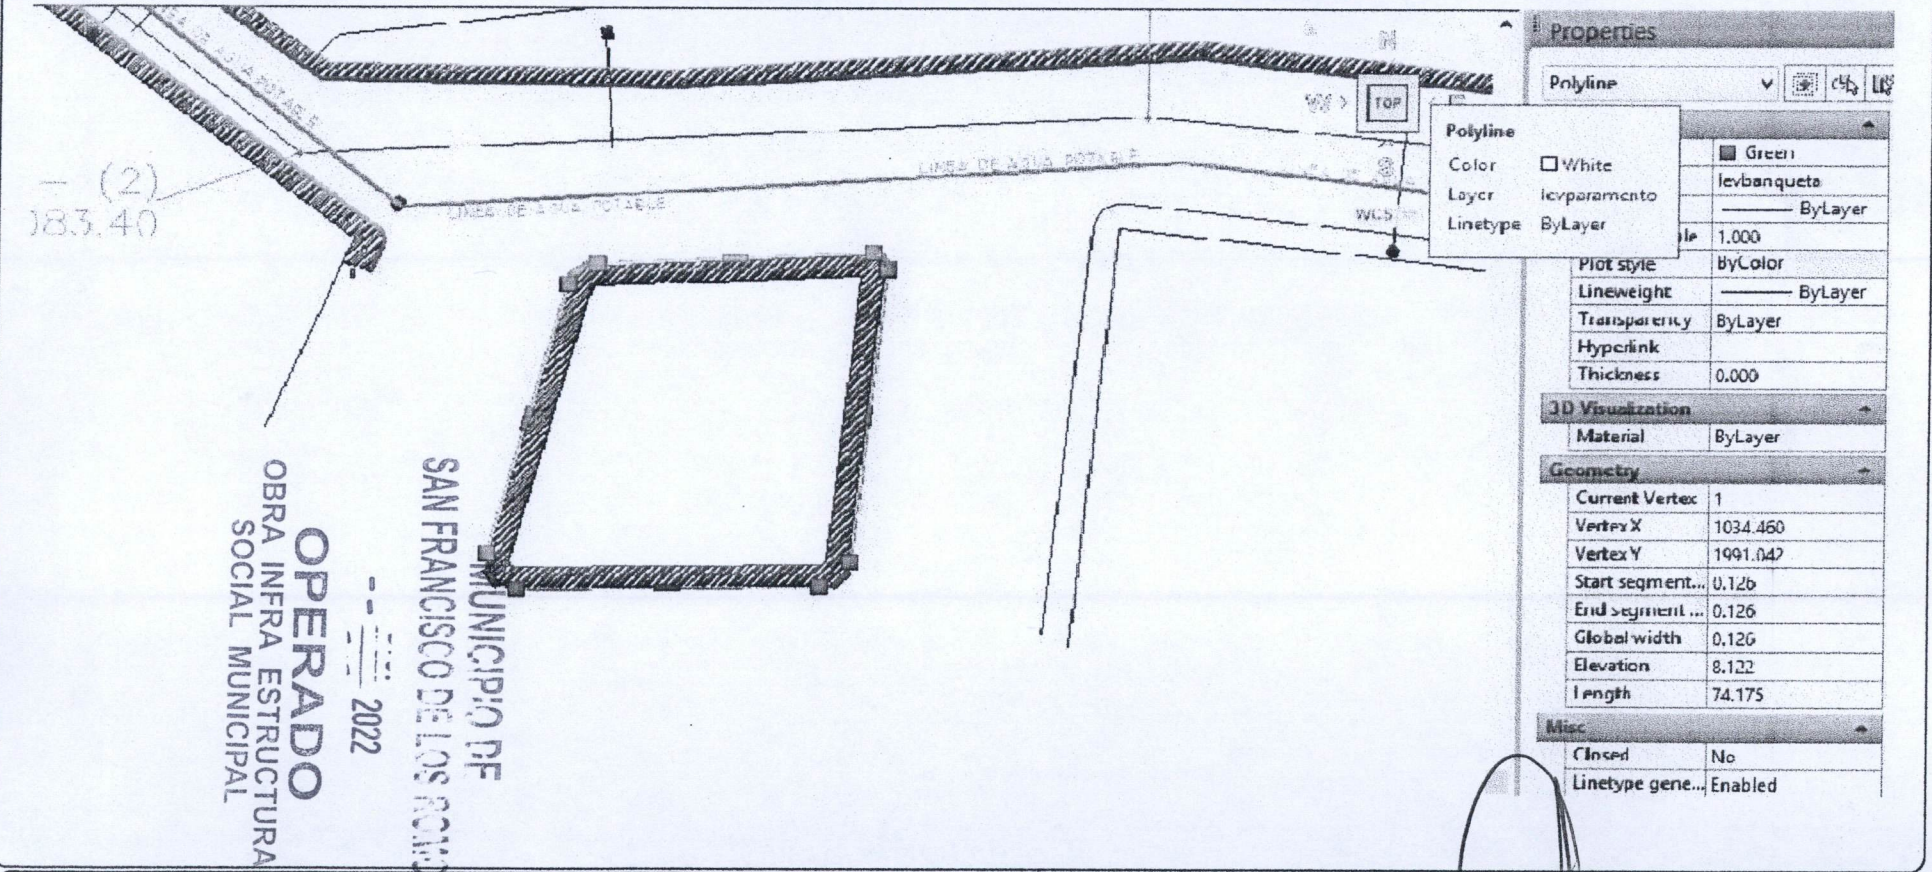

OPERADO
 OBRA INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 2022

OBSERVACIONES

SUPERINTENDENTE DE OBRA
 GRUPO CONSTRUCTOR MED CER S.A. DE C.V.
 NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA

RESIDENTE DE OBRA
 Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
 T.C. FERNANDO LUNA MEDINA

**PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA
PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.**

NUMEROS GENERADORES



GOBIERNO DEL ESTADO DE
SAN FRANCISCO DE LOS RIOS
2021 - 2024

NO. DE OBRA: FISMDF 026/2022
NO. DE CONTRATO: FISMDF 006-008-009-026/2022
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE RAFAEL RAMIREZ ENT
UBICACIÓN: EJIDO OJO DE AGUA DEL MEZQUITE

E S T I M A C I O N N o. 1

FOTOGRAFIA

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO
LIMPIEZA FINAL , INCLUYE: BARRIDO CON AGUA , MATERIALES, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO.



OBSERVACIONES:

SUPERINTENDENTE DE OBRA
GRUPO CONSTRUCTOR MED CER S.A. DE C.V.
NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA

RESIDENTE DE OBRA
Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Rios
I.C. FERNANDO LUNA MEDINA



CONTRATO FISMDF 026/2022

OBRA FISMDF 026/2022
15/ Dic / 2022

Con fecha de hoy esta supervisión autoriza la estimación número 3 (Tres Finiquito) de la obra número FISMDF 026/2022 de la empresa denominada Grupo Constructor Mex Cen, S.A. de C.V. dicha estimación del contrato de esta obra, bajo las siguientes características:

- Periodo del 1 al 29 de Septiembre 2022
- Entrega de generadores 24 de Octubre 2022
- Monto base \$ 14,523.96
- Amortización de Anticipo \$ 12,392.99
- Total de retenciones \$ 148.24
- Total a pagar \$ 2,326.69

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
2022
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

Dirección de
OBRAS PÚBLICAS

Ayuntamiento de
**SAN FRANCISCO
DE LOS ROMO**
2021 ♦ 2024



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
No. Oficio: DOP/579/22
San Francisco de los Romo, Ags., 16 de diciembre de 2022
Asunto: LIBERACIÓN DE PAGO

2297

C.P.MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
PRESENTE

Por medio del presente le remito la documentación de la estimación No. 3 (de Finiquito), para que se realicen los trámites necesarios para su pago.

No. de Obra: FIS MDF 026/2022

Nombre de la Obra: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE RAFAEL RAMÍREZ ENTRE LA CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA Y CALLE PLAN DE SAN LUIS

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal

Contratista: GRUPO CONSTRUCTOR MED CER, S.A. DE C.V. (GCM120227RL6)

Contrato: FIS MDF 026/2022 No Factura: 982

Objeto del Contrato: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE RAFAEL RAMÍREZ ENTRE LA CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA Y CALLE PLAN DE SAN LUIS, EJIDO OJO DE AGUA DEL MEZQUITE EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCAL

Monto del Contrato: \$504,403.87 (QUINIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 87/100 M.N.)

Monto a Pagar: \$2,326.69 (DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 69/100 M.N.)

Así mismo le solicito que una vez termiando dicho trámite se nos haga llegar el auxiliar contable .

Sin otro particular de momento, me es grato enviarle un cordial saludo agradeciendo de antemano las atenciones al presente.

ATENTAMENTE

ING. JOSE DE JESUS CHAVEZ GARCIA
DIRECTOR DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
2022
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

C.c.p. Archivo

Av. Benito Juárez S/N, Rancho La Trinidad,
San Francisco de los Romo, Ags. Tel: (465) 967 0124 ext. 1654
