



Usr: susana
Rep: rptPoliza

Municipio de San Francisco de los Romo
ESTADO DE AGUASCALIENTES

Póliza: C05340 Del 02/12/2022



Fecha y hora de Impresión | 13/dic./2022
09:57 a. m.
Página | 1

Concepto: FISM 2022 PAGADO EST 3 FINIQUITO OBRA FISDMF 007-2022 REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA. GP Folio: 361

Beneficiario: **PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTES SA DE CV**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-2501-K028-J04-61402-2	CONSTRUCCIÓN Y/O	\$5,595.65		GP Folio: 361
0002	8260-2501-K028-J04-61402-2	CONSTRUCCIÓN Y/O		\$5,595.65	GP Folio: 361
0003	2113-000387	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	\$5,595.65		GP Folio: 361
0004	1112-003-002	Bancomer Cta. 011793039-9 FISM		\$5,547.41	GP Folio: 361
0005	2117-9-005-001	0.1% COLEGIO DE		\$4.82	FISM 2022 PAGADO EST 3 FINIQUITO OBRA FISDMF 007-2022
0006	2117-9-005-002	0.2% ORGANO SUPERIOR DE		\$9.65	FISM 2022 PAGADO EST 3 FINIQUITO OBRA FISDMF 007-2022
0007	2117-9-005-003	0.2% INST. DE CAPACIT. DE LA		\$9.65	FISM 2022 PAGADO EST 3 FINIQUITO OBRA FISDMF 007-2022
0008	2117-9-005-004	0.5% CONTRALORIA MUNICIPAL		\$24.12	FISM 2022 PAGADO EST 3 FINIQUITO OBRA FISDMF 007-2022
Sumas iguales =>			<u>11,191.30</u>	<u>11,191.30</u>	

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

2022

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTES SA DE CV

PCJ150422SA7
 TLATELOLCO 101
 LOMAS DE JESUS MARIA
 JESUS MARIA, JESUS MARIA.
 AGUASCALIENTES, México C.P. 20925
 (626) Régimen Simplificado de Confianza
 Teléfonos: 449 9189061
 Tipo Comprobante: (P) Pago

Documento Pago DP 96
Folio fiscal
 90c36e0b-e2cf-4041-925d-03cf8b247ead
RFC Certificador
 LSO1306189R5
No. certificado del SAT
 00001000000509846663
Fecha y hora certificación
 2022-12-20 09:44:21
Lugar Expedición: Aguascalientes, 20925

RFC	MSF920130TQ9	Fecha expedición	20/12/2022 09:44:20
Nombre	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	Uso CFDI	(P01) Por definir
Calle	FRANCISCO ROMO JIMENEZ 102		
Colonia	FRACC. SAN JOSE DE BUENAVISTA C.P. 20300		
Ciudad, Estado	SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.. México		

Clave	ProdServ	Cantidad	Cve. Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
	84111506	1	(ACT) Actividad	Pago	0	0

Subtotal	0.00
Total	0.00

CERO XXX 00/100

Ordenante	BBA830831LJ2	0117930399	Beneficiario	BBA830831LJ2	012010001110764938
Forma Pago	(03) Transferencia electrónica de fondos		Número Operación	ASD 6550927880	
Fecha Pago	2022-12-02T12:00:00				

Documentos Pagados

UUID	Documento	Metodo Pago	Importe	Moneda
270ad4c6-9fee-4602-be72-d2e75b225b95	303	PPD	5,547.41	MXN
<i>Parcialidad : 1</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Insoluto</i>	<i>0.00</i>	
CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 41/100 M.N.			Total	5,547.41 MXN

Número Certificado 00001000000414634971

Sello digital del CFDI

BV6f3vovBhkWmsf30BNqX8cORxQowfcXMYEej+qKp/PUCyq/MVShbe7ISgYQqbXetjMeZr+aC91tmB5TvhPTJLz/+WCq4EjsR/zkdvwKZDUt6+hF6FeH0UMEVKSLOeIYqQhyYMrRFZHcb06An1EKuUtrYx20FNwDFCoYnvEv7ZQYiNIwzBzFchFPPE9LvDeHsc7/6jXYwppB4D1E5TWy++WSdzgbiaF+MblGLCgLfAkJowhsvvtK70PwTJBwZn1eq2zf9+mPtZ28nw6By1XccrgWiDHmGD+59Pchia2ruPWZL4HOIBRPz40a+3DjLUBz9RbVO/V8KYDpgrzp/MkRw==

Sello del SAT

X/EhPRfCyQ/26vjwhkhGUBud5Bj+a5KhBJD2u/+w3voJJBzRj/mTjnFs8idX4i4oz0+dpMYbuecrPmwvRaYzI5UobDF4LMRG/MCMHhSRDGRKKFwQEegwnKkLBBXCbhdwIRwFDjAwyLcWMSQDnB4QkEu/TIOk56t1xCYX9s6UqxNd4+L8d0UHx+1X0vPTykZ4E1Baf691EIrGWGL+KYrjFozeW/XdXqsEsqFbNmQOVuUOVk0/pyvCJvzrce9zr9pHNiualqkOBA07cekt7ZpoPIrHNw+zrJzPrRSAuumlrcH3RQ1wREGGE2Ge02601d2mTaTqfu4I+bsC5gkLMYA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|90c36e0b-e2cf-4041-925d-03cf8b247ead|2022-12-20T09:44:21|LSO1306189R5|BV6f3vovBhkWmsf30BNqX8cORxQowfcXMYEej+qKp/PUCyq/MVShbe7ISgYQqbXetjMeZr+aC91tmB5TvhPTJLz/+WCq4EjsR/zkdvwKZDUt6+hF6FeH0UMEVKSLOeIYqQhyYMrRFZHcb06An1EKuUtrYx20FNwDFCoYnvEv7ZQYiNIwzBzFchFPPE9LvDeHsc7/6jXYwppB4D1E5TWy++WSdzgbiaF+MblGLCgLfAkJowhsvvtK70PwTJBwZn1eq2zf9+mPtZ28nw6By1XccrgWiDHmGD+59Pchia2ruPWZL4HOIBRPz40a+3DjLUBz9RbVO/V8KYDpgrzp/MkRw==|00001000000509846663||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3



MUNICIPIO DE
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

2022

OPERADO
 OBRA INFRA ESTRUCTURA
 SOCIAL MUNICIPAL

MUNICIPIO DE
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.
PAGADO
FINANZAS



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PCJ150422SA7	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTES SA DE CV	MSF920130TQ9	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
90C36E0B-E2CF-4041-925D-03CF8B247EAD	2022-12-20T09:44:20	2022-12-20T09:44:21	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$0.00	Pago	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir


MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
-- 2022
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/Pagos
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pagos/Pagos10.xsd" xmlns:pago10="http://www.sat.gob.mx/Pagos" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
Certificado="MIIGnTCCBIWgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MTQ2MzQ5NzEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbiB
Sello="BV6f3vovBHKWmsf30BNqX8cORxQowfcXMYEej+qKp/PUcyq/MVShbe7ISgYQqbXetjMeZr+aC9ltmB5TvhPTJLz/+WCq4EjsR/zkdvwKZDUt6+hf6FeH0"
NoCertificado="00001000000414634971" LugarExpedicion="20925" TipoDeComprobante="P" Total="0" Moneda="XXX" SubTotal="0" Fecha="2022-12-20T09:44:20"
Folio="96" Serie="DP" Version="3.3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="626" Nombre="PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTES SA DE CV"
    Rfc="PCJ150422SA7"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO" Rfc="MSF920130TQ9" UsoCFDI="P01"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="0" ValorUnitario="0" Descripcion="Pago" ClaveUnidad="ACT" Cantidad="1" ClaveProdServ="84111506"></cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Complemento>
    - <pago10:Pagos Version="1.0">
      - <pago10:Pago CtaBeneficiario="012010001110764938" RfcEmisorCtaBen="BBA830831LJ2" CtaOrdenante="0117930399"
        RfcEmisorCtaOrd="BBA830831LJ2" NumOperacion="ASD 6550927880" Monto="5547.41" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="03" FechaPago="2022-
        12-02T12:00:00">
        <pago10:DoctoRelacionado Folio="303" ImpSaldoInsoluto="0.00" ImpPagado="5547.41" ImpSaldoAnt="5547.41" NumParcialidad="1"
          MetodoDePagoDR="PPD" MonedaDR="MXN" IdDocumento="270ad4c6-9fee-4602-be72-d2e75b225b95"/>
        </pago10:Pago>
      </pago10:Pagos>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
      instance" Version="1.1" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
      SelloSAT="X/EhPRfCyQ/26vjwhkhGUBud5Bj+a5KhBJD2u/+w3voJjBZRJ/mTjnFs8idX4i4oz0+dpMYbuecrPmwvRaYZISUobDF4IMRG/MCMHhS
      NoCertificadoSAT="00001000000509846663"
      SelloCFD="BV6f3vovBHKWmsf30BNqX8cORxQowfcXMYEej+qKp/PUcyq/MVShbe7ISgYQqbXetjMeZr+aC9ltmB5TvhPTJLz/+WCq4EjsR/zkdvw"
      RfcProvCertif="LSO1306189R5" FechaTimbrado="2022-12-20T09:44:21" UUID="90c36e0b-e2cf-4041-925d-03cf8b247ead"/>
    </cfdi:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>

```

MUNICIPIO DE
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 -- 2022
 OPERADO
 OBRA INFRA ESTRUCTURA
 SOCIAL MUNICIPAL



Fecha y hora de consulta

02/12/2022 4:10:50 PM

Contrato

00796395

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO
DE LOS ROMO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: EST 3 FINIQUITO

Importe de la operación: 5,547.41 MXP

Cuenta de retiro: 0117930399

Cuenta de depósito: 0111076493

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE SAN FRA
NCISCO DE LOS ROMOTitular de la cuenta: PROYECTOS Y CONSTRUC
CIONES JE DE LA PEÑA EN
AGUASCA SA DE CV

Fecha de creación: 02/12/2022

Fecha de aplicación: 02/12/2022

Hora: 16:10:42

Instrumento de seguridad: ASD 6550927880

Motivo de pago: PAGO EST 3 FINIQ FISMDF 11
-007

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0014687097

Folio único: I323202212021610420014687104

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

2022

OPERADO

OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL


Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	02/12/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	02/12/2022

Dirección de
OBRAS PÚBLICAS



Ayuntamiento de
**SAN FRANCISCO
DE LOS ROMO**
2021 ♦ 2024



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN
FRANCISCO DE LOS ROMO
No. Oficio: DOP/526/22
San Francisco de los Romo, Ags., 2 de diciembre de 2022
Asunto: LIBERACIÓN DE PAGO

2147

C.P. MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
PRESENTE

Por medio del presente le remito la documentación de la estimación No. 3 (de Finiquito), para que se realicen los trámites necesarios para su pago.

No. de Obra: FIS MDF 007/2022

Nombre de la Obra: REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 12 DE DICIEMBRE ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal

Contratista: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. (PCJ150422SA7)

Contrato: FIS MDF 007-020-024/2022 7 No Factura: 303

Objeto del Contrato: REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 12 DE DICIEMBRE ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, COLONIA 28 DE ABRIL EN CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS EN EL ESTADO

Monto del Contrato: \$273,281.89 (DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 89/100 M.N.)

Monto a Pagar: \$5,547.41 (CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 41/100 M.N.)

Así mismo le solicito que una vez termiando dicho trámite se nos haga llegar el auxiliar contable .

Sin otro particular de momento, me es grato enviarle un cordial saludo agradeciendo de antemano las atenciones al presente.

ATENTAMENTE

ING. JOSE DE JESUS CHAVEZ GARCIA
DIRECTOR DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO


MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
2022
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

C.c.p. Archivo

Av. Benito Juárez S/N, Rancho La Trinidad,
San Francisco de los Romo, Ags. Tel: (465) 967 0124 ext. 1654

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

CÉDULA DE SEGUIMIENTO A ESTIMACIONES DE OBRA



DATOS GENERALES											
CONTRATISTA: <i>Proyectos y Construcciones JE de la Peña en Aqs, S.A.</i>						N° DE CONTRATO: <i>FISMDF 007,020,024/2022</i>					
SUPERVISOR: <i>Fernando Luna Medina</i>						N° DE OBRA: <i>FISMDF 007</i>					
OBRA: <i>Rehab de red de alcantarillado en c. 12 de diciembre</i>						N° DE FACTURA:					
FECHA DE CORTE: DEL: <i>25</i> AL: <i>29 de Septiembre 2022</i>						N° DE ESTIMACION: <i>3 (TRES FINIQUITO)</i>					
						IMPORTE LIQUIDO:					
FORMATO DE NUMEROS GENERADORES											
INGRESO		REVISIÓN		NOTA				CAPTURA EN SISTEMA		ENTREGA DE PRE-FACTURA	
<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>		Sr. contratista regrese esta cédula con la estimación original de lo contrario no se le dara tramite				<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	
<i>25/10/2022</i>		<i>28/10/2022</i>						<i>28/10/2022</i>		<i>28/10/2022</i>	
CONTRATISTA		SUPERVISOR		SUPERVISOR		SUPERVISOR		SUPERVISOR		SUPERVISOR	
FORMATO DE ESTIMACION											
INGRESO		REGISTRO		SUPERVISOR				OPERADO		JEFE DE DEPARTAMENTO	
<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>				OPERADO		MUNICIPIO DE FRANCISCO DE LOS ROMO	
<i>02/12/2022</i>		<i>02/12/22</i>									
CONTRATISTA		CONTROL DE ESTIMACIONES		RECIBIDO		AUTORIZADO		RECIBIDO		AUTORIZADO	
DEVOLUCION				CONTENIDO							
FECHA DE DEVOLUCIÓN: <i>28/10/2022</i>				CÁRATULA							
FECHA DE REINGRESO: <i>02/12/2022</i>				RESUMEN							
MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN:				CONCEPTOS							
<ul style="list-style-type: none"> - Falta fotografias - Corregir croquis - Falta fianza de V.O. 				ESTADO DE CUENTA							
				CONCENTRADO DE CONCEPTOS (FIN)							
				GENERADORES Y RESUMEN							
				CROQUIS							
				FOTOGRAFIAS							
				ANALISIS PRECIO UNITARIO							
				REPORTE(S) DE LABORATORIO							
				FIANZA(S) (FIN)							
				NOTA DE BITACORA DE OBRA							
				DIRECTOR GENERAL							
				<i>[Signature]</i>							
				ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA							
				RECIBIDO							
				AUTORIZADO							
				FINANZAS							
				RECIBIDO							
				AUTORIZADO							
TRÁMITE DE PAGO											
FECHA DE INICIO DE TRÁMITE EN DOP-SFR			FIRMA DEL DIRECTOR			OFICIO DE LIBERACION			FECHA DE ENTREGA		
<i>25 10 22</i>			<i>[Signature]</i>			<i>02 12 22</i>					
DÍA:	MES:	AÑO:	DÍA:	MES:	AÑO:	DÍA:	MES:	AÑO:	DÍA:	MES:	AÑO:
DIRECCIÓN DE EGRESOS.											

PRE-FACTURA De Cierre



PRE-FACTURA DEL CONTRATISTA: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. (653)

A NOMBRE DE: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 RFC: MSF920130TQ9
 DIRECCION: FCO ROMO JIMENEZ 102, SAN JOSE DE BUENAVISTA, SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS,
 CIUDAD: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE L ESTADO: AGUASCALIENTES

DESCRIPCION

PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 Del 25 Sep 2022 al 29 Sep 2022		MONTO BASE	\$4,823.84
DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 12 DE DICIEMBRE ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE		AJUSTE DE COSTOS (+)	\$0.00
		AMORTIZACION DE ANTICIPO (-)	\$0.00
UBICADA EN: COLONIA 28 DE ABRIL EN CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS EN EL ESTADO		SUBTOTAL	\$4,823.84
CON AMPARO DEL CONTRATO No.: FIS MDF 007-020-024/2022 7		IVA (+)	\$771.81
DE FECHA: 18/07/2022		SUBTOTAL CON IVA	\$5,595.65
BAJO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA:			

Inversion Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal 2022

Programa SD ALCANTARILLADO

SubPrograma 01 REHABILITACION

Obra. FIS MDF 007/2022 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 12 DE DICIEMBRE ENTRE CALLE 15 DE SEP'

Localizacion COLONIA 28 DE ABRIL EN CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS EN EL ESTADO

CAPACITACION DE LOS TRABAJADORES DEL CONTRATISTA	\$9.65 (0.20%)		TOTAL DE RETENCIONES (-)	\$48.24
COLEGIOS DE PROFESIONISTAS SEGUN CORRESPONDA	\$4.82 (0.10%)		SANCION POR RETRASO (-)	\$0.00
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	\$0.00 (0.00%)		SUBTOTAL MENOS RETENCIONES	\$5,547.41
FISCALIZACION DEL H. CONGRESO DEL ESTADO	\$9.65 (0.20%)		RETENCION POR RETRASO(-)	\$0.00
INSPECCION DE VIGILANCIA PARA LA CONTRALORIA	\$24.12 (0.50%)		REINTEGRO POR RETENCION	\$0.00
SERVICIOS RELATIVOS A LAS CONSTRUCCIONES	\$0.00		OTRAS SANCIONES(-)	\$0.00
	\$48.24		TOTAL A PAGAR	\$5,547.41

Avance Fisico Real %
 Avance Fisico Programado %
 Fecha Terminación Prog.


CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 41/100 M.N.

OPERADO
MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL
 2022

ESTADO DE CUENTA

Obra.	FISMDF 007/2022 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 12 DE DICIEMBRE ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	Total Contrato	267,686.24
Localización	COLONIA 28 DE ABRIL EN CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS EN EL ESTADO	Total Ampliaciones	5,595.65
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura So	Total Contratado	273,281.89
Programa	SD ALCANTARILLADO	Anticipo ()%	133,843.12
SubPrograma	01 REHABILITACION	Estimado Anterior	267,686.24
Contratista	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 12 DE DICIEMBRE ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	Esta Estimacion	5,595.65
Contrato	FISMDF 007-020-024/2022 7	Total Estimado	273,281.89
Estimacion No.	3 Del 25 Sep 2022 al 29 Sep 2022	Total por Estimar	0.00

No. Estimac.	Periodo	Importe Estimacion	Amortizacion de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA (+)	Cargo a la Obra	DEDUCCIONES (-)					Retencion (-)	Reintegro (+)	Sanciones (-)	Importe a Pagar	
							CMIC(0)	Cojo.Prof.(0)	SEP(0.5)	Cong. Edo.(0.2)	Municipal					ISRuOtro(0)
Anticipo				115,382.00	18,461.12	133,843.12									133,843.12	
1	Del 01 Ago 2022 al 10 Sep	178,375.00	89,187.50	26,194.50	14,270.00	103,457.50	356.75	178.38	0.00	356.75	891.88	0.00	0.00	0.00	0.00	101,673.74
2	Del 11 Sep 2022 al 24 Sep 2022	52,389.00	26,194.50	0.00	4,191.12	30,385.62	104.78	52.39	0.00	104.78	261.94	0.00	0.00	0.00	0.00	29,861.73
3	Del 25 Sep 2022 al 29 Sep	4,823.84	0.00	0.00	771.81	5,595.65	9.65	4.82	0.00	9.65	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	5,547.41
TOTALES		235,587.84	115,382.00		37,694.05	273,281.89	471.18	235.59	0.00	471.18	1,177.94	0.00	0.00	0.00	0.00	270,926.00



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 2022

RESUMEN DE ESTIMACION

Obra.	FISDMF 007/2022 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 12 DE DICIEMBRE ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE		Total Contrato	\$267,686.24
Localización	COLONIA 28 DE ABRIL EN CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS EN EL ESTADO		Total Ampliaciones	\$5,595.65
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal.		Total Contratado	\$273,281.89
Programa	SD ALCANTARILLADO		Anticipo (50)%	\$133,843.12
SubPrograma	01 REHABILITACION		Estimado Anterior	\$267,686.24
Supervisor	FERNANDO LUNA MEDINA (LUMF740415)		Esta Estimacion	\$5,595.65
Contratista	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. (653)		Total Estimado	\$273,281.89
Contrato	FISDMF 007-020-024/2022 7 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 12 DE DICIEMBRE ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE		Saldo por Estimar	\$0.00
Estimacion No.	3 (De Cierre)			
Recibí de	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	la Cantidad de:	\$5,595.65 CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 65/100 M.N.	

<u>GRUPO</u>	<u>PARTIDA</u>		
* EXTRAORDINARIOS			\$4,823.84
- EXTRAORDINARIOS			\$4,823.84
Fecha Terminación Prog.		SUMA	\$4,823.84
		AJUSTE DE COSTOS (+)	\$0.00
		AMORTIZACION DE ANTICIPO (-)	\$0.00
		SUBTOTAL	\$4,823.84
		IVA (+)	\$771.81
		SUBTOTAL CON IVA	\$5,595.65

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 2022
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL


 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A.
 DE C.V. (PCJ150422SA7)
 Contratista


 T.C. FERNANDO LUNA MEDINA (LUMF740415)
 SUPERVISOR

CONCENTRADO DE ESTIMACIONES

Obra. REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 12 DE DICIEMBRE ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 16 DE COLONIA 28 DE ABRIL EN CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS EN EL ESTADO
 Localización COLONIA 28 DE ABRIL EN CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS EN EL ESTADO
 Supervisor T.C. FERNANDO LUNA MEDINA (LUMF740415)
 Contratista PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. (653)
 Contrato FISMDF 007-020-024/2022 7

Total Contrato \$267,686.24
 Total Ampliaciones \$5,595.65
 Total Contratado \$273,281.89
 Anticipo (50)% \$133,843.12
 Total Estimado \$273,281.89

No.	Concepto	Unid. Med.	Volumen Contratado	Importe Contratado	Volumen Estimac. 1	Volumen Estimac. 2	Volumen Estimac. 3	Volumen Estimac. 4	Volumen Estimac. 5	Volumen Estimac. 6	Volumen Exedente	Volumen Total	Importe Total
REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 12 DE DICIEMBRE ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y RED DE ALCANTARILLADO													
1	SONDEO PARA LOCALIZACIÓN DE REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, TELEFÓNICAS Y/O ELÉCTRICAS EXISTENTES. I	SON DE	2.00	\$581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	\$0.00
2	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO. INCLUYE: EQUIPO TOPGRÁFICO NECESARIO	m	96.30	\$10.79	105.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.20	105.50	\$1,138.35
3	CORTE CON DISCO DIAMANTADO DE 14" EN PAVIMENTO Y/O BANQUETA EXISTENTE (HASTA 8.00 cm. DE PROFUNDIDA	m	20.00	\$27.07	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	\$541.40
4	DEMOLICION A MAQUINA DE PAVIMENTO (CONCRETO, ASFALTO Y/O EMPEDRADO) EXISTENTE Y/O BANQUETA (DE HAST	M3	2.10	\$354.73	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	4.30	\$1,524.63
5	EXCAVACIÓN DE ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO II. INCLUYE: AFINE CON MAQUINA, MANO DE OB	M3	89.68	\$78.54	85.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.13	85.55	\$6,719.08
6	CARGA Y ACARREO EN CAMION AL TIRADERO OFICIAL DE MATERIAL MIXTO AL TIRADERO OFICIAL, ZONA URBANA, S	M3	91.78	\$38.26	89.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.93	89.85	\$3,437.57
7	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUE	M3/K M	367.12	\$14.74	359.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7.73	359.39	\$5,297.42
8	CAMA Y ACOSTILLADO CON GRAVA DE 3/4" CON UN ESPESOR DE 10 CM. INCLUYE: ACOMODADO Y COMPACTADO ASÍ C	M3	6.64	\$655.75	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.06	6.58	\$4,317.79
9	RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM CON BAILARINA EN CAPAS DE HASTA 20 cm. DE ESPESOR.	M3	79.96	\$364.63	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23.61	56.36	\$20,548.72
10	RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM CON BAILARINA EN CAPAS DE HASTA 20 cm. DE ESPESOR.	M3	13.28	\$370.61	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	16.58	\$6,143.69
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 8" (200 MM) DE DIÁMET	m	94.90	\$52,799.25	105.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.60	105.50	\$55,365.35
12	CONEXION DE TUBERIA DE PVC DE 8.00" A 12.00" A POZO DE VISITA EXISTENTE, CONEXIÓN Y NIVELACIÓN DE T	pleza	3.00	\$8,325.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	5.00	\$4,336.25
13	LIMPIEZA FINAL , INCLUYE: BARRIDO CON AGUA , MATERIALES, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBR	M2	67.41	\$10,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-67.41	0.00	\$0.00
DESCARGAS SANITARIAS													
14	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO. INCLUYE: EQUIPO TOPGRÁFICO NECESARIO	m	91.51	\$10.79	92.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38	92.89	\$1,002.28
15	CORTE CON DISCO DIAMANTADO DE 14" EN PAVIMENTO Y/O BANQUETA EXISTENTE (HASTA 8.00 cm. DE PROFUNDIDA	m	51.44	\$27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51.44	0.00	\$0.00
16	DEMOLICION A MAQUINA DE PAVIMENTO (CONCRETO, ASFALTO	M3	2.83	\$354.73	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	2.89	\$1,025.88

OPERADO
OBRA SOCIAL MUNICIPAL
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
2022

Y/O EMPEDRADO) EXISTENTE Y/O BANQUETA (DE HAST

17	EXCAVACIÓN DE ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO II. INCLUYE: AFINE CON MAQUINA, MANO DE OB	M3	61.30	\$78.54	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29.15	32.15	\$2,525.13
18	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II 0.00 A 2.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD	M3	15.33	\$452.94	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.36	9.97	\$4,517.61
19	CARGA Y ACARREO EN CAMION AL TIRADERO OFICIAL DE MATERIAL MIXTO AL TIRADERO OFICIAL, ZONA URBANA, S	M3	79.46	\$38.26	45.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34.44	45.02	\$1,722.34
20	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUE	M3/K M	317.84	\$14.74	180.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-137.77	180.07	\$2,654.19
21	RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO AL 90% DE SU PVM CON BAILARINA EN CAPAS DE HASTA 20 cm. DE ESPESOR.	M3	54.58	\$364.63	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28.96	25.62	\$9,342.30
22	RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% DE SU PVM CON BAILARINA EN CAPAS DE HASTA 20 cm. DE ESPESOR.	M3	8.58	\$370.66	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36	9.94	\$3,682.88
23	DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERÍA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 6" (150 MM) DE DIÁMETRO	pieza	9.00	\$1,378.34	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10.00	\$13,783.40
24	DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERÍA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 6" (150 MM) DE DIÁMETRO	m	59.04	\$346.83	82.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.85	82.89	\$28,748.74
25	REGISTRO SANITARIO DE 0.40X0.60X0.80 M (MEDIDAS INTERIORES) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO (14 CM DE ESPE	pieza	9.00	\$3,272.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9.00	0.00	\$0.00
26	LIMPIEZA FINAL , INCLUYE: BARRIDO CON AGUA , MATERIALES, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBR	M2	64.06	\$14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-64.06	0.00	\$0.00

BANQUETAS

27	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, T.M.A	M2	22.62	\$456.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22.62	0.00	\$0.00
----	---	----	-------	----------	------	------	------	------	------	------	--------	------	--------

INDIRECTOS NO EJECUTADOS

INDIRECTOS NO EJECUTADOS

28	Indirecto por administración de obra por el convenio de ampliación en monto por la cantidad de \$5,5	IN	0.00	\$391.60	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	-1.00	-\$391.60
----	--	----	------	----------	------	-------	------	------	------	------	-------	-------	-----------

EXTRAORDINARIOS

EXTRAORDINARIOS

29	REGISTRO SANITARIO DE 0.40X0.60X0.50 A 0.70 M (MEDIDAS INTERIORES) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO (14 CM	PZA	0.00	\$2,904.18	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	\$11,616.72
30	REGISTRO SANITARIO DE 0.40X0.60X0.70 A 0.90 M (MEDIDAS INTERIORES) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO (14 CM	PZA	0.00	\$3,272.44	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	\$16,362.20
31	REGISTRO SANITARIO DE 0.40X0.60X0.90 A 1.10 M (MEDIDAS INTERIORES) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO (14 CM	PZA	0.00	\$3,640.74	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	\$3,640.74
32	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2, T.M.A.	M2	0.00	\$382.73	0.00	55.29	12.60	0.00	0.00	0.00	67.89	67.89	\$25,984.78

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL
 2022
MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO



FECHA 12 de septiembre de 2022

NOMBRE DE LA OBRA : REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE 12 DE I LOCALIDAD: COL 28 DE ABRIL, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 No. DE CONTRATO Y OBRA : FISMDF 007-020-024/2022 FISMDF 007/22
 IMPORTE DE CONTRATO : \$267,686.24 (DOS CIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEIS CIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 24/100 M.N.)
 FECHA DE INICIO REAL : 1 de agosto de 2022
 FECHA DE INICIO VIGENTE (REPROGRAMACION SEGÚN ANTICIPO) : 27 de julio de 2022
 PLAZO DEL CONTRATO : 60 (SESENTA) DIAS CALENDARIO
 FECHA DE TERMINO VIGENTE : 25 de septiembre de 2022 FECHA DE TERMINO REAL : 29 de septiembre de 2022

No. DE ESTIMACION : 3 (TRES Y FINIQUITO)
 PERIODO DEL : 25.sep.22 AL 29.sep.22
 AVANCE FISICO 100%
 AVANCE FINANCIERO 100%

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN			PU.	IMPORTE
			CONTRATADO	EXCEDENTE	EJECUTADO		
EXTRAORDINARIOS							
32.-	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 10+-2 CM ACABADO RAYADO FINO CON BROCHA DE PELO, JUNTAS FRIAS CON DOBLADOR DE 2", SECCION DE LOSAS DE ACUERDO ALA EXISTENTE, INCLUYE: COLADO , CURADO CON MEMBRANA A BASE DE AGUA Y TRABAJO TERMINADO SEGUN FICHA TECNICA FT-200.	M2	22.62	10.02	12.60	\$ 382.73	\$ 4,823.84

SUB-TOTAL \$ 4,823.84
 ANTICIPO 50% \$ 2,411.92
 TOTAL \$ 2,411.92
4,823.84

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUAS CALIENTES, S.A. DE C.V.
 NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA

T.C. FERNANDO LUNA MEDINA
 Residente de Obra

Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo

ARQ. ALFREDO FLORES MARMOLEJO
 Jefe Departamento de Supervisión

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 -- 2022
OPERADO
 OBRA INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.



NUMEROS GENERADORES

NO. DE OBRA: FSMDF 007/22
 NO. DE CONTRATO: FSMDF 009-020-024/2022
 DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE 12 DE DICIEMBRE E
 UBICACIÓN: COL. 28 DE ABRIL, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.

E S T I M A C I O N N o. 1

No.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	TOTAL	CROQUIS	FOTOGRAFIA	
			EJE	TRAMO	TIPO									
31.-	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO EN OBRA F'c=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 10+-2 CM ACABADO RAYADO FINO CON BROCHA DE PELO, JUNTAS FRIAS CON DOBLADOR DE 2", SECCION DE LOSAS DE ACUERDO ALA EXISTENTE, INCLUYE: COLADO, CURADO CON MEMBRANA A BASE DE AGUA Y TRABAJO TERMINADO SEGUN FICHA TECNICA FT-200.	M2				8.56	1.50			12.84		ANEXO		
						-0.60	0.40			-0.24				
											TOTAL	12.60		

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 2022

OBSERVACIONES :

SUPERINTENDENTE DE OBRA
 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN A
 NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA

RESIDENTE DE OBRA
 Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
 T.C. FERNANDO LUNA MEDINA



NUMEROS GENERADORES

NO. DE OBRA:	FISDMDF 007/22
NO. DE CONTRATO:	FISDMDF 009-020-024/2022
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE 12 DE DICIEMBRE E
UBICACIÓN:	COL. 28 DE ABRIL, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.

ESTIMACION No. 1


CROQUIS

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO

CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 10+-2 CM ACABADO RAYADO FINO CON BROCHA DE PELO, JUNTAS FRIAS CON DOBLADOR DE 2", SECCION DE LOSAS DE ACUERDO ALA EXISTENTE, INCLUYE: COLADO, CURADO CON MEMBRANA A BASE DE AGUA Y TRABAJO TERMINADO

C. 16 DE SEPTIEMBRE

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL
2022

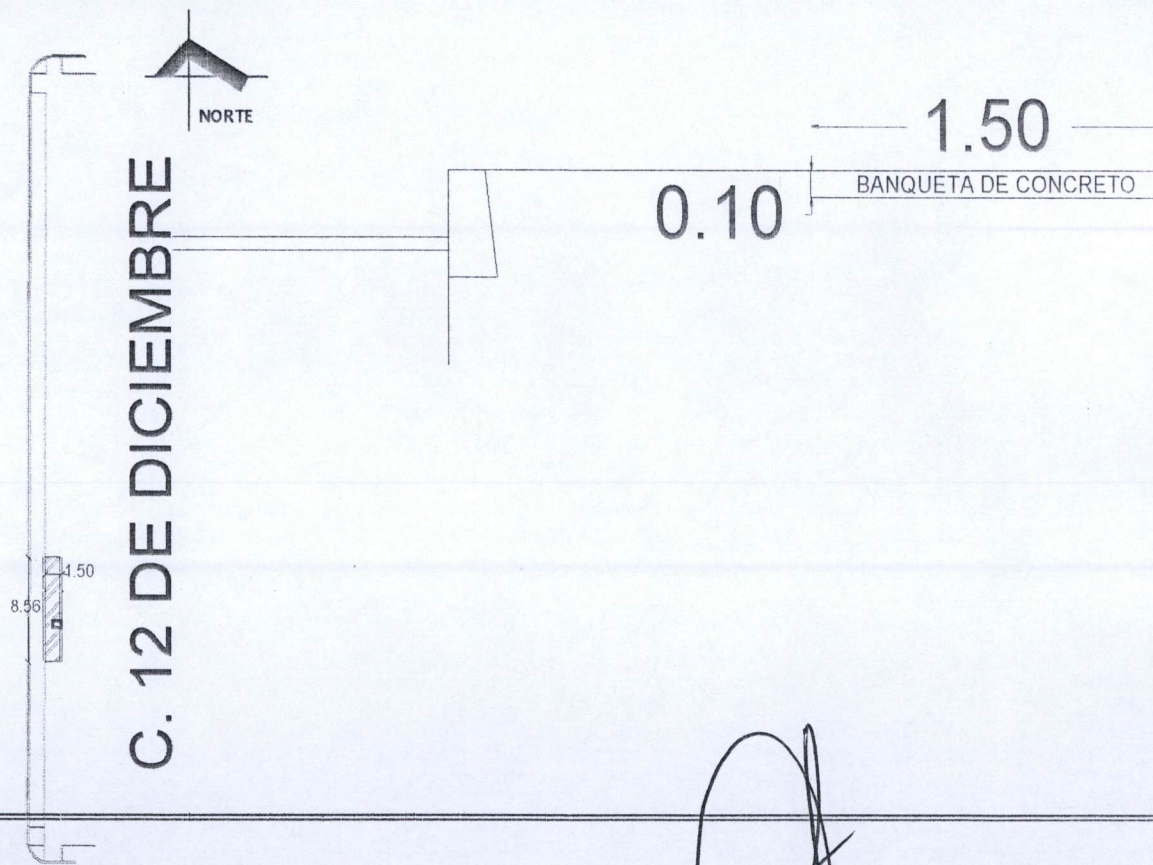

OBSERVACIONES:

C. 15 DE SEPTIEMBRE

SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTES
NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA

RESIDENTE DE OBRA
Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
T.C. FERNANDO LUNA MEDINA



NUMEROS GENERADORES

NO. DE OBRA:	FISMDF 007/22
NO. DE CONTRATO:	FISMDF 009-020-024/2022
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE 12 DE DICIEMBRE E
UBICACIÓN:	COL. 28 DE ABRIL, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.

E S T I M A C I O N N o. 1

FOTOGRAFIA

DESCRIPCION DE CONCEPTO

CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 10+-2 CM ACABADO RAYADO FINO CON BROCHA DE PELO, JUNTAS FRIAS CON DOBLADOR DE 2", SECCION DE LOSAS DE ACUERDO ALA EXISTENTE, INCLUYE: COLADO , CURADO CON MEMBRANA A BASE DE AGUA Y TRABAJO TERMINADO



OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

2022

OBSERVACIONES :

SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTE
NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA

RESIDENTE DE OBRA
Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
T.C. FERNANDO LUNA MEDINA

BITÁCORA DE OBRA

HOJA _____

CONTRATO FISMDF 007,020,024/2022

OBRA FISMDF 007/2022


Con fecha de hoy esta supervisión autoriza las estimaciones numero 2 y 3 Finiquito de la obra FISMDF 007/2022 de la empresa Proyectos y Construcciones JE de la Peña en Aguascalientes, S.A. de C.V. dichas estimaciones del contrato de esta obra, bajo las siguientes características:

Estimación 2

- Periodo del 11 al 24 de Septiembre de 2022
- Entrega de generadores 25/ Octubre de 2022
- Monto base \$ 41,745.91
- Amortización de Anticipo \$ 20,872.96
- Total de retenciones \$ 417.46
- Total a pagar \$ 23,795.17

Estimación 3 Finiquito

- Periodo del 25 al 29 de Septiembre de 2022
- Entrega de generadores 25 de Octubre de 2022
- Monto base \$ 1,858.71
- Amortización de anticipo \$ 0.00
- Total de retenciones \$ 18.59
- Total a pagar \$ 2,137.51



MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

2022

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

USO DE BITÁCORA
