



Usr: SuSaNa
Rep: rptPoliza

Municipio de San Francisco de los Romo
ESTADO DE AGUASCALIENTES

Póliza: C05742 Del 28/12/2022



Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2023 01:02 p. m.
Página | 1

Concepto: FISM 2022 PAGADO EST 2 FINIQUITO OBRA FISMDF 008/2022 REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA.
GP Folio: 467

Beneficiario: GRUPO CONSTRUCTOR MED CER SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-2501-K015-J04-61402-2	CONSTRUCCIÓN Y/O	\$104,939.54		GP Folio: 467
0002	8260-2501-K015-J04-61402-2	CONSTRUCCIÓN Y/O		\$104,939.54	GP Folio: 467
0003	1112-003-002	Bancomer Cta. 011793039-9 FISM		\$104,034.88	GP Folio: 467
0004	2117-9-005-001	0.1% COLEGIO DE		\$90.47	FISM 2022 PAGADO EST 2 FINIQUITO OBRA FISMDF 008/2022
0005	2117-9-005-002	0.2% ORGANO SUPERIOR DE		\$180.93	FISM 2022 PAGADO EST 2 FINIQUITO OBRA FISMDF 008/2022
0006	2117-9-005-003	0.2% INST. DE CAPACIT. DE LA		\$180.93	FISM 2022 PAGADO EST 2 FINIQUITO OBRA FISMDF 008/2022
0007	2117-9-005-004	0.5% CONTRALORIA MUNICIPAL		\$452.33	FISM 2022 PAGADO EST 2 FINIQUITO OBRA FISMDF 008/2022
0008	2113-000272	CONSTRUCCIÓN Y/O	\$104,939.54		GP Folio: 467
Sumas iguales =>			209,879.08	209,879.08	

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
-- 2022
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL



Fecha y hora de consulta

28/12/2022 5:36:42 PM

Contrato

00796395

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO
DE LOS ROMO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: EST 2 FI FISMDF 008

Importe de la operación: 104,034.88 MXP

Cuenta de retiro: 0117930399

Cuenta de depósito: 014010655083510074

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE SAN FRA
NCISCO DE LOS ROMOTitular de la cuenta: GRUPO CONSTRUCTOR MED
CER SA D

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 28/12/2022

Fecha de aplicación: 28/12/2022

Concepto de pago: PAGO EST 2 FIN FISMDF 11-008

Referencia numérica: 281222

Instrumento de seguridad: ASD 6550927880

Hora de captura en el canal: 17:36:34

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000547773

Clave de rastreo: 002601002212280000547773

Folio de firma: 0090753088

Folio único: 1401202212281736340090753094

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	28/12/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	28/12/2022



GRUPO CONSTRUCTOR MED CER SA DE CV
GCM120227RL6
 LIMA 1906
 VERSALLES 1A SECCIÓN
 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES.
 AGUASCALIENTES, México C.P. 20285
 (601) General de Ley Personas Morales
 Teléfonos:
 Tipo Comprobante: (P) Pago

Documento Pago DP 282
Folio fiscal
 18cb1626-3a0f-41b0-b705-6951160d0f58
RFC Certificador
 LSO1306189R5
No. certificado del SAT
 00001000000509846663
Fecha y hora certificación
 2022-12-29 13:22:00
Lugar Expedición: Aguascalientes, 20285

RFC	MSF920130TQ9	Fecha expedición	29/12/2022 13:21:59
Nombre	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	Uso CFDI	(P01) Por definir
Calle	FRANCISCO ROMO JIMENEZ 102		
Colonia	SAN JOSE DE BUENAVISTA Municipio SAN FRANCISCO DE LOS ROMO C.P. 20300		
Ciudad, Estado	SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES. México		

Clave	ProdServ	Cantidad	Cve. Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
	84111506	1	(ACT) Actividad	Pago	0	0
Subtotal						0.00
Total						0.00

CERO XXX 00/100

Ordenante	BBA830831LJ2	012010001179303990	Beneficiario	BSM970519DU8	014010655083510074
Forma Pago	(03) Transferencia electrónica de fondos			Número Operación	001734402
Fecha Pago	2022-12-28T12:00:00				

Documentos Pagados

UUID	Documento	Metodo Pago	Importe	Moneda
56f91092-7647-4646-86a4-684f1ef10479	981	PPD	104,034.88	MXN
<i>Parcialidad : 1</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Insoluto</i>	<i>0.00</i>	
CIENTO CUATRO MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 88/100 M.N.			Total	104,034.88 MXN

Número Certificado 00001000000506436295

Sello digital del CFDI

CTV9jw4cULw3rS7SSmJ5/z4LgYokUTdGGpa/RQnKULKYBqyCZd9+KFKPMpeggv+r1sr19V8amEUVMdac/vxTiLDkC4qk4uEVzVde1v/6d8/PkD91C6CEhZ7Taq+fc5fFKDENYon2go2HzMnd7IWqCOYAWxXJskicfGMOH3VZVe5BNeF7+VrRGjoS03KXSBCWbaxR5xp1yJgJVbeOqC/cIAAQDN6Xz97XiM7/v6gi3PiQte2Ej+mrsf/90W1tzWAK0now+ZGnLYBMVhT2mZvGS129RNo80tXLJQbqxfm4xFUU4E/xWBocg84VCuwJHTjnNDRFextNvP+B11svzAw==

Sello del SAT

RkWVbhe9Cd8F51h4Qn5IoWpI4/b0tncVPqIdg/jL4DWR0j12MrN2hg9cU4F3HkatpKxwQkBIcCd63dL+kpbQhTFoXnt1ZXEbk712DeVBK4Rgv0zru2k2nd7Zh4IMNapdDjMvwDVktoGE14B30jaJnV1xMbUKcGpFyrBoKzX0JMxt2N9NZgOhYzCn6jPYZboY7ULzciSlhy3zM/JLpQ6KFSUmvVx19WNWNeRiDip50JFnFJQeAH9NNcMZbdSJC/DSjIezk8qDlVnFZsYD7KPe5UBOGr+7M8J081EYQAMz6z+yRMOX7S2ioQWUeMTvY+w0ZyENdsR0J3KPeY71Yhuw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||.1.1|18cb1626-3a0f-41b0-b705-6951160d0f58|2022-12-29T13:22:00|LSO1306189R5|CTV9jw4cULw3rS7SSmJ5/z4LgYokUTdGGpa/RQnKULKYBqyCZd9+KFKPMpeggv+r1sr19V8amEUVMdac/vxTiLDkC4qk4uEVzVde1v/6d8/PkD91C6CEhZ7Taq+fc5fFKDENYon2go2HzMnd7IWqCOYAWxXJskicfGMOH3VZVe5BNeF7+VrRGjoS03KXSBCWbaxR5xp1yJgJVbeOqC/cIAAQDN6Xz97XiM7/v6gi3PiQte2Ej+mrsf/90W1tzWAK0now+ZGnLYBMVhT2mZvGS129RNo80tXLJQbqxfm4xFUU4E/xWBocg84VCuwJHTjnNDRFextNvP+B11svzAw==|00001000000509846663||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

MUNICIPIO DE
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

2022

OPERADO
 OBRA INFRA ESTRUCTURA
 SOCIAL MUNICIPAL

MUNICIPIO DE
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.

PAGADO
FINANZAS

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/Pagos
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pagos/Pagos10.xsd" xmlns:pago10="http://www.sat.gob.mx/Pagos" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
Certificado="MIIGGzCCBAOgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDY0MzYyOTUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUkl
Sello="CTV9jw4cULw3rS7SSmJ5/z4LgYOkUTdGGpa/RQnKULKYBqyCZd9+KFKPMpcggv+r1sr19V8amEUVmDac/vxTiLDkC4qk4uEVzVde1v/6d8/PkD91C6C
NoCertificado="00001000000506436295" LugarExpedicion="20285" TipoDeComprobante="P" Total="0" Moneda="XXX" SubTotal="0" Fecha="2022-12-29T13:21:59"
Folio="282" Serie="DP" Version="3.3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="GRUPO CONSTRUCTOR MED CER SA DE CV" Rfc="GCM120227RL6"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO" Rfc="MSF920130TQ9" UsoCFDI="P01"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="0" ValorUnitario="0" Descripcion="Pago" ClaveUnidad="ACT" Cantidad="1" ClaveProdServ="84111506"/>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Complemento>
    - <pago10:Pagos Version="1.0">
      - <pago10:Pago CtaBeneficiario="014010655083510074" RfcEmisorCtaBen="BSM970519DU8" CtaOrdenante="012010001179303990"
        RfcEmisorCtaOrd="BBA830831LJ2" NumOperacion="001734402" Monto="104034.88" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="03" FechaPago="2022-12-
        28T12:00:00">
          <pago10:DoctoRelacionado Folio="981" ImpSaldoInsoluto="0.00" ImpPagado="104034.88" ImpSaldoAnt="104034.88" NumParcialidad="1"
            MetodoDePagoDR="PPD" MonedaDR="MXN" IdDocumento="5691092-7647-4646-86a4-684f1ef10479"/>
        </pago10:Pago>
      </pago10:Pagos>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
    instance" Version="1.1" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
    SelloSAT="RkWVbhe9Cd8F5h4Qn5IoWpI4/b0tncVPqiDqjL4DWR0j12MrN2hg9cU4F3HkatpKxwQkBIccD63dL+kpbQhTFoXntlZXEbk712DcVI
    NoCertificadoSAT="00001000000509846663"
    SelloCFD="CTV9jw4cULw3rS7SSmJ5/z4LgYOkUTdGGpa/RQnKULKYBqyCZd9+KFKPMpcggv+r1sr19V8amEUVmDac/vxTiLDkC4qk4uEVzVd
    RfcProvCertif="LSO1306189R5" FechaTimbrado="2022-12-29T13:22:00" UUID="18cb1626-3a0f-41b0-b705-6951160d0f58"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```


MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

-- 2022

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

CÉDULA DE SEGUIMIENTO A ESTIMACIONES DE OBRA



DATOS GENERALES

CONTRATISTA: GRUPO COSTRUCTOR MED CER, S.A. DE C.V. SUPERVISOR: T.C. FERNANDO LUNA MEDINA OBRA: REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE A	N° DE CONTRATO: FISMDF 008/2022 N° DE OBRA: FISMDF 008/2022 N° DE FACTURA: N° DE ESTIMACION: 2 (DOS FINIQUITO) IMPORTE LIQUIDO: \$ 104,034.88
FECHA DE CORTE: DEL: 18.sep.2022 AL: 29.sep.2022	

FORMATO DE NUMEROS GENERADORES

INGRESO	REVISION	NOTA	CAPTURA EN SISTEMA	ENTREGA DE PRE-FACTURA
24 oct-22	28 oct-20	<i>Sr. contratista regrese esta cédula con la estimación original de lo contrario no se le dara tramite</i>	28 oct-20	28 oct-20
CONTRATISTA	SUPERVISOR		SUPERVISOR	SUPERVISOR

FORMATO DE ESTIMACION

INGRESO	REGISTRO	SUPERVISOR	RECIBIDO	AUTORIZADO	JEFE DE DEPARTAMENTO
15/12/2022	15/12/22	15/12/2022	15/12/2022		ARQ. ALFREDO FLORES MARMOLEJO
CONTRATISTA	CONTROL DE ESTIMACIONES		RECIBIDO	AUTORIZADO	RECIBIDO / AUTORIZADO

DEVOLUCIÓN

FECHA DE DEVOLUCIÓN: 28/10/2022
 FECHA DE REINGRESO: 15/12/2022
 MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN:
 - FALTAN FOTOS GRAFÍAS
 - CORRECCION CROQUIS
 - FALTA FIANZA Y.O.

CONTENIDO

CÁRATULA	X
RESUMEN	X
CONCEPTOS	X
ESTADO DE CUENTA	X
CONCENTRADO DE CONCEPTOS (FIN)	X
GENERADORES Y RESUMEN	X
CROQUIS	X
FOTOGRAFÍAS	X
ANÁLISIS PRECIO UNITARIO	
REPORTE(S) DE LABORATORIO	XX
FIANZA(S) (FIN)	XX
NOTA DE BITACORA DE OBRA	X

DIRECTOR GENERAL

ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA
 16/12/22 16/12/22
 RECIBIDO AUTORIZADO

FINANZAS

RECIBIDO AUTORIZADO

TRAMITE DE PAGO

FECHA DE INICIO DE TRAMITE EN DOP-SFR	FIRMA DEL DIRECTOR	OFICIO DE LIBERACION	FECHA DE ENTREGA
24 10 22 DÍA: MES: AÑO:	16 12 22 DÍA: MES: AÑO:	16 12 22 DÍA: MES: AÑO:	DIRECCION DE EGRESOS.

PRE-FACTURA De Cierre



PRE-FACTURA DEL CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR MED CER, S.A. DE C.V. (201)

A NOMBRE DE: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 RFC: MSF920130TQ9
 DIRECCION: FCO ROMO JIMENEZ 102, SAN JOSE DE BUENAVISTA, SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS,
 CIUDAD: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE L ESTADO: AGUASCALIENTES

DESCRIPCION

PAGO DE LA ESTIMACION No.	2 Del 18 Sep 2022 al 29 Sep 2022		MONTO BASE	\$90,465.12
DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE ANTONIO RODRIGUEZ A LIMITE NORTE		AJUSTE DE COSTOS (+)	\$0.00
			AMORTIZACION DE ANTICIPO (-)	\$0.00
UBICADA EN:	CONCEPCION EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMOSEN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.		SUBTOTAL	\$90,465.12
CON AMPARO DEL CONTRATO No.:	FIS MDF 008/2022		IVA (+)	\$14,474.42
DE FECHA.:	18/07/2022		SUBTOTAL CON IVA	\$104,939.54
BAJO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA:				
Inversion	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal 2022			
Programa	SD ALCANTARILLADO			
SubPrograma	01 REHABILITACION			
Obra.	FIS MDF 008/2022 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE ANTONIO F			
Localizacion	CONCEPCION EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMOSEN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.			
		CAPACITACION DE LOS TRABAJADORES DEL CONTRATISTA	\$180.93 (0.20%)	
		COLEGIOS DE PROFESIONISTAS SEGUN CORRESPONDA	\$90.47 (0.10%)	
		SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	\$0.00 (0.00%)	
		FISCALIZACION DEL H. CONGRESO DEL ESTADO	\$180.93 (0.20%)	
		INSPECCION DE VIGILANCIA PARA LA CONTRALORIA	\$452.33 (0.50%)	
		SERVICIOS RELATIVOS ALAS CONSTRUCCIONES	\$0.00	
		\$904.66		
Avance Físico Real %			TOTAL DE RETENCIONES (-)	\$904.66
Avance Físico Programado	100.00%		SANCION POR RETRASO (-)	\$0.00
Fecha Terminación Prog.	16/09/2022		SUBTOTAL MENOS RETENCIONES	\$104,034.88
			RETENCION POR RETRASO(-)	\$0.00
			REINTEGRO POR RETENCION	\$0.00
			OTRAS SANCIONES(-)	\$0.00
			TOTAL A PAGAR	\$104,034.88

CIENTO CUATRO MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 88/100 M.N.

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS
OPERA DO
OBRA INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 2022

ESTADO DE CUENTA


Obra.	FISMDF 008/2022 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE ANTONIO RODRIGUEZ A LIMITE	Total Contrato	312,562.39
Localización	NORTE CONCEPCION EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMOSEN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.	Total Ampliaciones	104,939.54
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura So	Total Contratado	417,501.93
Programa	SD ALCANTARILLADO	Anticipo ()%	156,281.20
SubPrograma	01 REHABILITACION	Estimado Anterior	312,562.39
Contratista	GRUPO CONSTRUCTOR MED CER, S.A. DE C.V. (201) REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE	Esta Estimacion	104,939.54
Contrato	FISMDF 008/2022 ANTONIO RODRIGUEZ A LIMITE NORTE	Total Estimado	417,501.93
Estimacion No.	2 Del 18 Sep 2022 al 29 Sep 2022	Total por Estimar	0.00

No. Estimac.	Periodo	Importe Estimacion	Amortizacion de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA (+)	Cargo a la Obra	DEDUCCIONES (-)						Retencion (-)	Reintegro (+)	Sanciones (-)	Importe a Pagar
							CMIC(0)	Cgio.Prof.(0)	SFP(0.5)	Cona. Edo.(0.2)	Municipal	ISRuOtro(0)				
Anticipo				134,725.17	21,556.03	156,281.20										156,281.20
1	Del 01 Ago 2022 al 17 Sep	269,450.33	134,725.17	0.00	21,556.03	156,281.19	538.90	269.45	0.00	538.90	1,347.25	0.00	0.00	0.00	0.00	153,586.69
2	Del 18 Sep 2022 al 29 Sep	90,465.12	0.00	0.00	14,474.42	104,939.54	180.93	90.47	0.00	180.93	452.33	0.00	0.00	0.00	0.00	104,034.88
TOTALES		359,915.45	134,725.17		57,586.48	417,501.93	719.83	359.92	0.00	719.83	1,799.58	0.00	0.00	0.00	0.00	413,902.77

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

2022

RESUMEN DE ESTIMACION

Obra.	FISDMF 008/2022 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE ANTONIO RODRIGUEZ A LIMITE	Total Contrato	\$312,562.39
Localización	NORTE CONCEPCION EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMOSEN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.	Total Ampliaciones	\$104,939.54
Fuente Financ.		Total Contratado	\$417,501.93
Programa	SD ALCANTARILLADO	Anticipo (50)%	\$156,281.20
SubPrograma	01 REHABILITACION	Estimado Anterior	\$312,562.39
Supervisor	FERNANDO LUNA MEDINA (LUMF740415)	Esta Estimacion	\$104,939.54
Contratista	GRUPO CONSTRUCTOR MED CER, S.A. DE C.V. (201)	Total Estimado	\$417,501.93
Contrato	FISDMF 008/2022 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE ANTONIO RODRIGUEZ A LIMITE NORTE	Saldo por Estimar	\$0.00
Estimacion No.	2 (De Cierre)		
Recibí de	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	la Cantidad de:	\$104,939.54 CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 54/100 M.N.

GRUPO PARTIDA

* EXTRAORDINARIOS	\$4,651.41
- EXTRAORDINARIOS	\$4,651.41
* INDIRECTOS NO EJECUTADOS	\$-2,254.55
- INDIRECTOS NO EJECUTADOS	\$-2,254.55
* REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE ANTONIO RODRIGUI	\$88,068.26
- GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO	\$88,068.26
Fecha Terminación Prog.	SUMA \$90,465.12
	AJUSTE DE COSTOS (+) \$0.00
	AMORTIZACION DE ANTICIPO (-) \$0.00
	SUBTOTAL \$90,465.12
	IVA (+) \$14,474.42
	SUBTOTAL CON IVA \$104,939.54

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 -- -- --
 2022
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURAL
SOCIAL MUNICIPAL

GRUPO CONSTRUCTOR MED CER, S.A. DE C.V. (GCM120227RL6)
 Contratista

T.C. FERNANDO LUNA MEDINA (LUMF740415)
 SUPERVISOR

CONCEPTOS DE ESTIMACION

De Cierre



Obra.	FISMDF 008/2022 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE ANTONIO RODRIGUEZ A LIMITE NORTE	Total Contrato	\$312,562.39
Localización	CONCEPCION EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMOSEN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.	Total Ampliaciones	\$104,939.54
Fuente Financ.		Total Contratado	\$417,501.93
Programa	SD ALCANTARILLADO	Anticipo (50)%	\$156,281.20
SubPrograma	01 REHABILITACION	Estimado Anterior	\$312,562.39
Supervisor	FERNANDO LUNA MEDINA (LUMF740415)	Esta Estimacion	\$104,939.54
Contratista	GRUPO CONSTRUCTOR MED CER, S.A. DE C.V. (201)	Total Estimado	\$417,501.93
Contrato	FISMDF 008/2022 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE ANTONIO RODRIGUEZ A LIMITE NORTE	Saldo por Estimar	\$0.00
Estimacion No.	2 (De Cierre) Del 18 Sep 2022 al 29 Sep 2022		
Recibí de	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO la Cantidad de: \$104,939.54 CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 54/100 M.N.		

No.	Concepto	Unid. Med	Volumen					Precio Contratado	Importe
			Contratado	Acumulado	Anterior	Actual	Excedente		

GRUPO: REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE ANTONIO RODRIGUEZ A LIMITE NORTE EN LA CONCEPCION EN EL MUNICIPIO DE S

PARTIDA: GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO

25	REPOSICIÓN DE EMPEDRADO CON ESPESOR DE 15 cm A BASE DE PIEDRA BOLA DE RIO, TAMAÑO MAXIMO DE LA PIEDRA DE 10 cm, ASENTADO SOBRE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 EN ESPESOR DE 5.0 cm, EMBOQUILLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 (ARENA CERNIDA). INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, SELECCION DEL MATERIAL, ACOMODO DE PIEDRA, LIMPIEZA.	M2	89.60	214.03	87.88	126.15	124.43	\$627.09	\$79,107.40
26	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 10+2 CM ACABADO RAYADO FINO CON BROCHA DE PELO, JUNTAS FRIAS CON DOBLADOR DE 2", SECCION DE LOSAS DE ACUERDO ALA EXISTENTE, INCLUYE: COLADO , CURADO CON MEMBRANA A BASE DE AGUA Y TRABAJO TERMINADO SEGUN FICHA TECNICA IT-200.	M2	8.78	9.96	3.63	6.33	1.18	\$420.70	\$2,661.90
28	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE DIAMANTE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=38 KG/CM2, TMA 1 1/2", RESISTENCIA RÁPIDA A LOS 7 DÍAS, DE 16 CM DE ESPESOR Y 1.50 M POR LADO. INCLUYE: FOAMTECH DE 15CMX1/2", ARMADO CON VARILLA DEL No. 3 A CADA 15 CM, ARMEX 1515-4, PELO DE ANGEL 900 GRAMOS M3, TAPA Y BROCAL DE POLIETILENO PARA TRÁFICO PESADO, CORTE 1/3 DE ESPESOR , A CADA ARISTA HACIA CENTRO DE PROYECTO.	M2	1.00	1.00	0.00	1.00		\$5,174.48	\$5,174.48
29	LIMPIEZA FINAL , INCLUYE: BARRIDO CON AGUA , MATERIALES, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO.	M2	106.57	79.75	0.00	79.75		\$14.10	\$1,124.48
								Total Partida	\$88,068.26
								Total Grupo	\$88,068.26

GRUPO: EXTRAORDINARIOS

PARTIDA: EXTRAORDINARIOS

30	REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO MR=38 KG/CM2 RR 7 DIAS ESPESOR DE 20 CM ACABADO RAYADO CON PEINE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CURADO CON AGUA Y CUBIERTO CON POLIETILENO, P.U.O.T	M2.	0.00	7.26	0.00	7.26	7.26	\$640.69	\$4,651.41
								Total Partida	\$4,651.41

GRUPO CONSTRUCTOR MED CER, S.A. DE C.V. (GCM120227RL6)

T.C. FERNANDO LUNA MEDINA (LUMF740415)

CONTRATISTA

SUPERVISOR

No.	Concepto	Unid. Med	Volumen					Precio Contratado	Importe
			Contratado	Acumulado	Anterior	Actual	Excedente		

Total Grupo \$4,651.41

GRUPO: **INDIRECTOS NO EJECUTADOS**

PARTIDA: **INDIRECTOS NO EJECUTADOS**

31	Indirecto por administración de obra por el convenio de ampliación en monto por la cantidad de \$31,911.55	IN	0.00	-1.00	0.00	-1.00	\$2,254.55	\$-2,254.55
----	--	----	------	-------	------	-------	------------	-------------

Total Partida	\$-2,254.55
Total Grupo	\$-2,254.55
Total Presupuestado	\$90,465.12
Ajuste de Costos	\$0.00
Total	\$90,465.12

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RIOS
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURAL SOCIAL MUNICIPAL
 2022

GRUPO CONSTRUCTOR MED PER, S.A. DE C.V. (GCM120227RL6)

CONTRATISTA

T.C. FERNANDO LUNA MEDINA (LUMF740415)

SUPERVISOR



Ayuntamiento de
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
2021 • 2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
RESUMEN DE ESTIMACIÓN

FECHA: 15 de septiembre de 2022

NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE E LOCALIDAD: LA CONCEPCION, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.**
 No. DE CONTRATO Y OBRA: **FISMDF 006-008-009-026/2022 FISMDF 008/2022**
 IMPORTE DE CONTRATO: **\$312.561.39 (TRECIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO 39/100 M.N.)**
 FECHA DE INICIO REAL: **1 de agosto de 2022**
 FECHA DE INICIO VIGENTE (REPROGRAMACION SEGÚN ANTICIPO): **26 DE JULIO DE 2022**
 PLAZO DEL CONTRATO: **60 (SESENTA) DIAS CALENDARIO**
 FECHA DE TERMINO VIGENTE: **24 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FECHA DE TERMINO REAL: 29 de septiembre de 2022**
 No. DE ESTIMACION: **2 (DOS FINIQUITO)**
 PERIODO DEL: **01.ago.22 AL 17.sep.22**
 AVANCE FISICO: **100%**
 AVANCE FINANCIERO: **29%**

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLÚMEN			PU.	IMPORTE
			CONTRATADO	EXCEDENTE	EJECUTADO		
RED DE ALCANTARILLADO							
1	SONDEO PARA LOCALIZACIÓN DE REDES HIDRÁULICAS,	SONDEO	1.00	-1.00	0.00	\$ 580.92	\$ -
2	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON EQUIPO	M	80.08	-80.08	0.00	\$ 10.87	\$ -
3	CORTE CON DISCO DIAMANTADO DE 14" EN PAVIMENTO	M	15.40	-15.40	0.00	\$ 27.34	\$ -
4	DEMOLICION A MAQUINA DE PAVIMENTO (CONCRETO,	M³	8.35	-8.35	0.00	\$ 361.90	\$ -
5	EXCAVACION DE ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN	M³	66.28	-66.28	0.00	\$ 79.03	\$ -
6	CARGA Y ACARREO EN CAMION AL TIRADERO OFICIAL DE	M³	74.63	-74.63	0.00	\$ 38.51	\$ -
7	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O	M³/Km.	298.52	-298.52	0.00	\$ 14.77	\$ -
8	CAMA Y ACOSTILLADO CON GRAVA DE 3/4" CON UN	M³	5.52	-5.52	0.00	\$ 656.01	\$ -
9	RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO AL 90% DE SU	M³	47.15	-47.15	0.00	\$ 377.31	\$ -
10	RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% DE SU	M³	11.05	-11.05	0.00	\$ 380.81	\$ -
11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. SERIE	M	78.90	-78.90	0.00	\$ 548.75	\$ -
12	CONEXION DE TUBERIA DE PVC DE 8.00" A 12.00" A POZO	Pza.	2.00	-2.00	0.00	\$ 924.74	\$ -
DESCARGAS SANITARIAS							
13	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON EQUIPO	M	70.43	-70.43	0.00	\$ 10.87	\$ -
15	DEMOLICION A MAQUINA DE PAVIMENTO (CONCRETO,	M³	6.08	-6.08	0.00	\$ 361.90	\$ -
16	EXCAVACION DE ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN	M³	45.69	-45.69	0.00	\$ 79.03	\$ -
17	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO II 0.00 A 2.00 m	M³	11.42	-11.42	0.00	\$ 463.09	\$ -
18	CARGA Y ACARREO EN CAMION AL TIRADERO OFICIAL DE	M³	63.90	-63.90	0.00	\$ 38.51	\$ -
19	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O	M³/KM	255.60	-255.60	0.00	\$ 14.77	\$ -
20	RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO AL 90% DE SU	M³	33.06	-33.06	0.00	\$ 377.31	\$ -
21	RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% DE SU	M³	6.79	-6.79	0.00	\$ 380.81	\$ -
22	DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE P.V.C. SERIE	Pza.	13.00	-13.00	0.00	\$ 1,396.51	\$ -
28	DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE P.V.C. SERIE	M	46.05	-46.05	0.00	\$ 365.74	\$ -
24	REGISTRO SANITARIO DE 0.40X0.60X0.80 M (MEDIDAS	Pza.	13.00	-13.00	0.00	\$ 3,346.78	\$ -
GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO							
25	REPOSICION DE EMPEDRADO CON ESPESOR DE 15 cm A	M²	89.60	36.55	126.15	\$ 627.09	\$ 79,107.40
26	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A	M²	8.78	-2.45	6.33	\$ 420.70	\$ 2,661.90
28	CONSTRUCCION DE LOSA DE DIAMANTE DE CONCRETO	Pza.	1.00	0.00	1.00	\$ 5,174.48	\$ 5,174.48
29	LIMPIEZA FINAL , INCLUYE: BARRIDO CON AGUA ,	M²	106.57	0.00	106.57	\$ 14.10	\$ 1,502.65
EXT.30	REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	M²	6.76	-0.09	6.67	\$ 640.69	\$ 4,273.40
EXT.31	Indirecto por administración de obra por el convenio de	IN	0.00	0.00	-1.00	\$ 2,254.55	\$ -2,254.55

SUB-TOTAL \$ 90,465.28
 ANTICIPO 50% \$ 134,725.17
 TOTAL -\$ 44,259.89

CARLOS MEDRANO CERVANTES
 GRUPO CONSTRUCTOR MED CER S.A DE C.V.
 NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA

T.C. FERNANDO LUNA MEDINA
 Residente de Obra

Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo

ARG. ALFREDO FLORES-MARMOLEJO
 Jefe Departamento de Supervisión

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

-- 2022

OPERADO OBRA INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA
PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.



NO. DE OBRA: FSMDF 008/2022
 NO. DE CONTRATO: FSMDF 006-008-009-026/2022
 DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE EMILIANO ZAP
 UBICACIÓN: LA CONCEPCION, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.

NUMEROS GENERADORES

ESTIMACION No. 1

No.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			AREA	ANCHO	ANCHO	ALTO	RESULTADO	TOTAL	CROQUIS	FOTOGRAFIA
			EJE	TRAMO	TIPO								
25	REPOSICIÓN DE EMPEDRADO CON ESPESOR DE 15 cm A BASE DE PIEDRA BOLA DE RIO, TAMAÑO MAXIMO DE LA PIEDRA DE 10 cm, ASENTADO SOBRE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 EN ESPESOR DE 5.0 cm, EMBOQUILLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 (ARENA CERNIDA). INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, SELECCION DEL MATERIAL, ACOMODO DE PIEDRA, LIMPIEZA.	M ²				126.15					126.15		ANEXO SEGUN PLANO DWG O LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
TOTAL											126.15		

OPERADO
 OBRA INFRA ESTRUCTURA
 SOCIAL MUNICIPAL
 2022
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 MUNICIPIO DE

OBSERVACIONES:

 SUPERINTENDENTE DE OBRA
 GRUPO CONSTRUCTOR MED CER S.A DE C.V.
 NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA

 RESIDENTE DE OBRA
 Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
 T.C. FERNANDO LUNA MEDINA

**PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA
PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.**



NO. DE OBRA: FSMDF 008/2022
 NO. DE CONTRATO: FSMDF 006-008-009-026/2022
 DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE EMILIANO ZAP
 UBICACIÓN: LA CONCEPCION, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.


NUMEROS GENERADORES

ESTIMACION No. 1

CROQUIS

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO

REPOSICIÓN DE EMPEDRADO CON ESPESOR DE 15 cm A BASE DE PIEDRA BOLA DE RIO, TAMAÑO MAXIMO DE LA PIEDRA DE 10 cm, ASENTADO SOBRE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 EN ESPESOR DE 5.0 cm, EMBOQUILLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 (ARENA CERNIDA). INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, SELECCION DEL MATERIAL, ACOMODO DE PIEDRA, LIMPIEZA.

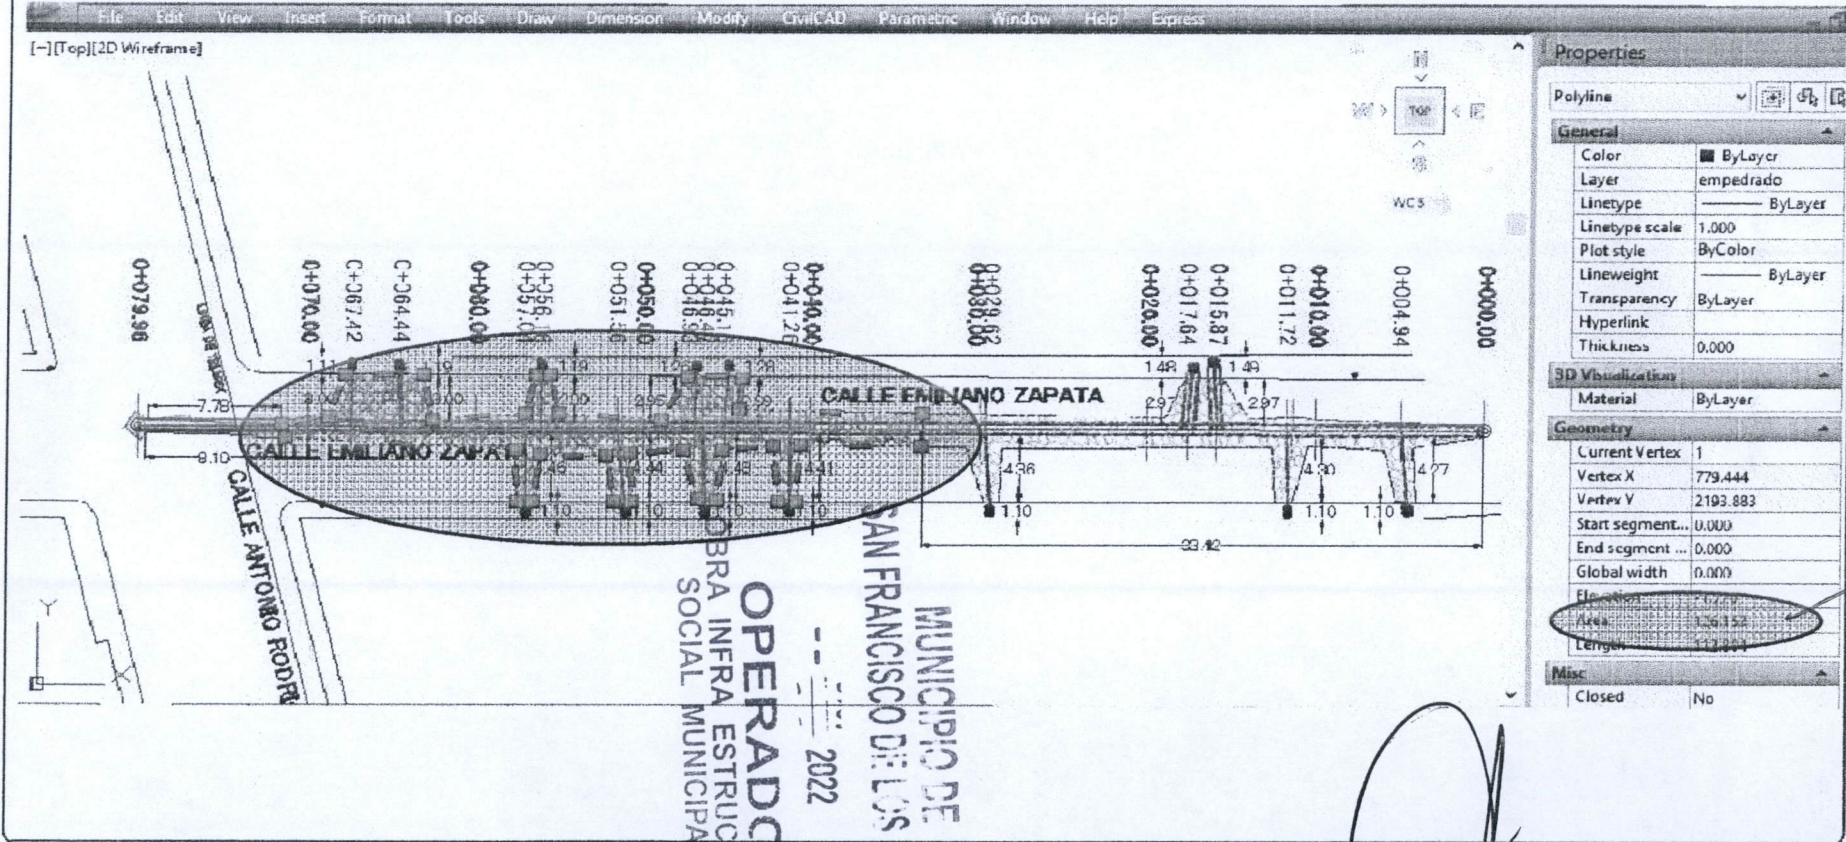

Properties

Polyline

General

Color	ByLayer
Layer	empedrado
Linetype	ByLayer
Linetype scale	1.000
Plot style	ByColor
Lineweight	ByLayer
Transparency	ByLayer
Hyperlink	
Thickness	0.000

3D Visualization

Material	ByLayer
----------	---------

Geometry

Current Vertex	1
Vertex X	779.444
Vertex Y	2193.883
Start segment...	0.000
End segment ...	0.000
Global width	0.000
Elevation	0.000
Area	1.26352
Length	2.11044

Misc

Closed	No
--------	----

OBSERVACIONES :

SUPERINTENDENTE DE OBRA
 GRUPO CONSTRUCCION MED CER S.A DE C.V.
 NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA

RESIDENTE DE OBRA
 Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
 T.C. FERNANDO LUNA MEDINA

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA
PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

NO. DE OBRA: FISMDF 008/2022
NO. DE CONTRATO: FISMDF 006-008-009-026/2022
DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE EMILIANO ZAP
UBICACIÓN: LA CONCEPCION, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.





NUMEROS GENERADORES

ESTIMACION No 1

FOTOGRAFIA

DESCRIPCION DE CONCEPTO

REPOSICIÓN DE EMPEDRADO CON ESPESOR DE 15 cm A BASE DE PIEDRA BOLA DE RIO, TAMAÑO MAXIMO DE LA PIEDRA DE 10 cm, ASENTADO SOBRE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 EN ESPESOR DE 5.0 cm, EMBOQUILLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 (ARENA CERNIDA). INCLUYE ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, SELECCION DEL MATERIAL, ACOMODO DE PIEDRA, LIMPIEZA.

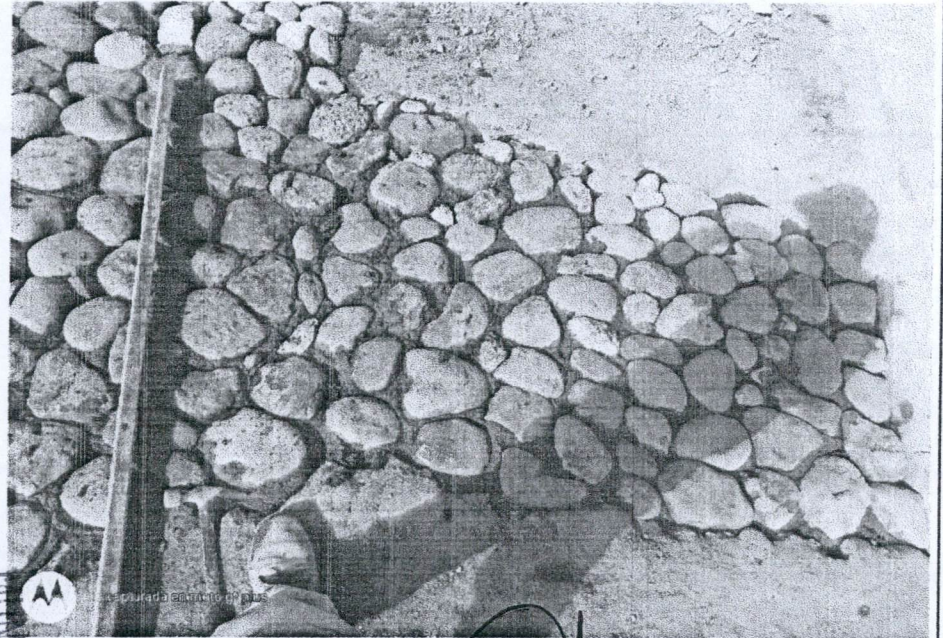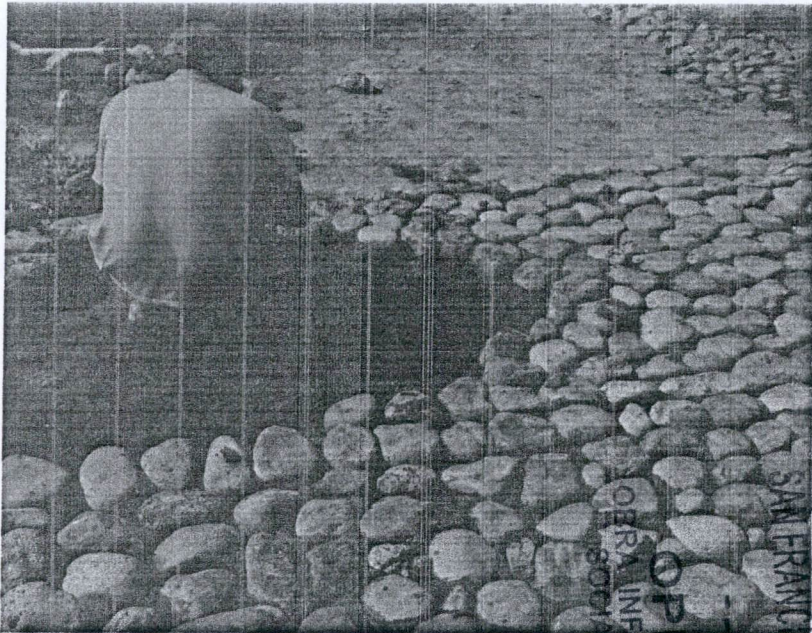

OBSERVACIONES :

SUPERINTENDENTE DE OBRA
GRUPO CONSTRUCTOR MED CER S.A DE C.V.
NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL
MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
2022

RESIDENTE DE OBRA
Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
T.C. FERNANDO LUNA MEDINA

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.



Ayuntamiento de
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
2021 - 2024

NO. DE OBRA: FSMDF 008/2022
 NO. DE CONTRATO: FSMDF 006-008-009-026/2022
 DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE EMILIANO ZAP
 UBICACIÓN: LA CONCEPCION, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.


NUMEROS GENERADORES

ESTIMACION No. 1

CROQUIS

DESCRIPCION DE CONCEPTO

CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 10+2 CM ACABADO RAYADO FINO CON BROCHA DE PELO, JUNTAS FRIAS CON DOBLADOR DE 2", SECCION DE LOSAS DE ACUERDO ALA EXISTENTE, INCLUYE: COLADO , CURADO CON MEMBRANA A BASE DE AGUA Y TRABAJO TERMINADO

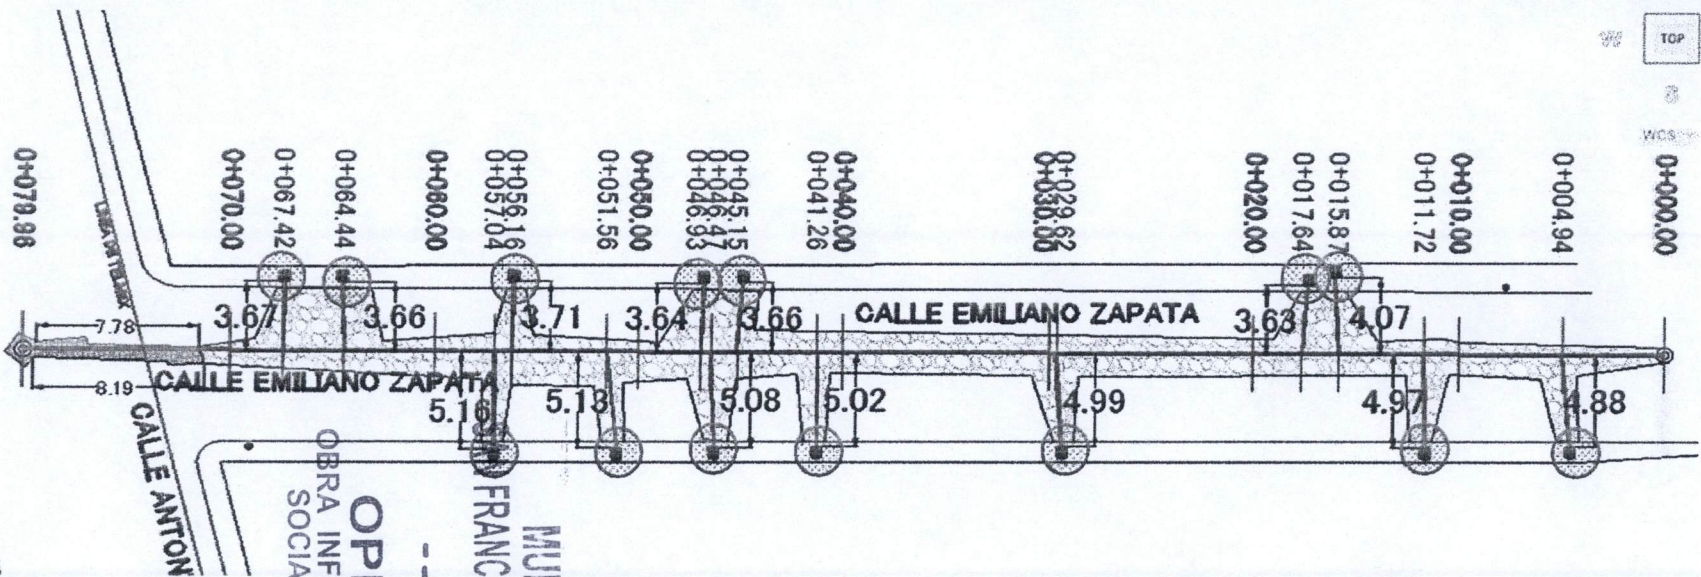

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 OPERADO
 OBRA INFRA ESTRUCTURAL
 SOCIAL MUNICIPAL
 2022

OBSERVACIONES :

SUPERINTENDENTE DE OBRA
 GRUPO CONSTRUCTOR MED CER S.A DE C.V.
 NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA

RESIDENTE DE OBRA
 Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
 F.C. FERNANDO LUNA MEDINA

**PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA
PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.**



NO. DE OBRA: FS MDF 008/2022
NO. DE CONTRATO: FS MDF 006-008-009-026/2022
DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE EMILIANO ZAP
UBICACIÓN: LA CONCEPCION, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.



NUMEROS GENERADORES

ESTIMACION No. 1

FOTOGRAFIA

DESCRIPCION DE CONCEPTO

CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 10+2 CM ACABADO RAYADO FINO CON BROCHA DE PELO, JUNTAS FRIAS CON DOBLADOR DE 2", SECCION DE LOSAS DE ACUERDO ALA EXISTENTE, INCLUYE: COLADO, CURADO CON MEMBRANA A BASE DE AGUA Y TRABAJO TERMINADO

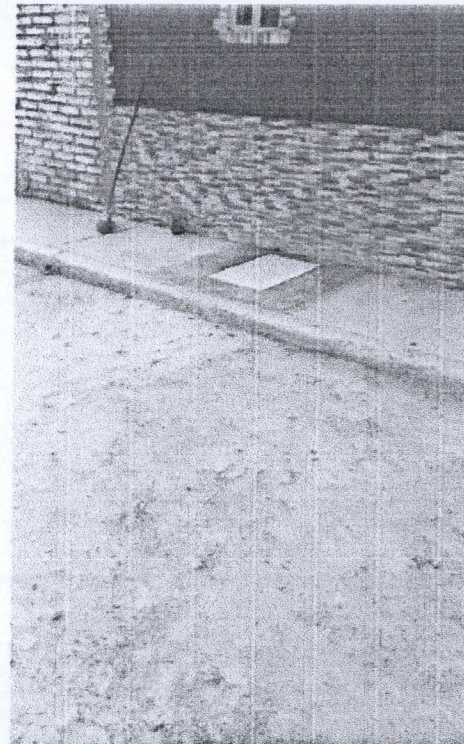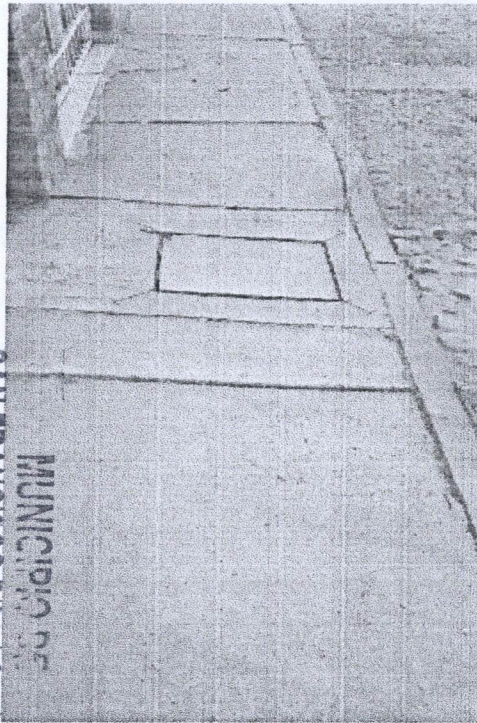

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL
2022

OBSERVACIONES:

SUPERINTENDENTE DE OBRA
GRUPO CONSTRUCTOR MED CER S.A DE C.V.
NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA

RESIDENTE DE OBRA
Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
T.C. FERNANDO LUNA MEDINA

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.



NO. DE OBRA: FIS MDF 008/2022
 NO. DE CONTRATO: FIS MDF 006-008-009-026/2022
 DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE EMILIANO ZAP
 UBICACIÓN: LA CONCEPCION, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.

NUMEROS GENERADORES

ESTIMACION No. 1

No.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ANCHO	ALTO	RESULTADO	TOTAL	CROQUIS	FOTOGRAFIA
			EJE	TRAMO	TIPO								
28	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE DIAMANTE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=38KG/CM2, TMA 1 1/2", RESISTENCIA RÁPIDA A LOS 7 DÍAS, DE 16 CM DE ESPESOR Y 1.50 M POR LADO. INCLUYE: FOAMTECH DE 15CMX1/2", ARMADO CON VARILLA DEL No. 3 A CADA 15 CM, ARMEX 1515-4, PELO DE ANGEL 900 GRAMOS M3, TAPA Y BROCAL DE POLIETILENO PARA TRÁFICO PESADO, CORTE 1/3 DE ESPESOR, A CADA ARISTA HACIA CENTRO DE BROCAL	PZA	1	0+079.96							1.00		ANEXO
TOTAL											1.00		

OPERADO
 OBRA INFRA ESTRUCTURA
 SOCIAL MUNICIPAL
 -- 2022
 MUNICIPIO DE
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

OBSERVACIONES :

SUPERINTENDENTE DE OBRA
 GRUPO CONSTRUCTOR MED CER S.A DE C.V.
 NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA

RESIDENTE DE OBRA
 Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
 T.C. FERNANDO LUNA MEDINA

**PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA
PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.**



Ayuntamiento de
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
2021 - 2024

NO. DE OBRA: FSMDF 008/2022
 NO. DE CONTRATO: FSMDF 006-008-009-026/2022
 DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE EMILIANO ZAP
 UBICACIÓN: LA CONCEPCION, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.


NUMEROS GENERADORES

ESTIMACION No. 1

CROQUIS

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO

CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE DIAMANTE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=38KG/CM2, TMA 1 1/2", RESISTENCIA RÁPIDA A LOS 7 DÍAS, DE 16 CM DE ESPESOR Y 1.50 M POR LADO. INCLUYE: FOAMTECH DE 15CMX1/2", ARMADO CON VARILLA DEL No. 3 A CADA 15 CM, ARMEX 1515-4, PELO DE ANGEL 900 GRAMOS M3, TAPA Y BROCAL DE POLIETILENO PARA TRÁFICO PESADO, CORTE 1/3 DE ESPESOR, A CADA

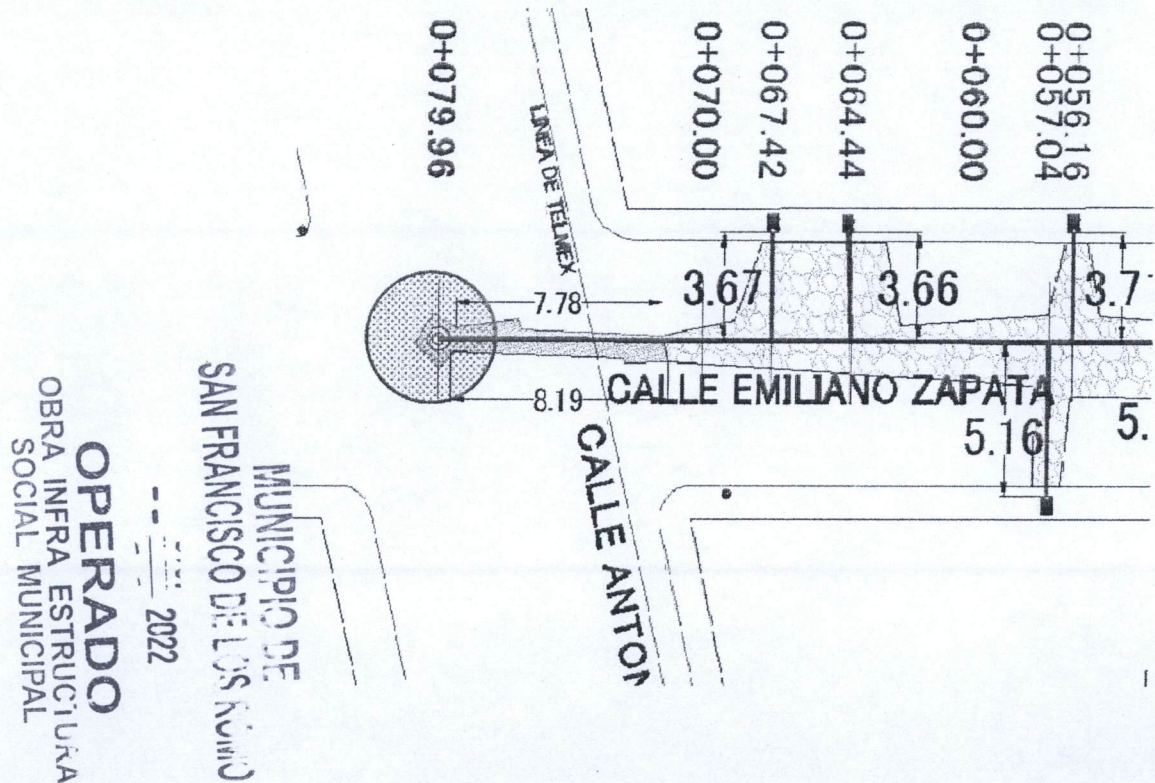

**MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
**OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL**
 2022

OBSERVACIONES :

 SUPERINTENDENTE DE OBRA
 GRUPO CONSTRUCTOR MED CER S.A DE C.V.
 NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA

 REPRESENTANTE DE OBRA
 Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
 T.C. FERNANDO LUNA MEDINA

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA
PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.



NO. DE OBRA: FSMDF 008/2022
NO. DE CONTRATO: FSMDF 006-008-009-026/2022
DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE EMILIANO ZAP
UBICACIÓN: LA CONCEPCION, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.


NUMEROS GENERADORES

ESTIMACION No. 1

FOTOGRAFIA

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO

CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE DIAMANTE DE CONCRETO Premezclado MR=38KG/CM2, TMA 1 1/2", RESISTENCIA RÁPIDA A LOS 7 DÍAS, DE 16 CM DE ESPESOR Y 1.50 M POR LADO. INCLUYE: FOAMTECH DE 15CMX1/2", ARMADO CON VARILLA DEL No. 3 A CADA 15 CM, ARMEX 1515-4, PELO DE ANGEL 900 GRAMOS M3, TAPA Y BROCAL DE POLIETILENO PARA TRÁFICO PESADO, CORTE 1/3 DE ESPESOR , A CADA

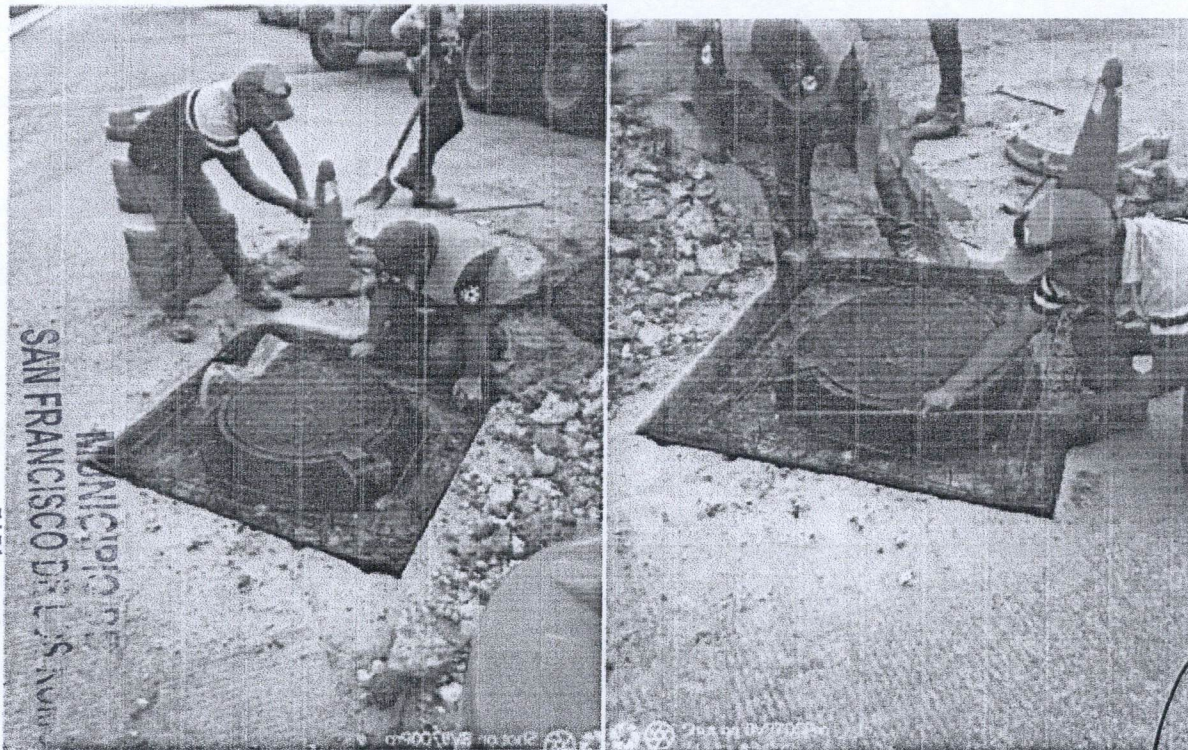

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

2022

OBSERVACIONES :

SUPERINTENDENTE DE OBRA
GRUPO CONSTRUCTOR MED CER S.A DE C.V.
NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA

RESIDENTE DE OBRA
Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
T.C. FERNANDO LUNA MEDINA

**PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA
PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.**



Aguntamiento de
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
2021 - 2024

NO. DE OBRA: FISMDF 008/2022
NO. DE CONTRATO: FISMDF 006-008-009-026/2022
DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE EMILIANO ZA
UBICACIÓN: LA CONCEPCION, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.


NUMEROS GENERADORES

ESTIMACION No. 1

CROQUIS

DESCRIPCION DE CONCEPTO

LIMPIEZA FINAL , INCLUYE: BARRIDO CON AGUA , MATERIALES, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO.

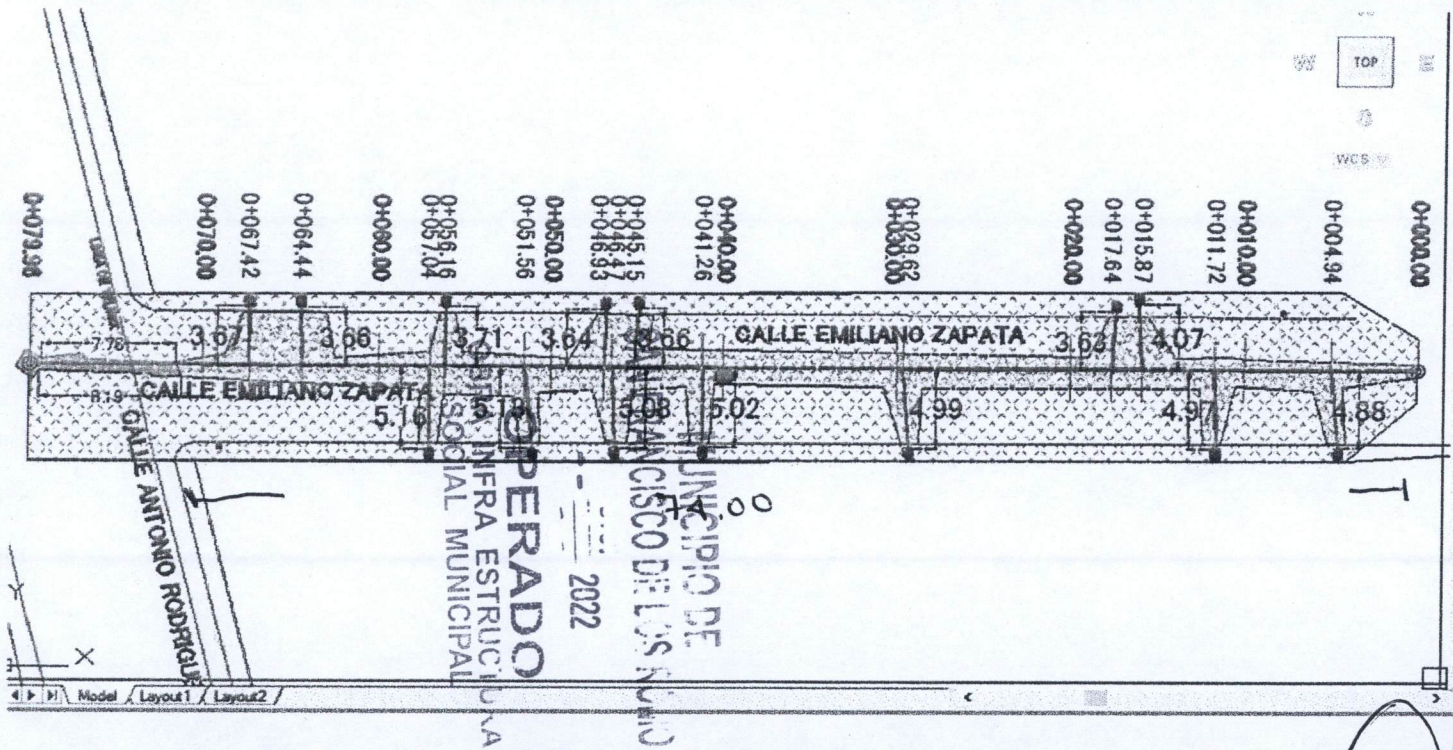

Hatch

Color	Color 90
Layer	0
Linetype	ByLayer
Linetype scale	1.000
Plot style	ByColor
Lineweight	ByLayer
Transparency	ByLayer
Hyperlink	

Patterns

Type	Predefined
Pattern name	ANSI37
Annotative	No
Angle	0.0000
Scale	0.250
Origin X	0.000
Origin Y	0.000
Spacing	0.250
ISO pen width	0.25 mm
Double	No
Associative	Yes
Island detecti...	Outer
Background c...	<input checked="" type="checkbox"/> None

Geometry

Elevation	0.000
Area	Salvador
Cumulative A...	225.795

OBSERVACIONES :

SUPERINTENDENTE DE OBRA
GRUPO CONSTRUCTORA WED CER S.A DE C.V.
NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA

RESIDENTE DE OBRA
Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
T.C. FERNANDO LUNA MEDINA

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA
PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

NO. DE OBRA: FISMDF 008/2022
NO. DE CONTRATO: FISMDF 006-008-009-026/2022
DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE EMILIANO ZA
UBICACIÓN: LA CONCEPCION, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.



NUMEROS GENERADORES

ESTIMACION No. 1

FOTOGRAFIA

DESCRIPCION DE CONCEPTO

LIMPIEZA FINAL, INCLUYE: BARRIDO CON AGUA, MATERIALES, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO.



OBSERVACIONES:

SUPERINTENDENTE DE OBRA
GRUPO CONSTRUCTOR MED CER S.A DEC.V.
NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA

RESIDENTE DE OBRA
Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
C. FERNANDO LUNA MEDINA

**PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA
PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.**



Ayuntamiento de
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
2021 - 2024

NO. DE OBRA: FIS MDF 008/2022
 NO. DE CONTRATO: FIS MDF 006-008-009-026/2022
 DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE EMILIANO ZAP
 UBICACIÓN: LA CONCEPCION, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.

NUMEROS GENERADORES

E S T I M A C I O N No. 1

No.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			AREA	ANCHO	ANCHO	ALTO	RESULTADO	TOTAL	CROQUIS	FOTOGRAFIA	
			EJE	TRAMO	TIPO									
28	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE DIAMANTE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=38KG/CM2, TMA 1 1/2", RESISTENCIA RÁPIDA A LOS 7 DÍAS, DE 16 CM DE ESPESOR Y 1.50 M POR LADO. INCLUYE: FOAMTECH DE 15CMX1/2", ARMADO CON VARILLA DEL No. 3 A CADA 15 CM, ARMEX 1515-4, PELO DE ANGEL 900 GRAMOS/M3, TAPA Y BROCAL DE POLIETILENO PARA TRÁFICO PESADO, CORTE 1/3 DE ESPESOR, A CADA ARISTA HACIA CENTRO DE BROCAL	PZA												
			1	0+079.96		8.11					8.11			
				DIAMANTE DE POZO		1.44					-1.44			
												ANEXO		
											TOTAL	6.67		

**MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
 OPERADO
 OBRA INFRA ESTRUCTURA
 SOCIAL MUNICIPAL
 2022

OBSERVACIONES:

 SUPERINTENDENTE DE OBRA
 GRUPO CONSTRUCTOR MED CER S.A DE C.V.
 NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA

 RESIDENTE DE OBRA
 Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
 T.C. FERNANDO LUNA MEDINA

**PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA
PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.**



Ayuntamiento de
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
2021 • 2024


NO. DE OBRA: FISMDF 008/2022
 NO. DE CONTRATO: FISMDF 006-008-009-026/2022
 DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE EMILIANO ZAP
 UBICACIÓN: LA CONCEPCION, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.

NUMEROS GENERADORES

ESTIMACION No. 1

DESCRIPCION DE CONCEPTO

CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE DIAMANTE DE CONCRETO PREMEZCLADO $M_k=38\text{KG}/\text{CM}^2$, TMA 1 1/2", RESISTENCIA RÁPIDA A LOS 7 DÍAS, DE 16 CM DE ESPESOR Y 1.50 M POR LADO. INCLUYE: FOAMTECH DE 15CMX1/2", ARMADO CON VARILLA DEL No. 3 A CADA 15 CM, ARMEX 1515-4, PELO DE ANGEL 900 GRAMOS M3, TAPA Y BROCAL DE POLIETILENO PARA TRÁFICO PESADO, CORTE 1/3 DE ESPESOR, A CADA

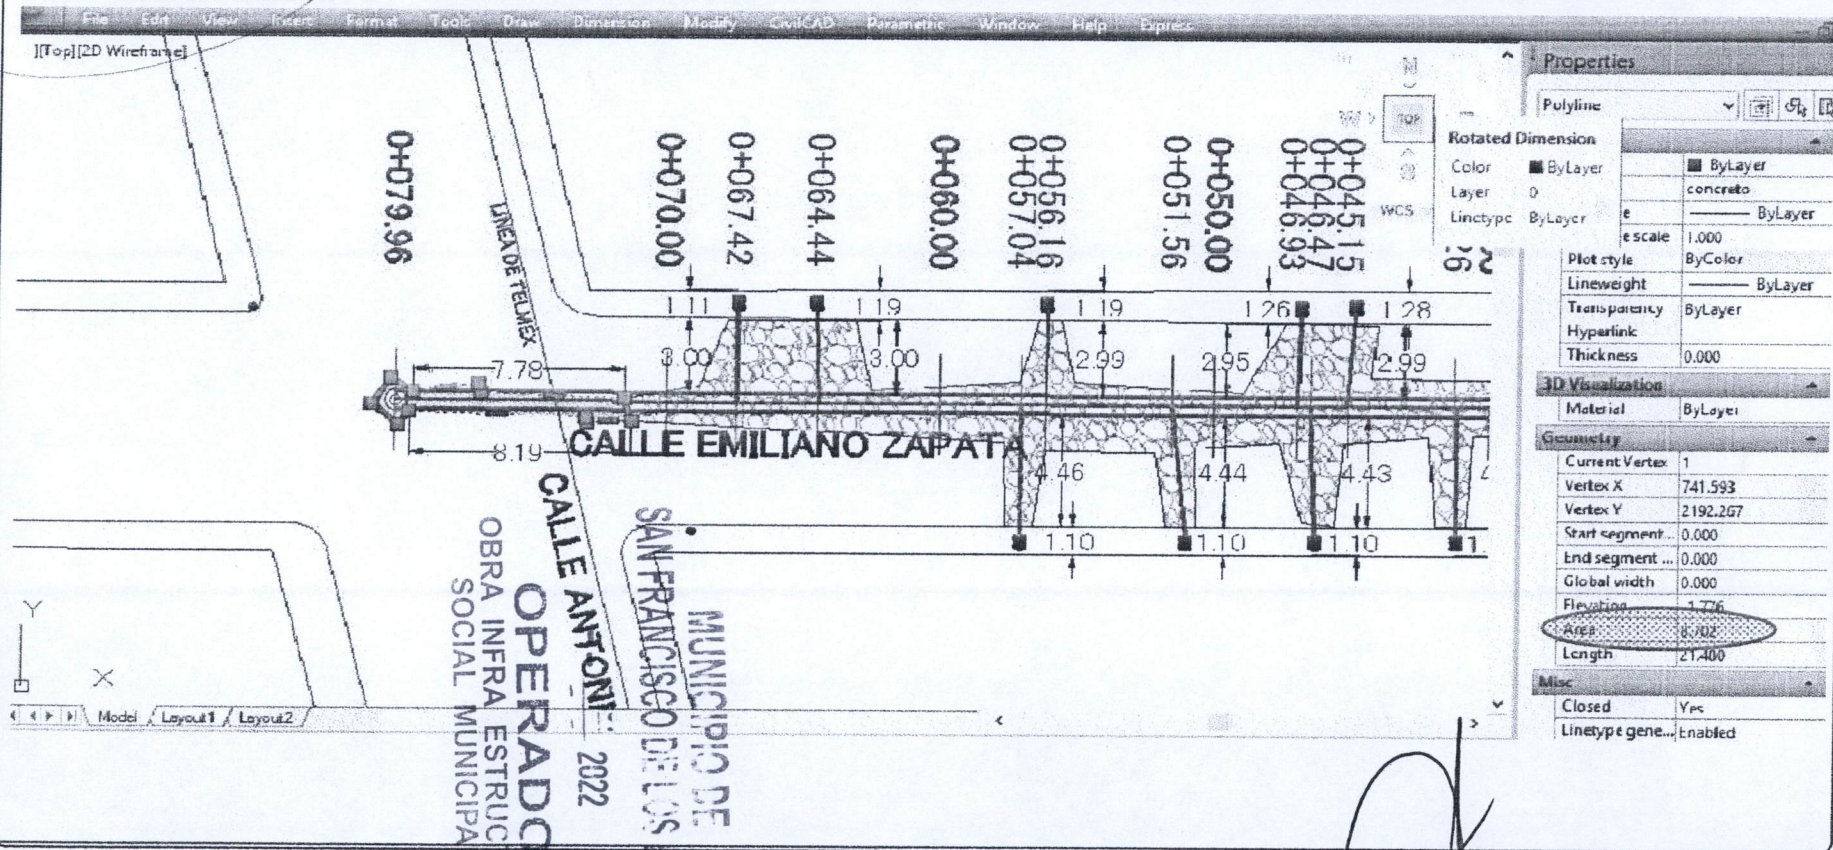

OBSERVACIONES :

SUPERINTENDENTE DE OBRA
 GRUPO CONSTRUCTOR MED CER S.A DE C.V.
 NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA

RESIDENTE DE OBRA
 Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
 C. FERNANDO LUNA MEDINA

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA
PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.



NO. DE OBRA: FSMDF 008/2022
NO. DE CONTRATO: FSMDF 006-008-009-026/2022
DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE EMILIANO ZAP
UBICACIÓN: LA CONCEPCION, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.

NUMEROS GENERADORES

ESTIMACION No. 1

FOTOGRAFIA

DESCRIPCION DE CONCEPTO

CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE DIAMANTE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=38KG/CM2, TMA 1 1/2", RESISTENCIA RÁPIDA A LOS 7 DÍAS, DE 16 CM DE ESPESOR Y 1.50 M POR LADO. INCLUYE: FOAMTECH DE 15CMX1/2", ARMADO CON VARILLA DEL No. 3 A CADA 15 CM, ARMEX 1515-4, PELO DE ANGEL 900 GRAMOS M3, TAPA Y BROCAL DE POLIETILENO PARA TRÁFICO PESADO, CORTE 1/3 DE ESPESOR , A CADA



OBSERVACIONES :

SUPERINTENDENTE DE OBRA
GRUPO CONSTRUCTOR MED CER S.A DE C.V.
NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA

RESIDENTE DE OBRA
Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
T.C. FERNANDO LUNA MEDINA



CONTRATO FISMDF 008/2022

OBRA FISMDF 008/2022
15 / Dic / 2022

Con fecha de hoy esta supervisión autoriza la estimación numero 2 (Dos Fiancitas) de la obra numero FISMDF 008/2022 de la empresa denominada Grupo Constructor Med Cer, S.A. de C.V. dicha estimación del contrato de esta obra, bajo las siguientes características:

- Periodo del 18 al 29 de Septiembre 2022
- Entrega de generadores 24 de Octubre 2022
- Monto base \$ 90,465.12
- Amortización de Anticipo \$ 0.00
- Total de retenciones \$ 904.68
- Total a pagar \$ 104,034.88

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
-- 2022
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

Dirección de
OBRAS PÚBLICAS



Ayuntamiento de
**SAN FRANCISCO
DE LOS ROMO**

2021 + 2024



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN
FRANCISCO DE LOS ROMO
No. Oficio: DOP/565/22
San Francisco de los Romo, Ags., 15 de diciembre de 2022
Asunto: LIBERACIÓN DE PAGO

2278

C.P. MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
PRESENTE

Por medio del presente le remito la documentación de la estimación No. 2 (de Finiquito), para que se realicen los trámites necesarios para su pago.

No. de Obra: FIS MDF 008/2022

Nombre de la Obra: REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE ANTONIO RODRIGUEZ A LIMITE NORTE

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal

Contratista: GRUPO CONSTRUCTOR MED CER, S.A. DE C.V. (GCM120227RL6)

Contrato: FIS MDF 008/2022 No Factura: 981

Objeto del Contrato: REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE ANTONIO RODRIGUEZ A LIMITE NORTE, CONCEPCION EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

Monto del Contrato: \$417,501.93 (CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS UN PESOS 93/100 M.N.)

Monto a Pagar: \$104,034.88 (CIENTO CUATRO MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 88/100 M.N.)

Así mismo le solicito que una vez termiando dicho trámite se nos haga llegar el auxiliar contable .

Sin otro particular de momento, me es grato enviarle un cordial saludo agradeciendo de antemano las atenciones al presente.

ATENTAMENTE

ING. JOSE DE JESUS CHAVEZ GARCIA
DIRECTOR DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
-- 2022
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

C.c.p. Archivo

Av. Benito Juárez S/N, Rancho La Trinidad,
San Francisco de los Romo, Ags. Tel: (465) 967 0124 ext. 1654
