



Usr: SuSaNa
Rep: rptPoliza

Municipio de San Francisco de los Romo
ESTADO DE AGUASCALIENTES

Póliza: C05714 Del 28/12/2022



Fecha y hora de Impresión | 29/dic./2022 06:03 p. m.
Página | 1

Concepto: FISM 2022 PAGADO EST 3 FINIQUITO OBRA FISMDF 010/2022 CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA PR. GP Folio: 458

Beneficiario: **JORGE ARMANDO QUEZADA SOTELO**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-2501-K035-J04-61402-2	CONSTRUCCIÓN Y/O	\$749.50		GP Folio: 458
0002	8260-2501-K035-J04-61402-2	CONSTRUCCIÓN Y/O		\$749.50	GP Folio: 458
0003	2113-000715	JORGE ARMANDO QUEZADA	\$749.50		GP Folio: 458
0004	1112-003-002	Bancomer Cta. 011793039-9 FISM		\$743.02	GP Folio: 458
0005	2117-9-005-001	0.1% COLEGIO DE		\$0.65	FISM 2022 PAGADO EST 3 FINIQUITO OBRA FISMDF 010/2022
0006	2117-9-005-002	0.2% ORGANO SUPERIOR DE		\$1.29	FISM 2022 PAGADO EST 3 FINIQUITO OBRA FISMDF 010/2022
0007	2117-9-005-003	0.2% INST. DE CAPACIT. DE LA		\$1.29	FISM 2022 PAGADO EST 3 FINIQUITO OBRA FISMDF 010/2022
0008	2117-9-005-004	0.5% CONTRALORIA MUNICIPAL		\$3.25	FISM 2022 PAGADO EST 3 FINIQUITO OBRA FISMDF 010/2022
Sumas iguales =>			<u>1,499.00</u>	<u>1,499.00</u>	

**MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**

-- 2022

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL



Fecha y hora de consulta

28/12/2022 6:29:23 PM

Contrato

00796395

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO
DE LOS ROMO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: EST 3 FI FIS MDF 010

Importe de la operación: 743.02 MXP

Cuenta de retiro: 0117930399

Cuenta de depósito: 030010900006125078

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO
DE LOS ROMOTitular de la cuenta: JORGE ARMANDO QUEZADA
SOTELO

Nombre banco destino: BAJIO

Fecha valor: 29/12/2022

Fecha de creación: 28/12/2022

Fecha de aplicación: 28/12/2022

Concepto de pago: PAGO EST 3 FIN FIS MDF 11-010

Referencia numérica: 281222

Instrumento de seguridad: ASD 6550927880

Hora de captura en el canal: 18:29:17

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000554001

Clave de rastreo: 002601002212290000554001

Folio de firma: 0009382107

Folio único: 1401202212281829170009382113

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	28/12/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	28/12/2022



EMISOR: JORGE ARMANDO QUEZADA SOTELO

R.F.C.: QUSJ71112IE8

REGIMEN: PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

BLVD. JUAN PABLO II 1096 C CANTERAS DE SANTA IMELDA AGUASCALIENTES

AGUASCALIENTES MEXICO C.P. 20218

JORGE ARMANDO QUEZADA SOTELO

URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL

R.F.C. QUSJ71112IE8

BLVD. JUAN PABLO II No. 1096 Int: C COLONIA CANTERAS DE SANTA IMELDA
C.P. 20218 AGUASCALIENTES, AGS.

RP - 3

CFDI versión 3.3 Complemento de Recepción de Pagos

Tipo de comprobante: P - Pagos

Expedido en el código postal: 20218

Uso de CFDI: P01 - Por definir

Cliente: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

R.F.C.: MSF920130TQ9

Domicilio: FCO ROMO JIMENEZ 102 SAN JOSE DE BUENA VISTA San Francisco de los
Romo Aguascalientes México C.P. 20300 Tel.

#	Cantidad	Unidad	ClaveProdServ	Descripción	Descuento	Precio	Importe
1	1	ACT	84111506	Pago	0.00	0.00	0.00

Complemento de Recepción de Pagos

Fecha de Pago: 2022-12-28 T 12:00:00

Moneda:MXN

RFC Emisor Cta. Ordenante:

RFC Emisor Cta. Ben.:

Cert. Pago:2601002212290000554001

Cadena Pago:554001

Forma de Pago:03 - Transferencia electrónica de fondos

Tipo de Cambio \$:1.0000

Nom. Banco Ordenante:BANCOMER

Cta. Beneficiario:030010900006125078

Sello Pago:002601002212090000548967

Monto Total del Pago \$:743.04

Número de Operación:281222

Num. Cta. Ordenante:0117930399

Tipo Cad. Pago:01

#	UUID	Folio	Moneda	Tipo Cambio	M. de Pago	Parcialidad	Saldo Ant.	Saldo Nuevo	Pago
1	9cee2e44-e6fb-41e8-86ff-fd89514eeeb0	A - 384	MXN	1.0000	PPD	1	743.04	0.00	743.04



MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
-- 2022
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

CANTIDAD CON LETRA:
CERO PESOS 00/100 M.N.

TOTAL \$ 0.00

MONEDA: XXX

TIPO DE CAMBIO: N/A

CERTIFICADO EMISOR: 00001000000501868902

CERTIFICADO S.A.T.: 00001000000509846663

FECHA Y HORA DE TIMBRADO: 2022-12-29 10:09:26

FOLIO FISCAL: d162fac1-2380-4846-8fe6-7370beca4b7f



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|d162fac1-2380-4846-8fe6-7370beca4b7f|2022-12-29T10:09:26|LSO1306189R5LH/H/MA+DYpDibS63nS7dJWLgQul6dBwJhiWAm5DYHhCGN5BQK+ObmlWvUPNpSZ5+swvEiHL
Sbx7cCqyq6kuLeF2Pvx4e4y0wwQdFomS5wV2tsX4/gkRM9B6LQ4fzEDUAcn8HUWVZgpFzIWoC7Z+MDMFN2QCmH/kFSo7zuRAJTFVIG1ObGJMcmf2j58QNeA6TtoPdJec9XHYQLNFU
R9CHEvug3YRepyboou7FbUadSINNUzYJkzluHEwFgXfe3QPfO0rq5HcFlmbdjKITnGNisLkivZsF1NV3HEqWLMJMWwNCLmuQaOsXw3Qhy8YYKurLiQKN7p1i2ALTslxDpA==|0000
1000000509846663|

Sello Digital

I+H/MA+DYpDibS63nS7dJWLgQul6dBwJhiWAm5DYHhCGN5BQK+ObmlWvUPNpSZ5+swvEiHLsbx7cCqyq6kuLeF2Pvx4e4y0wwQdFomS5wV2tsX4/gkRM9B6LQ4fzEDUAcn8HUWV2
gpFzIWoC7Z+MDMFN2QCmH/kFSo7zuRAJTFVIG1ObGJMcmf2j58QNeA6TtoPdJec9XHYQLNFUR9CHEvug3YRepyboou7FbUadSINNUzYJkzluHEwFgXfe3QPfO0rq5HcFlmbdjKITn
GNisLkivZsF1NV3HEqWLMJMWwNCLmuQaOsXw3Qhy8YYKurLiQKN7p1i2ALTslxDpA==

Sello Digital del SAT

OrL.CJzm8NmrWRgfGn6WSXXUngjt+xWuapxopvReVOxoOwU1E1X6RkA8EykPaAHKBPrPLvU7dkQgLhhXkaJH8PcyCL+wxZNO8PGdD1Yh7h9dFYlqxpmuL74BkkJg5nI0FobEOKB
xWUvWpFcfJOLoRi07AZUailwTJBIZuTA1G1KAvUQC0z1AsG9k7dTz8JeUCP+c08pUJ78GwV3pqGWPfPIDgGrAdN3gdz1tg4zWIF1yALEHvDvq8f4MKS6PXRohs81LFB4U1pT71
ccn1IZHEuYjgYaVkmFLJERNLwaprPUXz29CqPpc4WzwcuwacFDBEYU3Klka0w==

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="UYXr13NLlgZFvJM7FlwMhmz14Cpo0T4jetzydnQgLdrHJ0KUZILXg6K5HORSmmsg9CCnDlyABK16BGH6548gEzg4Rrnv6/V5zU0veo+ZazubBMj+dwX
Certificado="MIIF7TCCA9WgAw1BAG1UMDAwMDEwMDAwMDA1MDE4Njg5MDIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbBVRPUkECC
LugarExpedicion="20218" TipoDeComprobante="P" Total="0" Moneda="XXX" SubTotal="0" NoCertificado="00001000000501868902" Fecha="2022-12-29T10:02:15"
Folio="2" Serie="RP" Version="3.3" xmlns:pago10="http://www.sat.gob.mx/Pagos" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/Pagos
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pagos/Pagos10.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="612" Nombre="JORGE ARMANDO QUEZADA SOTELO" Rfc="QUSJ711112IE8"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO" Rfc="MSF920130TQ9" UsoCFDI="P01"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="0" ValorUnitario="0" Descripcion="Pago" ClaveUnidad="ACT" Cantidad="1" ClaveProdServ="84111506"/>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Complemento>
    - <pago10:Pagos Version="1.0">
      - <pago10:Pago CtaOrdenante="0117930399" Monto="15810.70" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="03" FechaPago="2022-12-28T12:00:00">
        <pago10:DoctoRelacionado Folio="386" Serie="A" ImpSaldoInsoluto="0.00" ImpPagado="15810.70" ImpSaldoAnt="15810.70" NumParcialidad="1"
        MetodoDePagoDR="PPD" MonedaDR="MXN" IdDocumento="db625f33-3c2c-4f39-b73e-e3beda8f71e2"/>
      </pago10:Pago>
    </pago10:Pagos>
  </cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
  instance" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital">
    SelloSAT="EsYfiAmV9xNwpKi8sYbb98xTQaBDv36VDXDgixy5QYsDfGamh7h0wEFjegMPCuw7kpeSCwij3NSffUn7iG7TXUCKlvFDx3VWp8hEr
    NoCertificadoSAT="00001000000509846663"
    SelloCFD="UYXr13NLlgZFvJM7FlwMhmz14Cpo0T4jetzydnQgLdrHJ0KUZILXg6K5HORSmmsg9CCnDlyABK16BGH6548gEzg4Rrnv6/V5zU0ve
    RfcProvCertif="LSO1306189R5" FechaTimbrado="2022-12-29T10:02:18" UUID="1296a086-7fda-42f3-a9b4-ad92552edf16"/>
  </tfd:TimbreFiscalDigital>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO


-- 2022

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

CÉDULA DE SEGUIMIENTO A ESTIMACIONES DE OBRA

Ayuntamiento de
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
2021 • 2024



DATOS GENERALES

CONTRATISTA: <u>JORGE ARMANDO QUEZADA SUZUIO</u>	N° DE CONTRATO: <u>FISMDF 010/2022</u>
SUPERVISOR: <u>J. JESÚS HERNÁNDEZ FUENTES</u>	N° DE OBRA: <u>FISMDF 010/2022</u>
OBRA: <u>CONST. DE RED DE ALCANTARILLO EN LA PIZU. EDMUNDO GÁMEZ ORZCO</u>	N° DE FACTURA:
FECHA DE CORTE: <u>DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPT. 2022</u>	N° DE ESTIMACION: <u>#3 Y FINIQUITO</u>
	IMPORTE LIQUIDO: <u>743.04</u>

FORMATO DE NUMEROS GENERADORES

INGRESO	REVISIÓN	NOTA	CAPTURA EN SISTEMA	ENTREGA DE PRE-FACTURA
3 Oct 22 CONTRATISTA	<u>20 OCT. 2022</u> SUPERVISOR	<i>Sr. contratista regrese esta cédula con la estimación original de lo contrario no se le dara tramite</i>	<u>29 oct. 2022</u> SUPERVISOR	<u>29 OCT. 2022</u> SUPERVISOR

FORMATO DE ESTIMACION

INGRESO	REGISTRO	SUPERVISOR		JEFE DE DEPARTAMENTO
16 Dic. 22 CONTRATISTA	<u>16 12 22</u> <u>16 12 22</u> CONTROL DE ESTIMACIONES	<u>16 DIC 2022</u> RECIBIDO	<u>16 DIC 2022</u> AUTORIZADO	ARQ. ALFREDO FLORES MARMOLEJO <u>16 12 22</u> <u>16 12 22</u> RECIBIDO AUTORIZADO

DEVOLUCIÓN	CONTENIDO	DIRECTOR GENERAL
FECHA DE DEVOLUCIÓN: <u>20 oct. 2022</u>	CÁRATULA	ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA
FECHA DE REINGRESO: <u>16 DIC 2022</u>	RESUMEN	<u>16 12 22</u> <u>16 12 22</u>
MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN:	CONCEPTOS	RECIBIDO AUTORIZADO
- CROQUIS	ESTADO DE CUENTA	
- FOTOS	CONCENTRADO DE CONCEPTOS (FIN)	
	GENERADORES Y RESUMEN	
	CROQUIS	
	FOTOGRAFÍAS	
	ANÁLISIS PRECIO UNITARIO	
	REPORTE(S) DE LABORATORIO	
	FIANZA(S) (FIN)	
	NOTA DE BITACORA DE OBRA	

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

TRÁMITE DE PAGO - 2022			OFICIO DE LIBERACIÓN			FECHA DE ENTREGA
3	10	22	16	12	22	
DÍA:	MES:	AÑO:	DÍA:	MES:	AÑO:	DIRECCIÓN DE EGRESOS.

OPERADO
OBRA INTERNA ESTRUCTURA
SOCIA MUNICIPALES

PRE-FACTURA De Cierre



PRE-FACTURA DEL CONTRATISTA: JORGE ARMANDO QUEZADA SOTELO (012)

A NOMBRE DE: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 RFC: MSF920130TQ9
 DIRECCION: FCO ROMO JIMENEZ 102, SAN JOSE DE BUENAVISTA, SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS,
 CIUDAD: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE L ESTADO: AGUASCALIENTES

DESCRIPCION

PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 Del 01 Ago 2022 al 29 Sep 2022		MONTO BASE	\$646.12	
DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA PRIVADA EDMUNDO GÁMEZ OROZCO ENTRE LA CALLE EDMUNDO GÁMEZ OROZCO Y LIMITE SUR	AJUSTE DE COSTOS (+)	\$0.00	
		AMORTIZACION DE ANTICIPO (-)	\$0.00	
UBICADA EN:	LA ESCONDIDA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.	SUBTOTAL	\$646.12	
CON AMPARO DEL CONTRATO No.:	FISMDF 010/2022	IVA (+)	\$103.38	
DE FECHA::	18/07/2022	SUBTOTAL CON IVA	\$749.50	
BAJO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA:				
Inversion	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal 2022			
Programa	SD ALCANTARILLADO			
SubPrograma	03 CONSTRUCCION			
Obra.	FISMDF 010/2022 CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA PRIVADA EDMUNDO GÁMEZ OROZCO ENTRE LA CA			
Localizacion	LA ESCONDIDA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.			
	CAPACITACION DE LOS TRABAJADORES DEL CONTRATISTA	\$1.29 (0.20%)	TOTAL DE RETENCIONES (-)	\$6.46
	COLEGIOS DE PROFESIONISTAS SEGUN CORRESPONDA	\$0.65 (0.10%)	SANCION POR RETRASO (-)	\$0.00
	SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	\$0.00 (0.00%)	SUBTOTAL MENOS RETENCIONES	\$743.04
	FISCALIZACION DEL H. CONGRESO DEL ESTADO	\$1.29 (0.20%)	RETENCION POR RETRASO(-)	\$0.00
	INSPECCION DE VIGILANCIA PARA LA CONTRALORIA	\$3.23 (0.50%)	REINTEGRO POR RETENCION	\$0.00
Avance Fisico Real %	SERVICIOS RELATIVOS ALAS CONSTRUCCIONES	\$0.00	OTRAS SANCIONES(-)	\$0.00
Avance Fisico Proaramado 100.00%		\$6.46	TOTAL A PAGAR	\$743.04
Fecha Terminación Prog.	16/09/2022	SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 4/100 M.N.		

**MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
 --- 2022
**OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL**

ESTADO DE CUENTA

Obra.	FISMDF 010/2022 CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA PRIVADA EDMUNDO GÁMEZ OROZCO ENTRE LA CALLE EDMUNDO GÁMEZ OROZCO Y LIMITE SUR	Total Contrato	169,246.33
Localizacion	LA ESCONDIDA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.	Total Ampliaciones	749.50
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura So	Total Contratado	169,995.83
Programa	SD ALCANTARILLADO	Anticipo (%)	84,623.17
SubPrograma	03 CONSTRUCCION	Estimado Anterior	169,246.33
Contratista	JORGE ARMANDO QUEZADA SOTELO (012)	Esta Estimacion	749.50
Contrato	FISMDF 010/2022 CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA PRIVADA EDMUNDO GÁMEZ OROZCO ENTRE LA CALLE EDMUNDO GÁMEZ OROZCO Y LIMITE SUR	Total Estimado	169,995.83
Estimacion No.	3 Del 01 Ago 2022 al 29 Sep 2022	Total por Estimar	0.00

No. Estimac.	Periodo	Importe Estimacion	Amortizacion de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA (+)	Cargo a la Obra	DEDUCCIONES (-)						Retencion (-)	Reintegro (+)	Sanciones (-)	Importe a Pagar
							CMIC(0)	Cgio.Prof.(0)	SFP(0.5)	Cono. Edo.(0.2)	Municipal	ISRuOtro(0)				
Anticipo				72,951.01	11,672.16	84,623.17										84,623.17
1	Del 01 Ago 2022 al 29 Sep	80,774.49	40,387.25	32,563.76	6,461.96	46,849.20	161.55	80.77	0.00	161.55	403.87	0.00	0.00	0.00	0.00	46,041.46
2	Del 01 Ago 2022 al 29 Sep	65,127.52	32,563.76	0.00	5,210.20	37,773.96	130.26	65.13	0.00	130.26	325.64	0.00	0.00	0.00	0.00	37,122.67
3	Del 01 Ago 2022 al 29 Sep	646.12	0.00	0.00	103.38	749.50	1.29	0.65	0.00	1.29	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	743.04
TOTALES		146,548.13	72,951.01		23,447.70	169,995.83	293.10	146.55	0.00	293.10	732.74	0.00	0.00	0.00	0.00	168,530.34

(Handwritten signature/initials)

(Handwritten signature)

**MUNICIPIO DE
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
 --- 2022
OPERADO
 OBRA INFRA ESTRUCTURA
 SOCIAL MUNICIPAL

RESUMEN DE ESTIMACION

Obra.	FISMDF 010/2022 CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA PRIVADA EDMUNDO GÁMEZ OROZCO ENTRE LA CALLE EDMUNDO GÁMEZ OROZCO Y LIMITE SUR	Total Contrato	\$169,246.33
Localización	LA ESCONDIDA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.	Total Ampliaciones	\$749.50
Fuente Financ.		Total Contratado	\$169,995.83
Programa	SD ALCANTARILLADO	Anticipo (50)%	\$84,623.17
SubPrograma	03 CONSTRUCCION	Estimado Anterior	\$169,246.33
Supervisor	J. JESÚS HERNÁNDEZ FUENTES (HEFJ7112011W6)	Esta Estimacion	\$749.50
Contratista	JORGE ARMANDO QUEZADA SOTELO (012)	Total Estimado	\$169,995.83
Contrato	FISMDF 010/2022 CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA PRIVADA EDMUNDO GÁMEZ OROZCO ENTRE LA CALLE EDMUNDO GÁMEZ OROZCO Y LIMITE SUR	Saldo por Estimar	\$0.00
Estimacion No.	3 (De Cierre)		
Recibí de	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO la Cantidad de:		\$749.50 SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.

GRUPO PARTIDA

* EXTRAORDINARIOS

\$646.12

- EXTRAORDINARIOS

\$646.12

Fecha Terminación Prog.

SUMA

\$646.12

AJUSTE DE COSTOS (+)

\$0.00

AMORTIZACION DE ANTICIPO (-)

\$0.00

SUBTOTAL

\$646.12


IVA (+)

\$103.38

SUBTOTAL CON IVA

\$749.50

**MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**



JORGE ARMANDO QUEZADA SOTELO (QUSJ71112IE8)

Contratista



INGENIERO J. JESÚS HERNÁNDEZ FUENTES
(HEFJ7112011W6)
SUPERVISOR DE OBRA

2022

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

CONCEPTOS DE ESTIMACION

De Cierre



Obra.	FISMDF 010/2022 CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA PRIVADA EDMUNDO GÁMEZ OROZCO ENTRE LA CALLE EDMUNDO GÁMEZ OROZCO Y LIMITE SUR LA ESCONDIDA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.				Total Contrato	\$169,246.33
Localizacion					Total Ampliaciones	\$749.50
Fuente Financ.					Total Contratado	\$169,995.83
Programa	SD ALCANTARILLADO				Anticipo (50)%	\$84,623.17
SubPrograma	03 CONSTRUCCION				Estimado Anterior	\$169,246.33
Supervisor	J. JESÚS HERNÁNDEZ FUENTES (HEFJ7112011W6)				Esta Estimacion	\$749.50
Contratista	JORGE ARMANDO QUEZADA SOTELO (012)				Total Estimado	\$169,995.83
Contrato	FISMDF 010/2022 CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA PRIVADA EDMUNDO GÁMEZ OROZCO ENTRE LA CALLE EDMUNDO GÁMEZ OROZCO Y LIMITE SUR Del 01 Ago 2022 al 29 Sep 2022				Saldo por Estimar	\$0.00
Estimacion No.	3 (De Cierre)					
Recibí de	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO		la Cantidad de:		\$749.50 SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.	

No.	Concepto	Unid. Med	Volumen					Precio Contratado	Importe
			Contratado	Acumulado	Anterior	Actual	Excedente		

GRUPO: **EXTRAORDINARIOS**

PARTIDA: **EXTRAORDINARIOS**

30	*SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO DE 9 MTS. DE AL TURA, INCLUYE: POSTE DE CONCRETO REFORZADO ADOCFE9C-400 DE 9 MTS. DE AL TURA, FLETE DEL MISMO, EXCAVACIÓN EN CEPAA 1.40 MTS DE PROFUNDIDAD Y CON UN DIAMETRO DE 0.50 MTS., GRUA PARA REALIZAR MANIOBRA, RELLENO CON PRODUCTO DE EXCAVACIÓN PLOMEADO, NIVELADO DEL POSTE, LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO.*	PZA	0.00	2.00	1.95	0.05	2.00	\$13,058.91	\$646.12
								Total Partida	\$646.12
								Total Grupo	\$646.12
								Total Presupuestado	\$646.12
								Ajuste de Costos	\$0.00
								Total	\$646.12

**MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**

-- 2022

**OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL**

JORGE ARMANDO QUEZADA SOTELO (QUSJ711121E8)

CONTRATISTA

INGENIERO J. JESÚS HERNÁNDEZ FUENTES
(HEFJ7112011W6)
SUPERVISOR DE OBRA

CONCENTRADO DE ESTIMACIONES

Obra. CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA PRIVADA EDMUNDO GÁMEZ OROZCO ENTRE LA CALLE EDMUNDO GÁMEZ
 Localización LA ESCONDIDA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
 Supervisor INGENIERO J. JESÚS HERNÁNDEZ FUENTES (HEFJ7112011W6)
 Contratista JORGE ARMANDO QUEZADA SOTELO (012)
 Contrato FISDMF 010/2022


Total Contrato \$169,246.33
 Total Ampliaciones \$749.50
 Total Contratado \$169,995.83
 Anticipo (50)% \$84,623.17
 Total Estimado \$169,995.83

No.	Concepto	Unid. Med.	Volumen Contratado	Importe Contratado	Volumen Estimac. 1	Volumen Estimac. 2	Volumen Estimac. 3	Volumen Estimac. 4	Volumen Estimac. 5	Volumen Estimac. 6	Volumen Exedente	Volumen Total	Importe Total
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA PRIVADA EDMUNDO GÁMEZ OROZCO ENTRE LA CALLE EDMUNDO													
RED DE ALCANTARILLADO													
1	SONDEO PARA LOCALIZACIÓN DE REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, TELEFÓNICAS Y/O ELÉCTRICAS EXISTENTES. I	SON DE	1.00	\$563.55	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	\$563.55
2	CORTE CON DISCO DIAMANTADO DE 14" EN PAVIMENTO Y/O BANQUETA EXISTENTE (HASTA 8.00 cm. DE PROFUNDIDA	m	10.00	\$27.86	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	10.30	\$286.96
3	DEMOLICION A MAQUINA DE PAVIMENTO (CONCRETO, ASFALTO Y/O EMPEDRADO) EXISTENTE Y/O BANQUETA (DE HAST	M3	1.00	\$367.07	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.24	0.76	\$278.97
4	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO. INCLUYE: EQUIPO TOPGRÁFICO NECESARIO	m	57.50	\$10.89	58.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	58.34	\$635.32
5	EXCAVACIÓN DE ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO II. INCLUYE: AFINE CON MAQUINA, MANO DE OB	M3	77.66	\$76.60	65.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12.35	65.31	\$5,002.75
6	CARGA Y ACARREO EN CAMION AL TIRADERO OFICIAL DE MATERIAL MIXTO AL TIRADERO OFICIAL, ZONA URBANA, S	M3	78.66	\$37.86	67.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11.28	67.38	\$2,551.01
7	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUE	M3/K M	314.64	\$14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-314.64	0.00	\$0.00
8	CAMA Y ACOSTILLADO CON GRAVA DE 3/4" CON UN ESPESOR DE 10 CM. INCLUYE: ACOMODADO Y COMPACTADO ASÍ C	M3	4.03	\$666.75	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04	3.99	\$2,660.33
9	RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM CON BAILARINA EN CAPAS DE HASTA 20 cm. DE ESPESOR.	M3	46.44	\$355.00	50.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.49	50.93	\$18,080.15
10	RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM CON BAILARINA EN CAPAS DE HASTA 20 cm. DE ESPESOR.	M3	8.05	\$358.37	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	8.87	\$3,178.74
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 8" (200 MM) DE DIÁMET	m	57.50	\$539.03	57.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.12	57.38	\$30,929.54
12	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN DE HASTA 2.00 m. DE PROFUNDIDAD A RASANTE HIDRAULICA. INC	pieza	2.00	\$15,295.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	\$0.00
DESCARGAS SANITARIAS													
13	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO. INCLUYE: EQUIPO TOPGRÁFICO NECESARIO	m	25.20	\$10.89	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6.50	18.70	\$203.64
14	EXCAVACIÓN DE ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO II. INCLUYE: AFINE CON MAQUINA, MANO DE OB	M3	19.13	\$76.60	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7.87	11.26	\$862.52
15	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II 0.00 A 2.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD	M3	4.78	\$463.95	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.58	1.20	\$520.74
16	CARGA Y ACARREO EN CAMION AL TIRADERO OFICIAL DE MATERIAL MIXTO AL TIRADERO OFICIAL, ZONA URBANA, S	M3	23.91	\$37.86	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11.45	12.46	\$471.74
17	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUE	M3/K M	95.64	\$14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-95.64	0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

2022

OPERADO
 OBRA INFRA ESTRUCTURA
 SOCIAL MUNICIPAL



18	RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM CON BAILARINA EN CAPAS DE HASTA 20 cm. DE ESPESOR.	M3	14.94	\$355.00	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7.80	7.14	\$2,534.70
19	RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM CON BAILARINA EN CAPAS DE HASTA 20 cm. DE ESPESOR.	M3	3.23	\$358.37	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.21	2.02	\$723.91
20	DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERÍA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 6" (150 MM) DE DIÁMETRO	pieza	6.00	\$1,320.28	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	\$7,921.68
21	DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERÍA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 6" (150 MM) DE DIÁMETRO	m	19.20	\$358.03	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10.25	8.95	\$3,204.37
22	REGISTRO SANITARIO DE 0.40X0.60X0.80 M (MEDIDAS INTERIORES) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO (14 CM DE ESPE	pieza	6.00	\$3,232.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6.00	0.00	\$0.00
23	LIMPIEZA FINAL , INCLUYE: BARRIDO CON AGUA , MATERIALES, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBR	M2	17.64	\$14.09	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6.01	11.63	\$163.87

INDIRECTOS NO EJECUTADOS

INDIRECTOS NO EJECUTADOS

24	Indirecto por administración de obra por el convenio de ampliación en monto por la cantidad de \$217	IN	0.00	\$219.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
----	--	----	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA PRIVADA EDMUNDO GÁMEZ OROZCO ENTRE LA CALLE EDMUNDO

RÉD DE ALCANTARILLADO

25	LIMPIEZA FINAL , INCLUYE: BARRIDO CON AGUA , MATERIALES, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBR	M2	0.00	\$14.09	0.00	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00	40.83	40.83	\$575.29
----	---	----	------	---------	------	-------	------	------	------	------	-------	-------	----------

EXTRAORDINARIOS

EXTRAORDINARIOS

26	REGISTRO SANITARIO DE 0.40X0.60X0.90 A 1.10 M (MEDIDAS INTERIORES) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO (14 CM	PZA	0.00	\$3,784.59	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	\$7,569.18
27	REGISTRO SANITARIO DE 0.40X0.60X1 .10 A 1.300 M (MEDIDAS INTERIORES) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO (14 C	PZA	0.00	\$4,373.24	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	\$8,746.48
28	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 1.95 m. DE PROFUNDIDAD A RASANTE HIDRAULICA. INCLUYE:	PZA	0.00	\$11,329.68	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	\$11,329.68
29	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 0.80 m. DE PROFUNDIDAD A RASANTE HIDRAULICA. INCLUYE:	PZA	0.00	\$5,014.17	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	\$5,014.17
30	*SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO DE 9 MTS. DE AL TURA, INCLUYE: POSTE DE CONCRETO RE	PZA	0.00	\$13,058.91	0.00	1.95	0.05	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	\$26,117.95
31	REGISTRO SANITARIO DE 0.40X0.60X0.70 A 0.90 M (MEDIDAS INTERIORES) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO (14 CM	PZA	0.00	\$3,210.44	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	\$6,420.88

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

-- 2022

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL



RESUMEN

ESTIMACION NUMERO #3

FECHA : _____

NOMBRE DE LA OBRA :

REHAB. DE ALCANT. EN CALLE DEL MONTE TRAMO C. FCO. PONCE Y C. MANUEL ALV. COL. MACARIO J. GOMEZ *REHAB. DE RED AGUA POT. EN CALLE DEL MONTE ENTRE LA C. FCO. PONCE Y C. MANUEL ALV. COL. MACARIO J. GOMEZ *CONST. RED ALCANT. EN LA PRIVADA EDMUNDO GAMEZ O. ENTRE CALLE EDMUNDO GAM. OROZ. Y LIM. SUR LA ESC.*CONST RED AGUA POT. PRIV. EDMUNDO GAM. OROZ. ENTRE LA CALLE EDMUNDO GAM. OROZ. Y LIM. SUR LA ESC.*CONST. RED ALCANT. EN CALLE JOSEFA ORT. DE DOM. ENTRE LA C. JACARANDA Y PRIV. JAIME NUNO AMAP. RIO*REHAB. DE ALCANT. EN C. JOSEFA ORT. DOM. ENTRE C. VENUST. CARRANZA Y C. JACARANDA EN AMAP. RIO*CONST. RED AGUA POT. CALLE JOSEFA ORT. DOM. ENTRE C. VENUST. CARRANZA Y PRIV. JAIME NUNO EN AMAPOLAS DEL RIO EN EL MPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EDO. AGUASCALIENTES

No. DE CONTRATO :

FISMDF-005-010-013-014-019-021-022/2022

No. DE OBRA :

FISMDF-005/2022, FISMDF/0010-202, FISMDF-0013/2022, FISMDF-0014/2022, FISMDF-0019/2022, FISMDF-0021/2022 Y FISMDF-0022/2022

IMPORTE DE CONTRATO :

\$171,417.76

FECHA DE INICIO REAL :

1 de agosto de 2022

FECHA DE INICIO VIGENTE (REPROGRAMACION SEGÚN ANTICIPO) :

1 de agosto de 2022

PLAZO DEL CONTRATO :

60 DIAS

FECHA DE TERMINO VIGENTE :

29 de septiembre de 2022

No. DE ESTIMACION :

NO 1

PERIODO

09.sep.22

AL

20.sep.22

AVANCE FISICO


AVANCE FINANCIERO


No.	DESCRIPCION	UNIDAD	ANTERIOR	ACTUAL	EXCEDENTE	ACUMULADO	PU.	IMPORTE
	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA PRIVADA EDMUNDO GÁMEZ OROZCO ENTRE LA CALLE EDMUNDO GÁMEZ OROZCO Y LIMITE SUR EN LA ESCONDIDA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES.							
	EXTRAORDINARIOS							
30	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO DE 9 MTS. DE AL TURA, INCLUYE: POSTE DE CONCRETO REFORZADO ADOCFE9C-400 DE 9 MTS. DE AL TURA, FLETE DEL MISMO.	PZA		1 0.05			\$ 13,058.91	\$ 13,058.91


2022
OPERADO
 OBRA INFRA ESTRUCTURA
 SOCIAL MUNICIPAL

SUB-TOTAL \$ 13,058.91
 16 % IVA \$ 2,089.43
TOTAL \$ 15,148.34

OBSERVACIONES:



ING JORGE ARMANDO QUEZADA SOTELO
ADMINISTRADOR UNICO


I.C. J JESUS HERNANDEZ FUENTES
Residente
Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco
de los Romo


Jefe Departamento de Supervisión
FIRMA

ING. JOSE DE JESUS CHAVEZ GARCIA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MPIO. DE SAN.
FCO. DE LOS ROMO

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
-- 2022
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL



JORGE ARMANDO QUEZADA SOTELO
INGENIERO CIVIL

URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL
Blvd. Juan Pablo II No. 1066 - C. Col. Cañadas de Santa Isabella C.P. 20218 Aguascalientes, Agt.
Tel. Y Fax: 01 (449) 293-33-75 e-mail: quezadasotelo@hotmail.com

NO. DE OBRA: FISMDF-005/2022, FISMDF/0010-202, FISMDF-0013/2022, FISMDF-0014/2022, FISMDF-0019/2022, FISMDF-0021/2022 Y FISMDF-0022/2022

NO. DE CONTRATO: FISMDF-005-010-013-014-019-021-022/2022

NOMBRE DEL CONTRATO :REHAB. DE ALCANT. EN CALLE DEL MONTE TRAMO C. FCO. PONCE Y C. MANUEL ALV. COL. MACARIO J. GOMEZ *REHAB. DE RED AGUA POT. EN CALLE DEL MONTE ENTRE LA C. FCO. PONCE Y C. MANUEL ALV. COL. MACARIO J. GOMEZ *CONST. RED ALCANT. EN LA PRIVADA EDMUNDO GAMEZ O. ENTRE CALLE EDMUNDO GAM. OROZ. Y LIM. SUR LA ESC.*CONST. RED AGUA POT. PRIV. EDMUNDO GAM. OROZ. ENTRE LA CALLE EDMUNDO GAM. OROZ. Y LIM. SUR LA ESC.*CONST. RED ALCANT. EN CALLE JOSEFA ORT. DE DOM. ENTRE LA C. JACARANDA Y PRIV. JAIME NUNO AMAP. RIO*REHAB. DE ALCANT. EN C. JOSEFA ORT. DOM. ENTRE C. VENUST. CARRANZA Y C. JACARANDA EN AMAP. RIO*CONST. RED AGUA POT. CALLE JOSEFA ORT. DOM. ENTRE C. VENUST. CARRANZA Y PRIV. JAIME NUNO EN AMAPOLAS DEL RIO EN EL MPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EDO. AGUASCALIENTES



Ayuntamiento de
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
2021 • 2024

PERIODO DE EJECUCION : 60 DIAS

INICIO : 01/08/2022 TERMINO: 29/09/2022

PERIODO DE LA ESTIMACION :

UBICACIÓN: PRIMER TRAMO:

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES.

ESTIMACION NO. 003

No.	CONCEPTO	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO		OBSERVACIONES
		EJE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	TOTAL	
30	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO DE 9 MTS. DE AL TURA, INCLUYE: POSTE DE CONCRETO REFORZADO ADOCFE9C-400 DE 9 MTS. DE AL TURA, FLETE DEL MISMO, EXCAVACIÓN EN CEPA A 1.40 MTS DE PROFUNDIDAD Y CON UN DIAMETRO DE 0.50 MTS., GRUA PARA REALIZAR MANIOBRA, RELLENO CON PRODUCTO DE EXCAVACIÓN PLOMEADO, NIVELADO DEL POSTE, LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO."	RED DE ALCANTARILLADO . CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA PRIVADA EDMUNDO GÁMEZ OROZCO ENTRE LA CALLE EDMUNDO GÁMEZ OROZCO Y LIMITE SUR EN LA ESCONDIDA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES.									
		POSTE B						4	1.00		
										1.00	PZAS
											EN ESTA ESTIMA- CION SE PAGA EL EQUIVALENTE A 0.05 PZA DE PUS- TE DE CONCRETO Y CON ELLO CUBRI- MOS LA AMPLIACION EN MONTO
										0.05	✓

CONTRATISTA

ING. JORGE ARMANDO QUEZADA SOTELO

Nombre y firma.


OPERADO

OBRA INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo

I.C. J JESUS HERNANDEZ FUENTES

Nombre y firma.



JORGE ARMANDO QUEZADA SOTELO

INGENIERO CIVIL

URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL
Blvd. Juan Pablo II No. 1008 - C. Col. Carreteras de Santa Inés C.P. 26048 Aguascalientes, Ags.
Tel. Y Fax. 01 (469) 263-33-76, e-mail: quezadasotelo@hotmail.com

NO. DE OBRA: FISDMF-005/2022, FISDMF/0010-202, FISDMF-0013/2022, FISDMF-0014/2022, FISDMF-0019/2022, FISDMF-0021/2022 Y FISDMF-0022/2022

NO. DE CONTRATO: FISDMF-005-010-013-014-019-021-022/2022

NOMBRE DEL CONTRATO :REHAB. DE ALCANT. EN CALLE DEL MONTE TRAMO C. FCO. PONCE Y C. MANUEL ALV. COL. MACARIO J. GOMEZ *REHAB. DE RED AGUA POT. EN CALLE DEL MONTE ENTRE LA C. FCO. PONCE Y C. MANUEL ALV. COL. MACARIO J. GOMEZ *CONST. RED ALCANT. EN LA PRIVADA EDMUNDO GAMEZ O. ENTRE CALLE EDMUNDO GAM. OROZ. Y LIM. SUR LA ESC.*CONST RED AGUA POT. PRIV. EDMUNDO GAM. OROZ. ENTRE LA CALLE EDMUNDO GAM. OROZ. Y LIM. SUR LA ESC.*CONST. RED ALCANT. EN CALLE JOSEFA ORT. DE DOM. ENTRE LA C. JACARANDA Y PRIV. JAIME NUNO AMAP. RIO*REHAB. DE ALCANT. EN C. JOSEFA ORT. DOM. ENTRE C. VENUST. CARRANZA Y C. JACARANDA EN AMAP. RIO*CONST. RED AGUA POT. CALLE JOSEFA ORT. DOM. ENTRE C. VENUST. CARRANZA Y PRIV. JAIME NUNO EN AMAPOLAS DEL RIO EN EL MPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EDO. AGUASCALIENTES



Ayuntamiento de
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
2021 • 2024

PERIODO DE EJECUCION :

60 DIAS

INICIO :

01/08/2022

TERMINO:

29/09/2022

PERIODO DE LA ESTIMACION :

UBICACIÓN:

PRIMER TRAMO:


MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES.

E S T I M A C I O N NO. 003

No.	CONCEPTO	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO		OBSERVACIONES
		EJE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	TOTAL	

30	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO DE 9 MTS. DE AL TURA, INCLUYE: POSTE DE CONCRETO REFORZADO ADOCFE9C-400 DE 9 MTS. DE AL TURA, FLETE DEL MISMO, EXCAVACIÓN EN CEPA A 1.40 MTS DE PROFUNDIDAD Y CON UN DIAMETRO DE 0.50 MTS., GRUA PARA REALIZAR MANIOBRA, RELLENO CON PRODUCTO DE EXCAVACIÓN PLOMEADO, NIVELADO DEL POSTE, LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO."									
----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ESTE PLANO CONTIENE PLANOS DEFINITIVOS DEL CONTRATO FISDMF 010/2022 :
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA PRIVADA EDMUNDO GÁMEZ OROZCO ENTRE LA CALLE EDMUNDO GÁMEZ OROZCO Y LIMITE SUR EN LA ESCONDIDA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES.

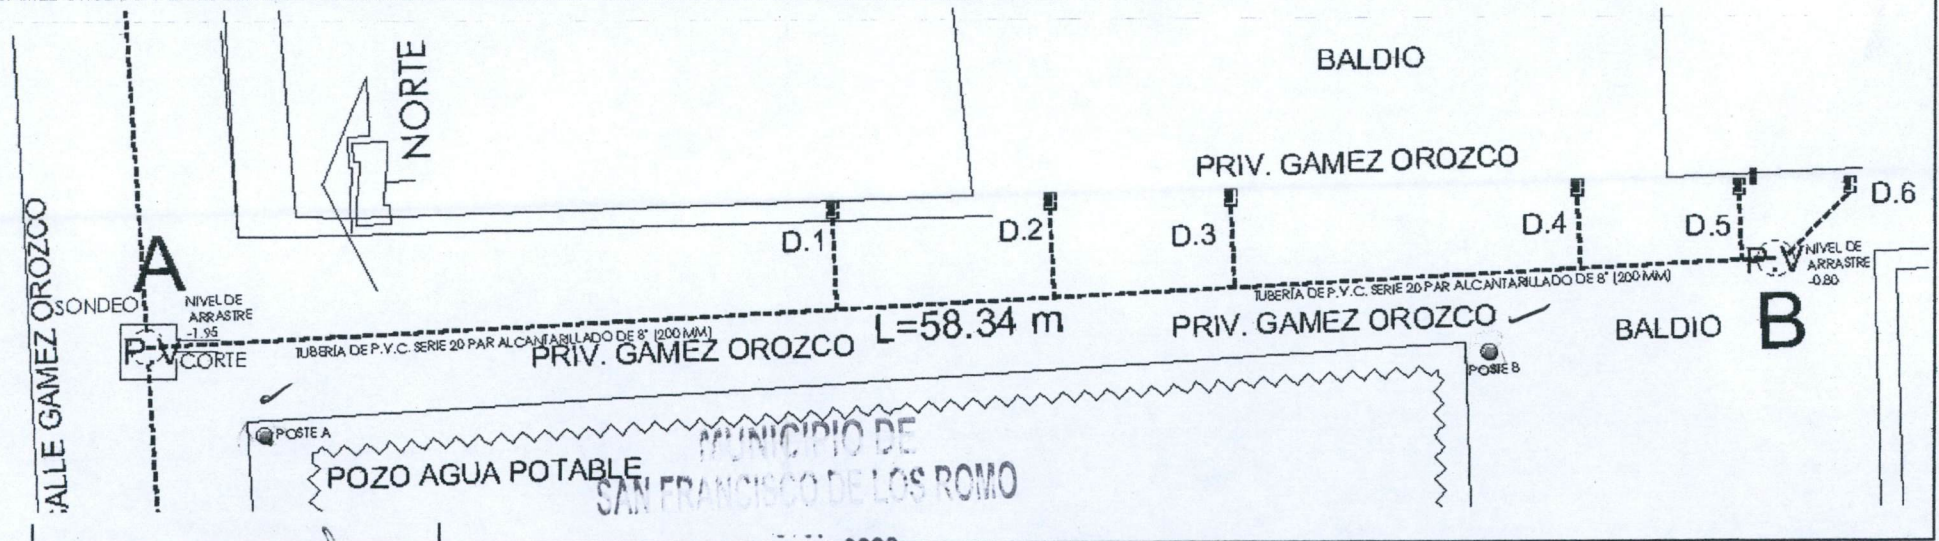

CONTRATISTA

ING. JORGE ARMANDO QUEZADA SOTELO

Nombre y firma.


OPERADO

OBRA INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo

I.C. J JESUS HERNANDEZ FUENTES

Nombre y firma.



JORGE ARMANDO QUEZADA SOTELO
INGENIERO CIVIL

URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL
Bvd. Juan Pablo II No. 1014 - C. Col. Castores de Santa Fe C.P. 20148 Aguascalientes, Ags.
Tel. Y Fax. 01 (467) 283-33-75 e-mail: quezadasotelo@hotmail.com

NO. DE OBRA: FISDMF-005/2022, FISDMF/0010-202, FISDMF-0013/2022, FISDMF-0014/2022, FISDMF-0019/2022, FISDMF-0021/2022 Y FISDMF-0022/2022

NO. DE CONTRATO: FISDMF-005-010-013-014-019-021-022/2022

NOMBRE DEL CONTRATO : REHAB. DE ALCANT. EN CALLE DEL MONTE TRAMO C. FCO. PONCE Y C. MANUEL ALV. COL. MACARIO J. GOMEZ *REHAB. DE RED AGUA POT. EN CALLE DEL MONTE ENTRE LA C. FCO. PONCE Y C. MANUEL ALV. COL. MACARIO J. GOMEZ *CONST. RED ALCANT. EN LA PRIVADA EDMUNDO GAMEZ O. ENTRE CALLE EDMUNDO GAM. OROZ. Y LIM. SUR LA ESC.*CONST RED AGUA POT. PRIV. EDMUNDO GAM. OROZ. ENTRE LA CALLE EDMUNDO GAM. OROZ. Y LIM. SUR LA ESC.*CONST. RED ALCANT. EN CALLE JOSEFA ORT. DE DOM. ENTRE LA C. JACARANDA Y PRIV. JAIME NUNO AMAP. RIO*REHAB. DE ALCANT. EN C. JOSEFA ORT. DOM. ENTRE C. VENUST. CARRANZA Y C. JACARANDA EN AMAP. RIO*CONST. RED AGUA POT. CALLE JOSEFA ORT. DOM. ENTRE C. VENUST. CARRANZA Y PRIV. JAIME NUNO EN AMAPOLAS DEL RIO EN EL MPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EDO. AGUASCALIENTES



Ayuntamiento de
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
2021 • 2024

PERIODO DE EJECUCION :

60 DIAS

INICIO : 01/08/2022

TERMINO:

29/09/2022

PERIODO DE LA ESTIMACION :

UBICACIÓN:

PRIMER TRAMO:

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES.

E S T I M A C I O N NO.003

No.	CONCEPTO	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO		OBSERVACIONES
		EJE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	TOTAL	
30	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO DE 9 MTS. DE AL TURA, INCLUYE: POSTE DE CONCRETO REFORZADO ADOCFE9C-400 DE 9 MTS. DE AL TURA, FLETE DEL MISMO, EXCAVACIÓN EN CEPA A 1.40 MTS DE PROFUNDIDAD Y CON UN DIAMETRO DE 0.50 MTS., GRUA PARA REALIZAR MANIOBRA, RELLENO CON PRODUCTO DE EXCAVACIÓN PLOMEADO, NIVELADO DEL POSTE, LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO."	RED DE ALCANTARILLADO . CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA PRIVADA EDMUNDO GÁMEZ OROZCO ENTRE LA CALLE EDMUNDO GÁMEZ OROZCO Y LIMITE SUR EN LA ESCONDIDA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES.									

CONTRATISTA

ING. JORGE ARMANDO QUEZADA SOTELO

Nombre y firma.

OPERADO

OBRA INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo

I.C. J JESUS HERNANDEZ FUENTES

Nombre y firma.

BITÁCORA DE OBRA

HOJA _____

CONTRATO FISMOF 010/2022

OBRA FLSMDF 010/2022

NOTA

A ESTA FECHA ESTÁ SUPERVISIÓN AN-
TE LA REVISIÓN DE GENERADORES DE LA ESTI-
MACIÓN NO 3 Y FINIQUITO HACE LA OBSERVACIÓN
LOS MONTOS ESTÁN CORRECTOS FALTANDO RESPALDO
EN LOS MISMOS. SIENDO RECIBIDOS EL 3 OCT 22
SE HACE ENTREGA DE PREFACTURA AL CONTRATIS-
TA, GENERADORES Y SE SOLICITA EL REINGRESO.

ESTIMACIÓN #3 Y FINIQUITO.
PERIODO 10 AGOSTO AL 29 SEPT 2022 POR LO
CUAL SE AUTORIZA ESTIMACIÓN NO 3 Y FINIQUITO
CON LA SIGUIENTE ESTRUCTURA:

MONTO BASE	646.12
AMORTIZACIÓN	0.00
SUBTOTAL CON IVA	749.50
RETENCIONES	6.46
TOTAL A PAGAR	743.04

[Handwritten signature]


MUNICIPIO DE
SANTO DOMINGO DE LOS BOMBO
2022

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

USO DE BITÁCORA

Dirección de
OBRAS PÚBLICAS

Ayuntamiento de
**SAN FRANCISCO
DE LOS ROMO**
2021 + 2024



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
No. Oficio: DOP/575/22
San Francisco de los Romo, Ags., 16 de diciembre de 2022
Asunto: LIBERACIÓN DE PAGO

2274

C.P.MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
PRESENTE

Por medio del presente le remito la documentación de la estimación No. 3 (de Finiquito), para que se realicen los trámites necesarios para su pago.

No. de Obra: FIS MDF 010/2022

Nombre de la Obra: CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA PRIVADA EDMUNDO GÁMEZ OROZCO ENTRE LA CALLE EDMUNDO GÁMEZ OROZCO Y LIMITE SUR

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal

Contratista: JORGE ARMANDO QUEZADA SOTELO (QUSJ711112IE8)

Contrato: FIS MDF 010/2022 No Factura: A-384

Objeto del Contrato: CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA PRIVADA EDMUNDO GÁMEZ OROZCO ENTRE LA CALLE EDMUNDO GÁMEZ OROZCO Y LIMITE SUR, LA ESCONDIDA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

Monto del Contrato: \$169,995.83 (CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N.)

Monto a Pagar: \$743.04 (SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 4/100 M.N.)

Sin otro particular de momento, me es grato enviarle un cordial saludo agradeciendo de antemano las atenciones al presente.

ATENTAMENTE

ING. JOSE DE JESUS CHAVEZ GARCIA
DIRECTOR DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

2022

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

C.c.p. Archivo

Av. Benito Juárez S/N, Rancho La Trinidad,
San Francisco de los Romo, Ags. Tel: (465) 967 0124 ext. 1654
