



Usr: susana  
Rep: rptPoliza

**Municipio de San Francisco de los Romo**  
**ESTADO DE AGUASCALIENTES**

Póliza: C05139 Del 29/11/2022



Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2022 11:51 a. m.  
Página | 1

Concepto: FISM 2022 PAGADO EST 1 OBRA FIS MDF 012-2022 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE LA GUAYANA, PU. GP Folio: 338

Beneficiario: **ECOSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-2501-K038-J04-61302-2	OBRAS PARA EL	\$100,795.12		GP Folio: 338
0002	8260-2501-K038-J04-61302-2	OBRAS PARA EL		\$100,795.12	GP Folio: 338
0003	1112-003-002	Bancomer Cta. 011793039-9 FISM		\$49,528.65	GP Folio: 338
0004	1134-003-013	Ecostrucciones, S.A. de C.V.		\$50,397.56	FISM 2022 PAGADO EST 1 OBRA FIS MDF 012-2022
0005	2117-9-005-001	0.1% COLEGIO DE		\$86.89	FISM 2022 PAGADO EST 1 OBRA FIS MDF 012-2022
0006	2117-9-005-002	0.2% ORGANO SUPERIOR DE		\$173.78	FISM 2022 PAGADO EST 1 OBRA FIS MDF 012-2022
0007	2117-9-005-003	0.2% INST. DE CAPACIT. DE LA		\$173.78	FISM 2022 PAGADO EST 1 OBRA FIS MDF 012-2022
0008	2117-9-005-004	0.5% CONTRALORIA MUNICIPAL		\$434.46	FISM 2022 PAGADO EST 1 OBRA FIS MDF 012-2022
0009	2113-000266	ECOSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$100,795.12		GP Folio: 338
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>201,590.24</u>	<u>201,590.24</u>	

**MUNICIPIO DE**  
**SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**  
-- 2022  
**OPERADO**  
**OBRA INFRA ESTRUCTURA**  
**SOCIAL MUNICIPAL**

<b>RFC</b>	MSF920130TQ9	<b>Fecha expedición</b>	29/11/2022 18:24:14
<b>Nombre</b>	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	<b>Uso CFDI</b>	(P01) Por definir
<b>Calle</b>	FRANCISCO ROMO JIMENEZ 102		
<b>Colonia</b>	SAN JOSE DE BUENAVISTA Municipio SAN FRANCISCO DE LOS ROMO C.P. 20300		
<b>Ciudad, Estado</b>	SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES. México		

Clave	ProdServ	Cantidad	Cve. Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
84111506		1	(ACT) Actividad	Pago	0	0
<b>Subtotal</b>						0.00
<b>Total</b>						0.00

CERO XXX 00/100

<b>Ordenante</b>	BBA830831LJ2 012010001179303990	<b>Beneficiario</b>	BMN930209927 072010001882473416
<b>Forma Pago</b>	(03) Transferencia electrónica de fondos	<b>Número Operación</b>	002601002211290000609318
<b>Fecha Pago</b>	2022-11-29T12:00:00		
<b>Tipo pago</b>	(01) SPEI	<b>Certificado Pago</b>	00001000000501732145
	<b>Cadena Pago</b>	1 29112022 29112022 110207 40072 BBVA MEXICO MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO 40 012010001179303990 MSF920130TQ9 BANORTE ECOSTRUCCIONES SA DE CV 40 072010001882473416 ECO050310DM0 PAGO EST 1 FISMDF 11- 012 0.00 49528.65 NA 0 0 NA 0 0.00 00001000000501732145	
	<b>Sello Pago</b>	AjiHq9DJeab4CtvEEbF77wIGYUbuZ+YjW4tdao8Y1HQI4oSJGIIQafO2+knJ3pox5hLsn181QRlht5zG41NW6ephrH0UpEq4p8vyrObaHVbxy71eLq5GR4j61HiMUknYgLR3nlqVU5 TcodFmHieQxBSCjmiWfBlJrLmNOWRiSW9MD/EFWkPn4HLbjQn1TR9DgISp6iZJ5pr5Swop0T5sKpC2DpPAAeV7KmeriiFufVhG8lenJf4HdTuaoXtM9mJKuGwyb3Y3Uudf8Ubx XLoQz4601000asoipYWOX4wTln/Qjs8BQz8wUrLtzB8fWqDlviZvhb6o0R6Q2HQDD	

**Documentos Pagados**

UUID	Documento	Metodo Pago	Importe	Moneda
3d2d8d92-c7fe-468a-9ea2-01738cdd9f5e	272	PPD	49,528.65	MXN
<i>Parcialidad : 2</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Insoluto</i>	152,003.12	
CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 65/100 M.N.			<b>Total</b>	<b>49,528.65 MXN</b>

**Número Certificado** 00001000000511481978

**Sello digital del CFDI**

gWbDovSaaQ3GbUzo5BdVNiSFEVKqhUSvot+OvATsg/pkcc2VbTKDSx4HSIG7pOw+XzKb37vcGLcA/WjZZI++1BZNHUO6KfzQbRwsrXiJyF/6nGH497LBjCN785nzD7HfSgtM81aVSBgCFV6br+Yfoan5EKZLyUbeuNEBBRL9F5ik0LIRnCsU5DPMgFDf0Tna6ZMQCPQDNW3sXW9yeSbx9ULfs4kdGDhefm0EKpAzkje/DohfDPHcyLBjVhSEa/HM+psCnaBLbnVQYX1CuGoU3IzsbwfdYImv1FTnfluFyHbV8c71LgB/xt07xKuL51lqU/RtTcF6cjSkY9GZ1hg8w==

**Sello del SAT**

lnB1ntKU/y0xhc8+Eaw9ZyJgLU05qi0AFUjMhu4Vabi9gfLvaSvrAT9keRGYWLglnhThHiPeRSR4arUxVYUe8SCcH73bleY4Rre50iTsA4Dds0Ty1Y3vmvPTVyeS5PGI8AUSHaYafIRfslanZCHODW7/eZVgsAb4MfD9HY42YsbbW8ct04XqfjRAI2f1fThJiC42Gk8GLG+YmBf2Hc9B9Llv4Jzn6dX5hdJBXm4f7+JZFLVdfUBKApnkzn0zpi1qoh3DwA2X8oOu5sBQCvX/L2LlqMMkLWCzQGUS9juw4FYpRIFbnDoZAV+nMs2bL+S+cX89KdW7MotffLJ1Vhg==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|2e8ac921-8ca9-4fcc-bef3-3b239ff0ba3a|2022-11-29T18:24:15|LSO1306189R5|gWbDovSaaQ3GbUzo5BdVNiSFEVKqhUSvot+OvATsg/pkcc2VbTKDSx4HSIG7pOw+XzKb37vcGLcA/WjZZI++1BZNHUO6KfzQbRwsrXiJyF/6nGH497LBjCN785nzD7HfSgtM81aVSBgCFV6br+Yfoan5EKZLyUbeuNEBBRL9F5ik0LIRnCsU5DPMgFDf0Tna6ZMQCPQDNW3sXW9yeSbx9ULfs4kdGDhefm0EKpAzkje/DohfDPHcyLBjVhSEa/HM+psCnaBLbnVQYX1CuGoU3IzsbwfdYImv1FTnfluFyHbV8c71LgB/xt07xKuL51lqU/RtTcF6cjSkY9GZ1hg8w==|00001000000509846663||

**Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3**



MUNICIPIO DE  
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.  
**PAGADO**  
**FINANZAS**

MUNICIPIO DE  
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO  
2022  
**OPERADO**  
OBRA INFRA ESTRUCTURA  
SOCIAL MUNICIPAL

El presente archivo XML no parece tener ninguna información de estilo asociada. A continuación se muestra su árbol.

<cfdi:Comprobante Version="3.3" Serie="DP" Folio="79" Fecha="2022-11-29T18:24:14" SubTotal="0" Moneda="XXX" Total="0" TipoDeComprobante="P" LugarExpedicion="20196" NoCertificado="00001000000511481978" Sello="gWbDOvSAAQ3GbUZo5BdVnNiSFEVKWqhUSvot+OvATSG/pkcc2VbTKDSx4HSIG7pOw+XzKb37vcGLcA/WjZZI++IBZNHUO6KfzQbRwsrXiJyF/6nGH497LBjCN785nzD7HfSgtM81aVSBgCFV6br+YfOan5EKZLyUBeuNEBBRL9F5ik0LrNCsu5DPMgdfDF0Tna6ZMQCPQDNW3:/DohfDPHcyLBJvhSEa/HM+psCnaBLbnVQYXICuGoU3IZsbwfdYImv1FTnfluFyHbV8c71LgB/xtO7xKul.51lqU/RtTcf6cjSkY9GZlhq8w==" Certificado="MIIF8DCCA9igAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTE0ODE5NzgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHg/8jt4yNgPVYFkiqud/IRFuQRC25I2Z5XTnQIAu2sSXgTfjk7fBF+mLeRzGUGTuuyHuuOQqFNR9K0L9HcwFu96k+73tsocc1IJA1Z7VC8jG9KWHPxhHjsWj/Q/IIryGOR8mdYj8HxECAwEAAMdMBswDAYDVR0TAQH/BAIwADALBgNVHQ8EBAMCBsAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAK2i4UXT92ET19TXV/Iok+3bNgMC+yjWsZ3gyr9jIPocB8RxEemo733jMmATBsk9SsBLZk12NfhoX7tGOW6ZNA/mc/yyw3PcqVDJFs72Vz3298pOzqrIsJ+MX1cNDH8pX0cWqO7FXVXNWfExnr6uGzxPwzGRK0E7Nzk7QHqjbW4brYEcahp6FBgqS/cIRB0skZxt9t+CgrQ9dxYVNXhAmMd2Bx1mifEIWQe1Tb+IM7nzjNyKQJIsKE69ILCed62KFRL5jcvvO2E/3N3aWIPWzkr0AFVgsZCZOYocAbAajwA+4upat3t0UUV+7Hgy2c9Mqw21cO6vJfmcZltMb7FcfX0kJsZoYGNyRoox5NjYzP6zcW1/+r4rMpzaJGVZnCsXNr+693kUJh8TYneuVlnhQLpEvEmxZKGbEpbSTrQoERr9eKGVeRP786X/mMPQngtie+ZolqU7J0jmUie9nf2Zn3QNGLOE/ZuSx/iZWeU0+jLbYosLu/ONfIDQNUOzK7bxoUSHfMWSF5dFdfmkwRUsmALBFUsu" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio\_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/Pagos http://www.sat.gob.mx/sitio\_internet/cfd/Pagos/Pagos10.xsd">  
<cfdi:Emisor Rfc="ECO050310DM0" Nombre="ECOSTRUCIONES, S.A. DE C.V." RegimenFiscal="601"/>  
<cfdi:Receptor Rfc="MSF920130TQ9" Nombre="MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO" UsoCFDI="P01"/>  
<cfdi:Conceptos>  
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="84111506" Cantidad="1" ClaveUnidad="ACT" Descripcion="Pago" ValorUnitario="0" Importe="0"/>  
</cfdi:Conceptos>  
<cfdi:Complemento>  
<cfdi:pago10:Pagos Version="1.0">  
<cfdi:pago10:Pago FechaPago="2022-11-29T12:00:00" FormaDePagoP="03" MonedaP="MXN" Monto="49528.65" NumOperacion="002601002211290000609318" RfcEmisorCtaOrd="BBA830831LJ2" CtaOrdenante="012010001179303990" RfcEmisorCtaBen="BMN930209927" CtaBeneficiario="072010001882473416" TipoCadPago="01" CertPago="00001000000501732145" CadPago="||1|29112022|29112022|110207|40072|BBVA MEXICO|MUNICIPIO DE SAN FRA NCISCO DE LOS ROMO|40|012010001179303990|MSF920130TQ9|BANORTE|ECOSTRUCIONES SA DE CV|40|072010001882473416|ECO050310DM0|PAGO EST 1 FISMDF 11-012|0.00|49528.65|NA|NA|0|0|NA|0|0.00|00001000000501732145||" SelloPago="AjiHq9DJeab4CtvEEbF77wIGYUbuZ+YjW4tdao8Y1HQI4oSJGIIQafO2+knJ3pox5hLsni81QRlht5zG4INW6ephrfTcodFmHieiQxBSCjmiWfBIJrLmNOWRiSW9MD/EFWkPn4HLbjQn1TR9DgISp6iZJ5pr5Swop0T5sKpC2DpAAeV7KmeriifXLo0Qz46O100OasoipYW0X4wT1n/Qjs8BQz8wUrLtzB8fWqDlvizvhh6oOR6Q2HQODw==">  
<cfdi:pago10:DoctoRelacionado IdDocumento="3d2d8d92-c7fe-468a-9ea2-01738cdd9f5e" Folio="272" MonedaDR="MXN" MetodoDePagoDR="PPD" NumParcialidad="2" ImpSaldoAnt="201531.77" ImpPagado="49528.65" ImpSaldoInsoluto="152003.12"/>  
</cfdi:pago10:DoctoRelacionado>  
</cfdi:pago10:Pagos>  
<cfdi:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio\_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="2e8ac921-8ca9-4fcc-bef3-3b239ff0ba3a" FechaTimbrado="2022-11-29T18:24:15" RfcProvCertif="LSO1306189R5" SelloCFD="gWbDOvSAAQ3GbUZo5BdVnNiSFEVKWqhUSvot+OvATSG/pkcc2VbTKDSx4HSIG7pOw+XzKb37vcGLcA/WjZZI++IBZNHUO6KfzQbRwsrXiJyF/6nGH497LBjCN785nzD7HfSgtM81aVSBgCFV6br+YfOan5EKZLyUBeuNEBBRL9F5ik0LrNCsu5DPMgdfDF0Tna6ZMQCPQDNW3:/DohfDPHcyLBJvhSEa/HM+psCnaBLbnVQYXICuGoU3IZsbwfdYImv1FTnfluFyHbV8c71LgB/xtO7xKul.51lqU/RtTcf6cjSkY9GZlhq8w==" NoCertificadoSAT="00001000000509846663" SelloSAT="lnBINtKU/y0xhc8+Eaw9ZygJlqLU05qi0AFUjMhu4Vabi0gfLvaSvrAT9keRGYWLGlNhThHiPpRSR4arUxVYUe8SCcf/eZVgsAb4MfD9HY42YSbbW8cT04XqfjRAi2fiFThJc42Gk8GIG+Ymbf2Hc9B9Lv4Jzn6dX5hdLbXm47-2022-11-29T18:24:15" />  
</cfdi:TimbreFiscalDigital>  
<cfdi:Complemento>  
</cfdi:Complemento>  
</cfdi:Comprobante>

MUNICIPIO DE  
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

OPERADO  
OBRA INFRA ESTRUCTURA  
SOCIAL MUNICIPAL



Fecha y hora de consulta

29/11/2022 11:02:11 AM

Contrato

00796395

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO  
DE LOS ROMO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

## Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

## Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

## Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: EST 1 FISDMF 012

Importe de la operación: 49,528.65 MXP

Cuenta de retiro: 0117930399

Cuenta de depósito: 072010001882473416

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE SAN FRA  
NCISCO DE LOS ROMO

Titular de la cuenta: ECOSTRUCCIONES SA DE CV

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha de creación: 29/11/2022

Fecha de aplicación: 29/11/2022

Concepto de pago: PAGO EST 1 FISDMF 11-012

Referencia numérica: 291122

Instrumento de seguridad: ASD 6550927880

Hora de captura en el canal: 11:02:02

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000609318

Clave de rastreo: 00260100221129000609318

Folio de firma: 0013194034

Folio único: I401202211291102020013194040

## Estado operación


Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas


Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	29/11/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	29/11/2022

Dirección de  
**OBRAS PÚBLICAS**



Ayuntamiento de  
**SAN FRANCISCO  
DE LOS ROMO**

2021 ♦ 2024



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN  
FRANCISCO DE LOS ROMO  
No. Oficio: DOP/513/22  
San Francisco de los Romo, Ags., 28 de noviembre de 2022  
Asunto: LIBERACIÓN DE PAGO

**C.P.MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ**  
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
PRESENTE

2100

Por medio del presente le remito la documentación de la estimación No. 1, para que se realicen los trámites necesarios para su pago.

No. de Obra: FIS MDF 012/2022  
Nombre de la Obra: AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE LA GUAYANA  
Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal  
Contratista: ECOSTRUCIONES, S.A. DE C.V. (ECO050310DM0 )  
Contrato: FIS MDF 011-012/2022 12 No Factura: 272  
Objeto del Contrato: AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE LA GUAYANA, PUERTECITO DE LA VIRGEN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.  
Monto del Contrato: \$410,134.83 (CUATROCIENTOS DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 83/100 M.N.)  
Monto a Pagar: \$49,528.65 (CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 65/100 M.N.)

Sin otro particular de momento, me es grato enviarle un cordial saludo agradeciendo de antemano las atenciones al presente.

ATENTAMENTE

ING. JOSE DE JESUS CHAVEZ GARCIA  
DIRECTOR DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

MUNICIPIO DE  
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO  
2022  
**OPERADO**  
OBRA INFRA ESTRUCTURA  
SOCIAL MUNICIPAL

C.c.p. Archivo

Av. Benito Juárez S/N, Rancho La Trinidad,  
San Francisco de los Romo, Ags. Tel: (465) 967 0124 ext. 1654

# DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

## CÉDULA DE SEGUIMIENTO A ESTIMACIONES DE OBRA

Ayuntamiento de  
**SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**  
2021 • 2024



DATOS GENERALES									
CONTRATISTA: <u>ECOCONSTRUCCIONES S.A DE C.V.</u>					N° DE CONTRATO: <u>FISMDF 011-012/2022</u>				
SUPERVISOR <u>J JESÚS HERNÁNDEZ FUENTES</u>					N° DE OBRA: <u>012 / 2022</u>				
OBRA: <u>AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CAYE GUAYANA</u>					N° DE FACTURA:				
FECHA DE CORTE: DEL: <u>14 OCT</u> AL: <u>28 OCT. 2022</u>					N° DE ESTIMACION: <u>#1 (UNO)</u>				
					IMPORTE LIQUIDO:				
FORMATO DE NÚMEROS GENERADORES									
INGRESO	REVISIÓN	NOTA			CAPTURA EN SISTEMA	ENTREGA DE PRE-FACTURA			
		Sr. contratista regrese esta cédula con la estimación original de lo contrario no se le dara tramite							
<u>10/NOV/22</u>	<u>9 NOV 2022</u>				<u>09 NOV 2022</u>				
CONTRATISTA	SUPERVISOR				SUPERVISOR	SUPERVISOR			
FORMATO DE ESTIMACIÓN									
INGRESO	REGISTRO	SUPERVISOR			OPERADO		MUNICIPIO DE		JEFE DE DEPARTAMENTO
									ARQ. ALFREDO FLORES MARMOLEJO
<u>25/NOV/22</u>	<u>28 Nov 22, 28 Nov 22</u>								
CONTRATISTA	CONTROL DE ESTIMACIONES	RECIBIDO			AUTORIZADO		RECIBIDO		AUTORIZADO
DEVOLUCIÓN			CONTENIDO						
FECHA DE DEVOLUCIÓN:			CÁRATULA						
FECHA DE REINGRESO:			RESUMEN						
MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN: <u>Falta complementaria</u>			CONCEPTOS						
<u>- fotografías</u> <u>- croquis</u>			ESTADO DE CUENTA						
			CONCENTRADO DE CONCEPTOS (FIN)						
			GENERADORES Y RESUMEN						
			CROQUIS						
			FOTOGRAFÍAS						
			ANÁLISIS PRECIO UNITARIO						
			REPORTE(S) DE LABORATORIO						
			FIANZA(S) (FIN)						
			NOTA DE BITACORA DE OBRA						
			TRÁMITE DE PAGO						
FECHA DE INICIO DE TRÁMITE EN DOP-SFR			FIRMA DEL DIRECTOR			OFICIO DE LIBERACIÓN			FECHA DE ENTREGA
<u>09</u>	<u>NOV</u>	<u>22</u>	<u>28</u>	<u>NOV</u>	<u>2022</u>	<u>28</u>	<u>NOV</u>	<u>2022</u>	
DÍA:	MES:	AÑO:	DÍA:	MES:	AÑO:	DÍA:	MES:	AÑO:	DIRECCIÓN DE EGRESOS.

# PRE-FACTURA Normal



**PRE-FACTURA DEL CONTRATISTA: ECOSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (915)**

A NOMBRE DE: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO  
 RFC: MSF920130TQ9  
 DIRECCION: FCO ROMO JIMENEZ 102, SAN JOSE DE BUENAVISTA, SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS,  
 CIUDAD: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE L ESTADO: AGUASCALIENTES

DESCRIPCION

PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 Del 14 Oct 2022 al 28 Oct 2022  
 DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE LA GUAYANA  
 UBICADA EN: PUERTECITO DE LA VIRGEN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
 CON AMPARO DEL CONTRATO No.: FISMDF 011-012/2022 12  
 DE FECHA:: 03/10/2022  
 BAJO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA:

Inversion Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal 2022  
 Programa SG ELECTRIFICACIÓN  
 SubPrograma 02 RURAL  
 Obra. FISMDF 012/2022 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE LA GUAYANA  
 Localizacion PUERTECITO DE LA VIRGEN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

MONTO BASE	\$86,892.35
AJUSTE DE COSTOS (+)	\$0.00
AMORTIZACION DE ANTICIPO (-)	\$43,446.18
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$43,446.17</b>
IVA (+)	\$6,951.39
<b>SUBTOTAL CON IVA</b>	<b>\$50,397.56</b>

CAPACITACION DE LOS TRABAJADORES DEL CONTRATISTA	\$173.78	( 0.20%)
COLEGIOS DE PROFESIONISTAS SEGUN CORRESPONDA	\$86.89	( 0.10%)
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	\$0.00	( 0.00%)
FISCALIZACION DEL H. CONGRESO DEL ESTADO	\$173.78	( 0.20%)

TOTAL DE RETENCIONES (-)	\$868.91
SANCION POR RETRASO (-)	\$0.00
<b>SUBTOTAL MENOS RETENCIONES</b>	<b>\$49,528.65</b>
RETENCION POR RETRASO(-)	\$0.00
REINTEGRO POR RETENCION	\$0.00
OTRAS SANCIONES(-)	\$0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$49,528.65</b>

Avance Físico Real % INSPECCION DE VIGILANCIA PARA LA CONTRALORIA \$434.46 ( 0.50%)  
 Avance Físico Programado % SERVICIOS RELATIVOS ALAS CONSTRUCCIONES \$0.00  
 Fecha Terminación Prog. 17/11/2022 **\$868.91**

CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 65/100 M.N.



**MUNICIPIO DE  
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO  
 OPERADO  
 OBRA INFRA ESTRUCTURA  
 SOCIAL MUNICIPAL**

## ESTADO DE CUENTA

Obra.	FISMDF 012/2022 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE LA GUAYANA	Total Contrato	410,134.83
Localización	PUERTECITO DE LA VIRGEN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.	Total Ampliaciones	0.00
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura So	Total Contratado	410,134.83
Programa	SG ELECTRIFICACIÓN	Anticipo ( %)	205,067.42
SubPrograma	02 RURAL	Estimado Anterior	0.00
Contratista	ECOSTRUCIONES, S.A. DE C.V. (915)	Esta Estimacion	<b>50,397.56</b>
Contrato	FISMDF 011-012/2022 12 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE LA GUAYANA	Total Estimado	255,464.98
Estimacion No.	1 Del 14 Oct 2022 al 28 Oct 2022	Total por Estimar	154,669.85

No. Estimac.	Periodo	Importe Estimacion	Amortizacion de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA (+)	Cargo a la Obra	DEDUCCIONES (-)						Retencion (-)	Reintegro (+)	Sanciones (-)	Importe a Pagar
							CMIG(0)	Cargo Prof.(0)	SFP(0.5)	Cong. Edo.(0.2)	Municipal	ISRuOtro(0)				
Articipo				176,782.26	28,285.16	205,067.42										205,067.42
1	Del 14 Oct 2022 al 28 Oct 2022	86,892.35	43,446.18	133,336.08	6,951.39	50,397.56	173.78	86.89	0.00	173.78	434.46	0.00	0.00	0.00	0.00	49,528.65
<b>TOTALES</b>		<b>86,892.35</b>	<b>43,446.18</b>	<b>310,118.34</b>	<b>35,236.55</b>	<b>255,464.98</b>	<b>173.78</b>	<b>86.89</b>	<b>0.00</b>	<b>173.78</b>	<b>434.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>254,596.07</b>

2

MUNICIPIO DE  
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

OPERADO  
OBRA INFRA ESTRUCTURA  
SOCIAL MUNICIPAL

2022


## RESUMEN DE ESTIMACION


Obra.	FISDMF 012/2022 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE LA GUAYANA		Total Contrato	\$410,134.83
Localización	PUERTECITO DE LA VIRGEN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.		Total Ampliaciones	\$0.00
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal.		Total Contratado	\$410,134.83
Programa	SG ELECTRIFICACIÓN		Anticipo ( 50 )%	\$205,067.42
SubPrograma	02 RURAL		Estimado Anterior	\$0.00
Supervisor	J. JESÚS HERNÁNDEZ FUENTES (HEFJ7112011W6)		Esta Estimacion	<b>\$50,397.56</b>
Contratista	ECOSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (915)		Total Estimado	\$255,464.98
Contrato	FISDMF 011-012/2022 12      AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE LA GUAYANA		Saldo por Estimar	\$154,669.85
Estimacion No.	1			
Recibí de	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	la Cantidad de:	\$50,397.56 CINCUENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 56/100 M.N.	

GRUPO                      PARTIDA

* AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE LA GUAYANA EN PUERTECITO DE LA VIRGEN EN EL MUNICIPIO DE S			\$86,892.35
- IPPOSTES			\$86,892.35
Fecha Terminación Prog.		<b>SUMA</b>	<b>\$86,892.35</b>
		AJUSTE DE COSTOS (+)	\$0.00
		AMORTIZACION DE ANTICIPO (-)	\$43,446.18
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$43,446.17</b>
		IVA (+)	\$6,951.39
		<b>SUBTOTAL CON IVA</b>	<b>\$50,397.56</b>

**MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**  
**OPERADO**  
**OBRA INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
 2022

  
 ECOSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (ECO050310DM0)  
 Contratista

  
 INGENIERO J. JESÚS HERNÁNDEZ FUENTES  
 (HEFJ7112011W6)  
 SUPERVISOR DE OBRA



FECHA :

NOMBRE DE LA OBRA : **AMPLIACIÓN DE RED ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE LA GUAYANA**

No. DE CONTRATO Y OBRA : **No. FIS MDF 011-012/2022 FIS MDF 012/2022**

IMPORTE DE CONTRATO : **\$410,134.83**

FECHA DE INICIO VIGENTE (CONTRATO) : **14 de octubre de 2022**

FECHA DE INICIO REAL (REPROGRAMACIÓN SEGÚN ANTICIPO) : **14 de octubre de 2022**

PLAZO DEL CONTRATO : **45 DÍAS**

FECHA DE TERMINO VIGENTE : \_\_\_\_\_ FECHA DE TERMINO REAL : \_\_\_\_\_

No. DE ESTIMACIÓN : **1**

PERIODO DEL : **14 DE OCTUBRE**

AVANCE FÍSICO: \_\_\_\_\_

AVANCE FINANCIERO: \_\_\_\_\_


**MUNICIPIO DE  
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**

**2022**

**OPERADO  
OBRA INFRA ESTRUCTURA  
SOCIAL MUNICIPAL**

AL: **28 DE OCTUBRE**

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN					PU.	IMPORTE
			CONTRATADO	ESTA ESTIM.	EST. ANTERIOR	ACUMULADO	EXCEDENTES		
<b>CALLE LA GUAYANA</b>									
<b>POSTES</b>									
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO OCTAGONAL DE CONCRETO REFORZADO DE 12 MTS DE ALTURA Y 750 KG/CM2 DE RESISTENCIA CLAVE CFE PCR-12-750. INCLUYE: CEPA EN TERRENO I O II, ERECCION, PLOMEO, ALINEADO, ACARREOS, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	PZA	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	\$ 17,378.47	\$ 86,892.35
<b>ESTRUCTURAS MEDIA TENSION</b>									
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSION 13.2 KV, PARA CONVERTIR UNA ESTRUCTURA EXISTENTE TIPO VR20 EN VA20, PARA CABLE ACSR 1/0, A INSTALARSE EN POSTE DE CONCRETO O ACERO. INCLUYE: ELEMENTOS DE SUJECION, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA.	PZA	1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	\$ 3,317.77	\$ -
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSION 13.2 KV, DE REMATE TIPO VR20, PARA CABLE ACSR 1/0, A INSTALARSE EN POSTE DE CONCRETO O ACERO. INCLUYE: ELEMENTOS DE SUJECION, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA.	PZA	1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	\$ 9,267.25	\$ -
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSION 13.2 KV, DE PASO TIPO VS20, PARA CABLE ACSR 1/0, A INSTALARSE EN POSTE DE CONCRETO O ACERO. INCLUYE: ELEMENTOS DE SUJECION, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA.	PZA	3.00	0.00	0.00	0.00	-3.00	\$ 4,595.08	\$ -
<b>ESTRUCTURAS BAJA TENSION</b>									
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE BAJA TENSION DE REMATE TIPO 1R3, PARA CABLE TIPO NEUTRANEL (2+1)1/0-2 AWG, A INSTALARSE EN POSTE DE CONCRETO O ACERO. INCLUYE: ELEMENTOS DE SUJECION, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS.	PZA	3.00	0.00	0.00	0.00	-3.00	\$ 2,266.47	\$ -
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE BAJA TENSION DE PASO TIPO 1P3, PARA CABLE TIPO NEUTRANEL (2+1)1/0-2 AWG, A INSTALARSE EN POSTE DE CONCRETO O ACERO. INCLUYE: ELEMENTOS DE SUJECION, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA.	PZA	3.00	0.00	0.00	0.00	-3.00	\$ 2,050.97	\$ -
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE BAJA TENSION DE REMATE PARA NEUTRO CORRIDO TIPO 1R1, PARA CABLE TIPO ACSR 1/0, A INSTALARSE EN POSTE DE CONCRETO O ACERO. INCLUYE: ELEMENTOS DE SUJECION, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS.	PZA	3.00	0.00	0.00	0.00	-3.00	\$ 1,041.98	\$ -
<b>RETENIDAS</b>									
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA EN MEDIA TENSION, VOLADA A POSTE (RVP), CON CABLE DE ACERO GALVANIZADO AG8 PARA UNA DISTANCIA INTERPOSTAL MAXIMA DE 50 MTS., INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS,	PZA	1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	\$ 4,867.99	\$ -
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA EN BAJA TENSION, SENCILLA DE ANCLA (RSA), CON CABLE DE ACERO GALVANIZADO AG8. INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	PZA	1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	\$ 5,179.67	\$ -





MUNICIPIO DE  
SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS  
2022  
**OPERADO**  
OBRA INFRA ESTRUCTURA  
SOCIAL MUNICIPAL

FECHA : \_\_\_\_\_  
 NOMBRE DE LA OBRA : **AMPLIACIÓN DE RED ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE LA GUAYANA**  
 No. DE CONTRATO Y OBRA : **No. FISDMF 011-012/2022 FISDMF 012/2022**  
 IMPORTE DE CONTRATO : **\$410,134.83**  
 FECHA DE INICIO VIGENTE (CONTRATO) : **14 de octubre de 2022**  
 FECHA DE INICIO REAL (REPROGRAMACIÓN SEGÚN ANTICIPO) : **14 de octubre de 2022**  
 PLAZO DEL CONTRATO : **45 DÍAS**  
 FECHA DE TERMINO VIGENTE : \_\_\_\_\_ FECHA DE TERMINO REAL : \_\_\_\_\_  
 No. DE ESTIMACIÓN : **1**  
 PERIODO DEL : **14 DE OCTUBRE**  
 AVANCE FÍSICO : \_\_\_\_\_ AL : **28 DE OCTUBRE**  
 AVANCE FINANCIERO : \_\_\_\_\_

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN					PU.	IMPORTE
			CONTRATADO	ESTA ESTIM.	EST. ANTERIOR	ACUMULADO	EXCEDENTES		
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA EN BAJA TENSION DE POSTE A POSTE (RPP), CON CABLE DE ACERO GALVANIZADO AG8 PARA UNA DISTANCIA INTERPOSTAL MAXIMA DE 50 MTS., INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	PZA	1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	\$ 4,039.03	\$ -
<b>SUBESTACIONES FUERZA</b>									
11	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION DE FUERZA CON TRANSFORMADOR MONOFASICO TIPO POSTE DE 25 KVA 13200-120/240 V, AUTOPROTEGIDO EN MEDIA Y BAJA TENSION, NORMA "K"; INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	PZA	1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	\$ 79,256.89	\$ -
<b>CONDUCTORES</b>									
12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACSR 1/0 AWG, INCLUYE: TENDIDO, TENSIONADO, REMATADO, CONEXIONES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS.	M	432.00	0.00	0.00	0.00	-432.00	\$ 64.14	\$ -
13	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO NEUTRANEL (2+1) 1/0-2 AWG, INCLUYE: TENDIDO, TENSIONADO, REMATADO, CONEXIONES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS.	M	159.00	0.00	0.00	0.00	-159.00	\$ 175.54	\$ -
<b>PROTECCIONES</b>									
14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA FISICA PARA FINAL DE AEREA SECUNDARIA A BASE DE VARILLA COPPERWELL DE 19 MM. DE DIAMETRO Y DE 3.05 M DE LONGITUD INCLUYE: CONECTOR MECANICO, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	PZA	2.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	\$ 2,303.88	\$ -
<b>RETIROS Y RELOCALIZACIONES</b>									
15	RETIRO DE RETENIDA EN MEDIA TENSION TIPO RVP, INCLUYE: MANIOBRAS, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	PZA	1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	\$ 324.79	\$ -
<b>PAGOS A CFE, GESTION Y TRAMITES</b>									
16	INGENIERIA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLANO DEFINITIVO DE CONSTRUCCIÓN, PRUEBAS ELECTRICAS DE CAMPO Y TRAMITES PARA LA ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA EN C.F.E., INCLUYE: FIRMA DEL INGENIERO RESPONSABLE, INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN, COPIAS, TRAMITES DE GESTION ANTE CFE Y TODO LO NECESARIO PARA LA ENTREGA DE LA OBRA A CFE.	PZA	0.50	0.00	0.00	0.00	-0.50	\$ 11,899.19	\$ -
17	PAGO A C.F.E. POR CONCEPTO DE LIBRANZAS Y/O TRABAJOS EN VIVO.	PZA	1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	\$ 7,126.07	\$ -
<b>ALUMBRADO PUBLICO</b>									
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO LED 72 W, 120-240 V, INCLUYE, ACCESORIOS NECESARIOS, ACARREOS, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, CONEXIONES, PRUEBAS Y TRABAJO TERMINADO.	PZA	4.00	0.00	0.00	0.00	-4.00	\$ 9,405.84	\$ -
19	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE ALUMBRADO PUBLICO PASO O REMATE PARA CABLE TIPO NEUTRANEL (2+1) 6c AWG, A INSTALARSE EN POSTE DE CONCRETO O ACERO, INCLUYE. ELEMENTOS DE SUJECION, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS	PZA	6.00	0.00	0.00	0.00	-6.00	\$ 733.65	\$ -

*[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]*

FECHA :

NOMBRE DE LA OBRA : **AMPLIACIÓN DE RED ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE LA GUAYANA**

No. DE CONTRATO Y OBRA : **No. FISDMF 011-012/2022 FISDMF 012/2022**

IMPORTE DE CONTRATO : **\$410,134.83**

**MUNICIPIO DE  
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**

FECHA DE INICIO VIGENTE (CONTRATO) : **14 de octubre de 2022**

FECHA DE INICIO REAL (REPROGRAMACIÓN SEGÚN ANTICIPO) : **14 de octubre de 2022**

**2022**

PLAZO DEL CONTRATO : **45 DÍAS**

FECHA DE TERMINO VIGENTE : \_\_\_\_\_ FECHA DE TERMINO REAL : \_\_\_\_\_

No. DE ESTIMACIÓN : **1**

**OPERADO**

PERIODO DEL : **14 DE OCTUBRE**

AL : **28 DE OCTUBRE**

**OBRA INFRA ESTRUCTURA  
SOCIAL MUNICIPAL**

AVANCE FÍSICO : \_\_\_\_\_


AVANCE FINANCIERO : \_\_\_\_\_

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN					PU.	IMPORTE
			CONTRATADO	ESTA ESTIM.	EST. ANTERIOR	ACUMULADO	EXCEDENTES		
20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO NEUTRANEL (2+1)6c AWG, INCLUYE: TENDIDO, TENSIONADO, REMATADO, CONEXIONES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS.	M	159.00	0.00	0.00	0.00	-159.00	\$ 56.36	\$ -
	<b>INTERCONEXION ENTRE LAS CALLES CONCEPCIÓN Y GUAYANA CONDUCTORES</b>								
21	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACSR 1/0 AWG, INCLUYE: TENDIDO, TENSIONADO, REMATADO, CONEXIONES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS.	M	52.00	0.00	0.00	0.00	-52.00	\$ 64.14	\$ -
	<b>INTERCONEXION ENTRE LAS CALLES CONCEPCIÓN Y GUAYANA ALUMBRADO PÚBLICO</b>								
22	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO NEUTRANEL (2+1)6c AWG, INCLUYE: TENDIDO, TENSIONADO, REMATADO, CONEXIONES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS.	M	52.00	0.00	0.00	0.00	-52.00	\$ 56.36	\$ -
23				0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	\$ -
E-01			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	\$ -
E-02			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	\$ -
E-03			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	\$ -


SUB-TOTAL \$ 86,892.35  
16% IVA \$ 13,902.78  
TOTAL \$ 100,795.13

OBSERVACIONES:

ING. FRANCISCO JAVIER ROSAS YÁREZ  
Ecostrucciones, S.A. de C.V.

  
ING. J. JESUS HERNANDEZ FUENTES

Residente de Supervisión  
Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo

  
ARQ. ALFREDO FLORES MARMOLEJO

Jefe Departamento de Supervisión  
Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo

NO. DE OBRA: FISMDF 012/2022  
 NO. DE CONTRATO: No. FISMDF 011-012/2022  
 DESCRIPCIÓN: 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO OCTAGONAL DE CONCRETO REFORZADO DE 12 MTS DE ALTURA Y 750 KG/CM2 DE RESISTENCIA CLAVE CFE PCR-12-750. INCLUYE: CEPA EN TERRENO I O II, ERECCION, PLOMEO, ALINEADO,  
 UBICACIÓN: CALLE LA GUAYANA

**NUMEROS GENERADORES**

No. DE ESTIMACIÓN: 1

No.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	TOTAL	CROQUIS	FOTOGRAFIA
			EJE	TRAMO	TIPO								
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO OCTAGONAL DE CONCRETO REFORZADO DE 12 MTS DE ALTURA Y 750 KG/CM2 DE RESISTENCIA CLAVE CFE PCR-12-750. INCLUYE: CEPA EN TERRENO I O II, ERECCION, PLOMEO, ALINEADO, ACARREOS, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	PZA	GUAYA	P7					1.00	1.00	1.00	ANEXO	
			GUAYA	P8					1.00	1.00	1.00		
			GUAYA	P9					1.00	1.00	1.00		
			GUAYA	P10					1.00	1.00	1.00		
			GUAYA	P11					1.00	1.00	1.00		
									<b>TOTAL</b>	<b>5.00</b>			

OPERADO  
 OBRA INFRA ESTRUCTURA  
 SOCIAL MUNICIPAL  
 2022  
 MUNICIPIO DE  
 SAN FRANCISCO DE LOS RIOS

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA  
 Ing. Héctor Durón Esparza  
 Ecostrucciones, S.A. de C.V.

RESIDENTE DE SUPERVISION  
 Ing. J. Jesus Hernandez Fuentes  
 Direccion de Obras Publicas



**Ecostrucciones**  
s.a. de c.v.

**NUMEROS GENERADORES**

**ANEXO**

NO. DE OBRA: FISMDF 012/2022

NO. DE CONTRATO: No. FISMDF 011-012/2022

DESCRIPCIÓN: 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO OCTAGONAL DE CONCRETO REFORZADO DE 12 MTS DE ALTURA Y 750 KG/CM2 DE RESISTENCIA CLAVE CFE PCR-12-750. INCLUYE: CEPA EN TERRENO I O II, ERECCION, PLOMEO,


UBICACIÓN: CALLE LA GUAYANA

No. DE ESTIMACIÓN : 1

No.

**C R O Q U I S**

1 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO OCTAGONAL DE CONCRETO REFORZADO DE 12 MTS DE ALTURA Y 750 KG/CM2 DE RESISTENCIA CLAVE CFE PCR-12-750. INCLUYE: CEPA EN TERRENO I O II, ERECCION, PLOMEO, ALINEADO, ACARREOS, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.

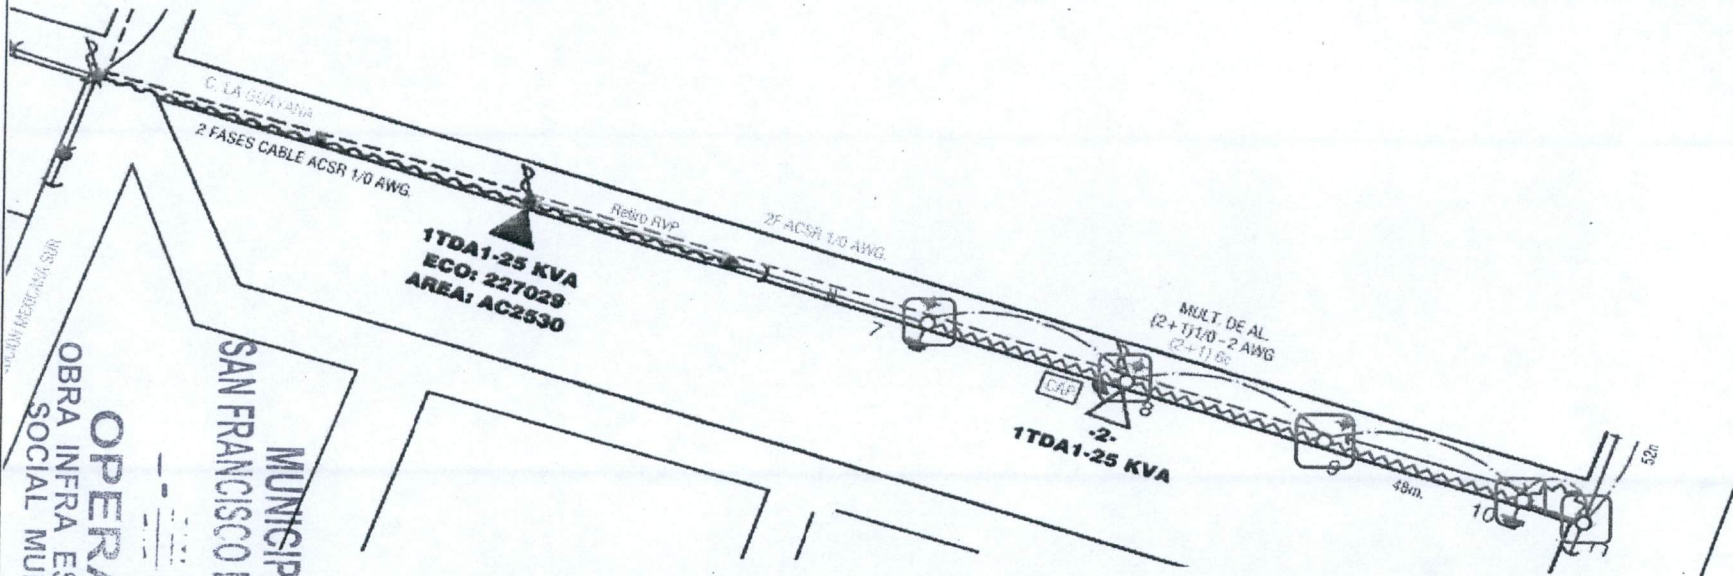

OBSERVACIONES :

RESIDENTE DE OBRA  
Ing. Héctor Durón Esparza  
Ecostrucciones, S.A. de C.V.

RESIDENTE DE SUPERVISION  
Ing. J. Jesús Hernández Fuentes  
Dirección de Obras Públicas



**Ecostrucciones**  
s.a. de c.v.

**NUMEROS GENERADORES**

**ANEXO**

NO. DE OBRA: FISMDF 012/2022

NO. DE CONTRATO: No. FISMDF 011-012/2022

DESCRIPCIÓN: 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO OCTAGONAL DE CONCRETO REFORZADO DE 12 MTS DE ALTURA Y 750 KG/CM2 DE RESISTENCIA CLAVE CFE PCR-12-750. INCLUYE: CEPA EN TERRENO I O II, ERECCION, PLOMEO,

UBICACIÓN: CALLE LA GUAYANA


No. DE ESTIMACIÓN : 1

No.

**C R O Q U I S**

1 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO OCTAGONAL DE CONCRETO REFORZADO DE 12 MTS DE ALTURA Y 750 KG/CM2 DE RESISTENCIA CLAVE CFE PCR-12-750. INCLUYE: CEPA EN TERRENO I O II, ERECCION, PLOMEO, ALINEADO, ACARREOS, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.

MUNICIPIO DE  
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO  
OPERADO  
OBRA INFRA ESTRUCTURA  
SOCIAL MUNICIPAL  
2022

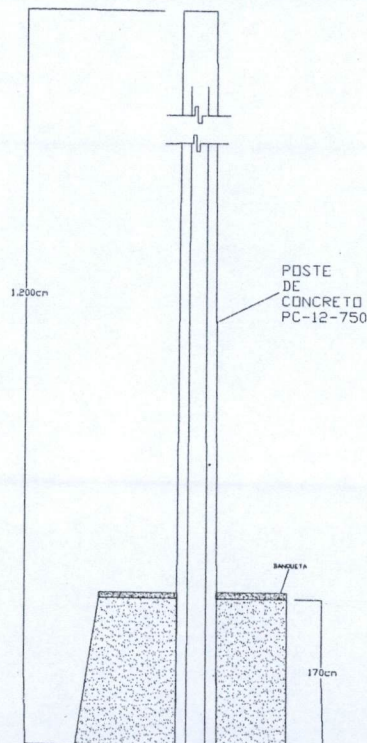

OBSERVACIONES :

RESIDENTE DE OBRA  
Ing. Héctor Durón Esparza  
Ecostrucciones, S.A. de C.V.

RESIDENTE DE SUPERVISION  
Ing. J. Jesús Hernández Fuentes  
Dirección de Obras Públicas

**NUMEROS GENERADORES**

**ANEXO**



**NO. DE OBRA:** FISMDF 012/2022  
**NO. DE CONTRATO:** No. FISMDF 011-012/2022  
**DESCRIPCIÓN:** 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO OCTAGONAL DE CONCRETO REFORZADO DE 12 MTS DE ALTURA Y 750 KG/CM2 DE RESISTENCIA  
**UBICACIÓN:** CALLE LA GUAYANA

No. DE ESTIMACIÓN : 1

**FOTOGRAFIAS**

No.

1 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO OCTAGONAL DE CONCRETO REFORZADO DE 12 MTS DE ALTURA Y 750 KG/CM2 DE RESISTENCIA CLAVE CFE PCR-12-750. INCLUYE: CEPA EN TERRENO I O II, ERECCION, PLOMEO, ALINEADO, ACARREOS, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.

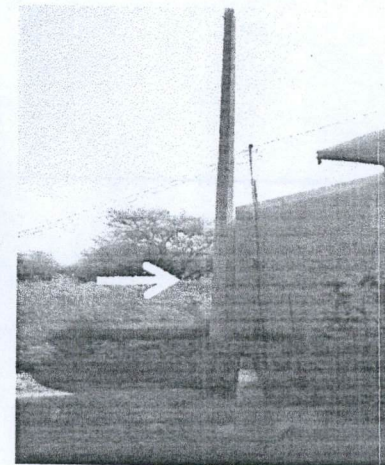

MUNICIPIO DE  
SAN FRANCISCO DE LOS RINCONES  
2022  
OPERADO  
OBRA INFRA ESTRUCTURA  
SOCIAL MUNICIPAL

OBSERVACIONES :

RESIDENTE DE OBRA  
Ing. Héctor Durón Esparza  
Ecostrucciones, S.A. de C.V.

RESIDENTE DE SUPERVISION  
Ing. J. Jesús Hernández Fuentes  
Dirección de Obras Públicas

**NUMEROS GENERADORES**

**ANEXO**



**NO. DE OBRA:** FISMDF 012/2022  
**NO. DE CONTRATO:** No. FISMDF 011-012/2022  
**DESCRIPCIÓN:** 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO OCTAGONAL DE CONCRETO REFORZADO DE 12 MTS DE ALTURA Y 750 KG/CM2 DE RESISTENCIA  
**UBICACIÓN:** CALLE LA GUAYANA

**No. DE ESTIMACIÓN : 1**

**FOTOGRAFIAS**

No.

1 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO OCTAGONAL DE CONCRETO REFORZADO DE 12 MTS DE ALTURA Y 750 KG/CM2 DE RESISTENCIA CLAVE CFE PCR-12-750. INCLUYE: CEPA EN TERRENO I O II, ERECCION, PLOMEO, ALINEADO, ACARREOS, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.

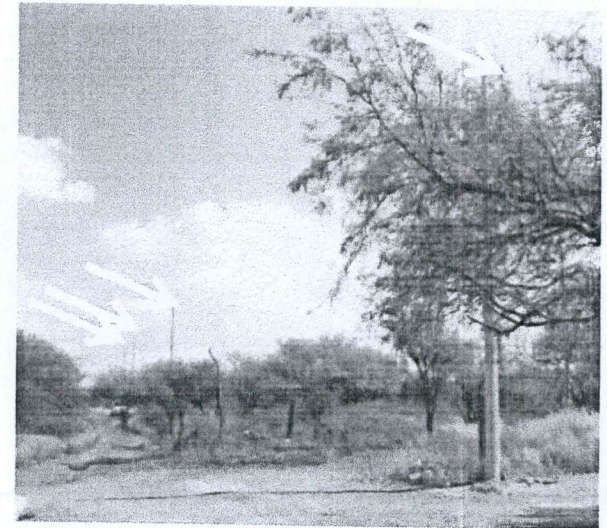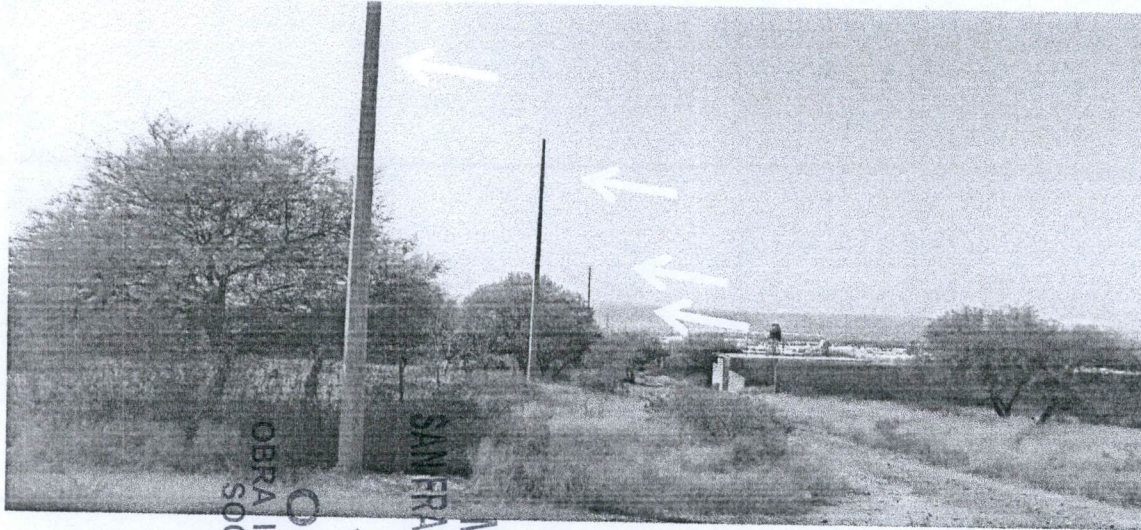

**MUNICIPIO DE**  
**SAN FRANCISCO DE LOS RINCONES**  
**OPERADO**  
**OBRA INFRA ESTRUCTURA**  
**SOCIAL MUNICIPAL**  
 2022

OBSERVACIONES :

RESIDENTE DE OBRA  
 Ing. Héctor Durón Esparza  
 Ecostrucciones, S.A. de C.V.


RESIDENTE DE SUPERVISION  
 Ing. J. Jesús Hernández Fuentes  
 Dirección de Obras Públicas

# BITACORA DE OBRA

HOJA \_\_\_\_\_

CONTRATO FISMDF 11-12/2022

OBRA FISMDF 12/2022

NOTA	4 NOV 2022
	A ESTA FECHA ESTA SUPERVISION HACE LA OBSERVACION DE LA ESTIMACION NOI LOS MONEDOS SE AUTORIZAN PARA SU PAGO, SE ENTREGA PREFACTURA CON EL SIGUIENTE CUERPO DE ESTIMACION Y ESTRUCTURA:
	<b>ESTIMACION #1</b>
MONTO BASE	86,892.35
AMORTIZACION	43,446.18
SUBTOTAL C/NA	50,397.56
RETENCIONES	868.91
TOTAL A PAGAR	49,528.65
<div style="margin-top: 20px;">  </div>	

MUNICIPIO DE  
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

2022.

**OPERADO**  
OBRA INFRA ESTRUCTURA  
SOCIAL MUNICIPAL
