



Usr: susana
Rep: rptPoliza

Municipio de San Francisco de los Romo
ESTADO DE AGUASCALIENTES

Póliza: C05488 Del 21/12/2022



Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2022 04:04 p. m.
Página | 1

Concepto: FISM 2022 PAGADO EST 6 FINIQUITO OBRA FISMDF 016/2022 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CA. GP Folio: 393

Beneficiario: **O.L. DISEÑO Y URBANIZACION, S.A. DE C.V.**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-2501-K023-J04-61402-2	CONSTRUCCIÓN Y/O	\$12,162.51		GP Folio: 393
0002	8260-2501-K023-J04-61402-2	CONSTRUCCIÓN Y/O		\$12,162.51	GP Folio: 393
0003	2113-000711	O.L. DISEÑO Y URBANIZACION,	\$12,162.51		GP Folio: 393
0004	1112-003-002	Bancomer Cta. 011793039-9 FISM		\$12,057.67	GP Folio: 393
0005	2117-9-005-001	0.1% COLEGIO DE		\$10.48	FISM 2022 PAGADO EST 6 FINIQUITO OBRA FISMDF 016/2022
0006	2117-9-005-002	0.2% ORGANO SUPERIOR DE		\$20.97	FISM 2022 PAGADO EST 6 FINIQUITO OBRA FISMDF 016/2022
0007	2117-9-005-003	0.2% INST. DE CAPACIT. DE LA		\$20.97	FISM 2022 PAGADO EST 6 FINIQUITO OBRA FISMDF 016/2022
0008	2117-9-005-004	0.5% CONTRALORIA MUNICIPAL		\$52.42	FISM 2022 PAGADO EST 6 FINIQUITO OBRA FISMDF 016/2022
Sumas iguales =>			24,325.02	24,325.02	

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
2022
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL



Fecha y hora de consulta

21/12/2022 2:58:25 PM

Contrato

00796395


Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada


Transferencia en proceso de validación y aplicación.



Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%



Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: EST 6 FISDMF 016

Importe de la operación: 12,057.67 MXP

Cuenta de retiro: 0117930399

Cuenta de depósito: 030010652246002018

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE SAN FRA NCISCO DE LOS ROMO

Titular de la cuenta: O L DISENO Y URBANIZACION SA D

Nombre banco destino: BAJIO

Fecha de creación: 21/12/2022


Fecha de aplicación: 21/12/2022

Concepto de pago: PAGO EST 6 FISDMF 11-016

Referencia numérica: 211222

Instrumento de seguridad: ASD 6550927880

Hora de captura en el canal: 14:58:17




Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000606221

Clave de rastreo: 002601002212210000606221

Folio de firma: 0027331033


Folio único: 1401202212211458170027331039



Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado



Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	21/12/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	21/12/2022

O.L. DISEÑO Y URBANIZACION

R.F.C.: ODU110201AR0
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición: C.P. 20266
Exportación: 01 No aplica

Tipo de Comprobante:

P Pago

Folio:

000034

Receptor: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Domicilio: FRANCISCO ROMO JIMENEZ 102 COL. SAN JOSE DE BUENAVISTA
Código Postal: 20300
Teléfono:
Email: arq.bsalarzar@gmail.com
Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
R.F.C.: MSF920130TQ9
Fecha y Hora de Emisión: 22-12-2022T17:52:15
Fecha y Hora de Timbrado: 22-12-2022T17:54:14
Número de Certificado: 00001000000506532310

Uso de CFDI: CP 01
Moneda: XXX
Tipo de Relación:
CFDI Relacionado:

Table with 6 columns: Clave SAT, Unidad SAT, Descripción, Cantidad, Valor Unitario, Importe. Row 1: 84111506, ACT, Pago, 1.00, 0.00, 0.00

Complemento para Recepción de Pagos versión 2.0

Fecha del Pago: 21/12/2022
Hora del Pago: 12:00:00
Forma del Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos
Moneda: MXN
Tipo de Cambio: 1.000000
Importe del Pago: 12,057.67
Número de Operación: 211222
Cuenta con la que se realizó el Pago:
RFC del Banco ordenante del Pago: BBA830831LJ2
Banco ordenante Extranjero:
Cuenta del Beneficiario: 0652246002
RFC del Banco destino del Pago: BBA940707IE1

Comprobantes Pagados:

Table with 11 columns: Folio, UUID, Moneda, Tipo de Cambio, Equivalencia, Parcialidad, Saldo Anterior, Importe Pagado, Saldo Insoluto, Objeto de Impuestos. Row 1: 000170, 40a546d7-db77-46ff-ae62-c70383b55912, MXN, 1.000000, 1.000000, 2, 12,057.67, 12,057.67, 0.00, 02

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
-- 2022
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.
PAGADO
FINANZAS

Handwritten signature in blue ink.

Total de Impuestos (Moneda MXN):

Table with 5 columns: Impuesto, Tipo Factor, Tasa o Cuota, Base, Importe. Row 1: IVA Traslado, Tasa, 0.160000, 10,394.54, 1,663.13

Importe con Letra:

DOCE MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS 67/100 MXN

UUID: 560710D6-BB99-480A-BA96-0B5BD7EA7B07
Número de Certificado del SAT: 00001000000504204971
RFC Proveedor Certificación: PPD101129EA3

Cadena Original: [Long alphanumeric string]
Sello Digital del Emisor: [Long alphanumeric string]
Sello Digital del SAT: [Long alphanumeric string]



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd
  http://www.sat.gob.mx/Pagos20 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pagos/Pagos20.xsd"
  xmlns:pago20="http://www.sat.gob.mx/Pagos20" Version="4.0" Folio="34" Fecha="2022-12-22T17:52:15"
  Sello="QfNAcVR4Y9Un1tyEXMrH1DCYHSLIoVSgeLwnaBmW1VHIekArUNcLNW5+7HMoo9ripRMhwk4qAQv9H8SNaeRLtFKUsquGhL8xOf3J2y8R
  NoCertificado="00001000000506532310"
  Certificado="MIIGDzCCA/egAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDY1MzIzMTAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwGEMSAwHgYDVQDDbBVVRPUk
  SubTotal="0" Moneda="XXX" Total="0" TipoDeComprobante="P" LugarExpedicion="20266" Exportacion="01">
  <cfdi:Emisor Rfc="ODU110201AR0" Nombre="O.L. DISEÑO Y URBANIZACION" RegimenFiscal="601" />
  <cfdi:Receptor Rfc="MSF920130TQ9" Nombre="MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO" DomicilioFiscalReceptor="20300"
  RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="CP01" />
- <cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto ClaveProdServ="84111506" Cantidad="1" ClaveUnidad="ACT" Descripcion="Pago" ValorUnitario="0" Importe="0"
  ObjetoImp="01" />
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Complemento>
  - <pago20:Pagos xmlns:pago20="http://www.sat.gob.mx/Pagos20" Version="2.0">
    <pago20:Totales MontoTotalPagos="12057.67" TotalTrasladosBaseIVA16="10394.54" TotalTrasladosImpuestoIVA16="1663.13" />
    - <pago20:Pago FechaPago="2022-12-21T12:00:00" FormaDePagoP="03" MonedaP="MXN" TipoCambioP="1" Monto="12057.67"
      NumOperacion="211222" RfcEmisorCtaOrd="BBA830831LJ2" RfcEmisorCtaBen="BBA940707IE1" CtaBeneficiario="0652246002">
      - <pago20:DoctoRelacionado IdDocumento="40a546d7-db77-46ff-ae62-c70383b55912" Folio="170" MonedaDR="MXN"
        EquivalenciaDR="1" NumParcialidad="2" ImpSaldoAnt="12057.67" ImpPagado="12057.67" ImpSaldoInsoluto="0.00"
        ObjetoImpDR="02">
        - <pago20:ImpuestosDR>
          - <pago20:TrasladosDR>
            <pago20:TrasladoDR BaseDR="10394.54" ImpuestoDR="002" TipoFactorDR="Tasa" TasaOCuotaDR="0.160000"
            ImporteDR="1663.13" />
          </pago20:TrasladosDR>
          </pago20:ImpuestosDR>
        </pago20:DoctoRelacionado>
        - <pago20:ImpuestosP>
          - <pago20:TrasladosP>
            <pago20:TrasladoP BaseP="10394.54" ImpuestoP="002" TipoFactorP="Tasa" TasaOCuotaP="0.160000"
            ImporteP="1663.13" />
          </pago20:TrasladosP>
          </pago20:ImpuestosP>
        </pago20:Pago>
      </pago20:Pagos>
    <tfd:TimbreFiscalDigital FechaTimbrado="2022-12-22T17:54:14" NoCertificadoSAT="00001000000504204971"
      RfcProvCertif="PPD101129EA3"
      SelloCFD="QfNAcVR4Y9Un1tyEXMrH1DCYHSLIoVSgeLwnaBmW1VHIekArUNcLNW5+7HMoo9ripRMhwk4qAQv9H8SNaeRLtFKUsquGhL8xOf
      SelloSAT="ezCAHmBG4BLSR2DCTn9XtQrE8+6Yxan3liDuOUjUnI2EPoTAo6Z/4uqz9SMLlf3/+YkqpJhJcEu/ToCWL8iR6uTyDxkf/rKaG9sbag/
      UUID="560710D6-BB99-480A-BA96-0B5BD7EA7B07" Version="1.1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
      xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" />
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

-- 2022

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

CÉDULA DE SEGUIMIENTO A ESTIMACIONES DE OBRA

Ayuntamiento de
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
2021 • 2024



DATOS GENERALES

CONTRATISTA: O. L. DISEÑO Y URBANIZACION, S. A. DE C. V.	N° DE CONTRATO: FISMDF 016/2022
SUPERVISOR: Carlos Armando Chavez Garcia	N° DE OBRA: FISMDF 016/2022
OBRA: Rehabilitacion de Red de Agua Potable en la Calle Argentina entre Calle Mexico y Calle Bolivia	N° DE FACTURA: 000170
	N° DE ESTIMACION: 6 (seis)
FECHA DE CORTE: DEL: 19.sep.2022 AL: 03.oct.2022	IMPORTE LIQUIDO: \$ 12,057.67

FORMATO DE NÚMEROS GENERADORES

INGRESO	REVISIÓN	NOTA	CAPTURA EN SISTEMA	ENTREGA DE PRE-FACTURA
JA 24/10/2022 CONTRATISTA	<i>[Firma]</i> 03/11/2022 SUPERVISOR	Sr. contratista regrese esta cédula con la estimación original de lo contrario no se le dara tramite	<i>[Firma]</i> 03/11/2022 SUPERVISOR	<i>[Firma]</i> 03/11/2022 SUPERVISOR

FORMATO DE ESTIMACIÓN

INGRESO	REGISTRO	SUPERVISOR		OPERADO	JEFE DE DEPARTAMENTO
JA 20/12/2022 CONTRATISTA	<i>[Firma]</i> 20/12/2022 CONTROL DE ESTIMACIONES	<i>[Firma]</i> 20/12/2022 RECIBIDO	<i>[Firma]</i> 20/12/2022 AUTORIZADO	2022 MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	<i>[Firma]</i> ARQ. ALFREDO FLORES MARMOLEJO 20/12/2022 RECIBIDO

DEVOLUCIÓN

FECHA DE DEVOLUCIÓN: 03/11/2022
 FECHA DE REINGRESO: 20/12/2022
 MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN: falta fianza

CONTENIDO

CÁRATULA
RESUMEN
CONCEPTOS
ESTADO DE CUENTA
CONCENTRADO DE CONCEPTOS (FIN)
GENERADORES Y RESUMEN
CROQUIS
FOTOGRAFIAS
ANALISIS PRECIO UNITARIO
REPORTE(S) DE LABORATORIO
FIANZA(S) (FIN)
NOTA DE BITACORA DE OBRA

DIRECTOR GENERAL

[Firma]
ING. JOSÉ DE JESÚS CHAVEZ GARCÍA
20/12/2022
RECIBIDO

FINANZAS

RECIBIDO AUTORIZADO

TRÁMITE DE PAGO

FECHA DE INICIO DE TRÁMITE EN DOP-SFR	FIRMA DEL DIRECTOR	OFICIO DE LIBERACIÓN	FECHA DE ENTREGA
24 10 22 DÍA: MES: AÑO:	<i>[Firma]</i> 20 12 22 DÍA: MES: AÑO:	20 12 22 DÍA: MES: AÑO:	DIRECCIÓN DE EGRESOS.

PRE-FACTURA De Cierre



PRE-FACTURA DEL CONTRATISTA:

O.L. DISEÑO Y URBANIZACION, S.A. DE C.V. (330)

A NOMBRE DE: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 RFC: MSF920130TQ9
 DIRECCION: FCO ROMO JIMENEZ 102, SAN JOSE DE BUENAVISTA, SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS,
 CIUDAD: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE L ESTADO: AGUASCALIENTES

DESCRIPCION

PAGO DE LA ESTIMACION No. 6 Del 19 Sep 2022 al 03 Oct 2022
 DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ARGENTINA ENTRE LA CALLE MÉXICO Y CALLE BOLIVIA
 UBICADA EN: COLONIA PANAMERICANO CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO
 CON AMPARO DEL CONTRATO No.: FIS MDF 016/2022
 DE FECHA: 18/07/2022
 BAJO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA:

Inversion Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal 2022
 Programa SC AGUA POTABLE
 SubPrograma 01 REHABILITACION
 Obra. FIS MDF 016/2022 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ARGENTINA ENTRE LA CALLE MÉXICO Y CALLE
 Localizacion COLONIA PANAMERICANO CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE

MONTO BASE	\$10,484.92
AJUSTE DE COSTOS (+)	\$0.00
AMORTIZACION DE ANTICIPO (-)	\$0.00
SUBTOTAL	\$10,484.92
IVA (+)	\$1,677.59
SUBTOTAL CON IVA	\$12,162.51

CAPACITACION DE LOS TRABAJADORES DEL CONTRATISTA	\$20.97 (0.20%)
COLEGIOS DE PROFESIONISTAS SEGUN CORRESPONDA	\$10.48 (0.10%)
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	\$0.00 (0.00%)
FISCALIZACION DEL H. CONGRESO DEL ESTADO	\$20.97 (0.20%)

TOTAL DE RETENCIONES (-)	\$104.84
SANCION POR RETRASO (-)	\$0.00
SUBTOTAL MENOS RETENCIONES	\$12,057.67
RETENCION POR RETRASO(-)	\$0.00
REINTEGRO POR RETENCION	\$0.00
OTRAS SANCIONES(-)	\$0.00
TOTAL A PAGAR	\$12,057.67

Avance Físico Real % INSPECCION DE VIGILANCIA PARA LA CONTRALORIA \$52.42 (0.50%)
 Avance Físico Programado % SERVICIOS RELATIVOS ALAS CONSTRUCCIONES \$0.00
 Fecha Terminación Prog. \$104.84


DOCE MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS 67/100 M.N.

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 2022


ESTADO DE CUENTA

Obra.	FISDMF 016/2022 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ARGENTINA ENTRE LA CALLE MÉXICO Y CALLE BOLIVIA		Total Contrato	853,632.47
Localización	COLONIA PANAMERICANO CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE		Total Ampliaciones	12,162.51
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura So		Total Contratado	865,794.98
Programa	SC AGUA POTABLE		Anticipo (%)	426,816.24
SubPrograma	01 REHABILITACION		Estimado Anterior	853,632.47
Contratista	O.L. DISEÑO Y URBANIZACION, S.A. DE C.V. (330)		Esta Estimación	12,162.51
Contrato	FISDMF 016/2022 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ARGENTINA ENTRE LA CALLE MÉXICO Y CALLE BOLIVIA		Total Estimado	865,794.98
Estimación No.	6 Del 19 Sep 2022 al 03 Oct 2022		Total por Estimar	0.00

No. Estimac.	Período	Importe Estimación	Amortización de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA (+)	Cargo a la Obra	DEDUCCIONES (-)					Retención (-)	Reintegro (+)	Sanciones (-)	Importe a Pagar	
							CMIC(0)	Coín.Prof.(0)	SEP(0.5)	Cono. Edo.(0.2)	Municipal					ISRuOtro(0)
Anticipo				367,945.03	58,871.21	426,816.24									426,816.24	
1	Del 05 Ago 2022 al 19 Ago	141,838.69	70,919.35	297,025.68	11,347.09	82,266.43	283.68	141.84	0.00	283.68	709.19	0.00	0.00	0.00	0.00	80,848.04
2	Del 20 Ago 2022 al 03 Sep	19,821.97	9,910.99	287,114.69	1,585.76	11,496.74	39.64	19.82	0.00	39.64	99.11	0.00	0.00	0.00	0.00	11,298.53
3	Del 04 Sep 2022 al 18 Sep	202,116.92	101,058.46	186,056.23	16,169.35	117,227.81	404.23	202.12	0.00	404.23	1,010.58	0.00	0.00	0.00	0.00	115,206.65
4	Del 19 Sep 2022 al 03 Oct	242,282.69	121,141.35	64,914.88	19,382.61	140,523.95	484.57	242.28	0.00	484.57	1,211.41	0.00	0.00	0.00	0.00	138,101.12
5	Del 19 Sep 2022 al 03 Oct	129,829.79	64,914.88	0.00	10,386.39	75,301.30	259.66	129.83	0.00	259.66	649.15	0.00	0.00	0.00	0.00	74,003.00
6	Del 19 Sep 2022 al 03 Oct	10,484.92	0.00	0.00	1,677.59	12,162.51	20.97	10.48	0.00	20.97	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00	12,057.67
TOTALES		746,374.98	367,945.03		119,420.00	865,794.98	1,492.75	746.37	0.00	1,492.75	3,731.86	0.00	0.00	0.00	0.00	858,331.25



MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 2022
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL



RESUMEN DE ESTIMACION

Obra.	FISMDF 016/2022 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ARGENTINA ENTRE LA CALLE MÉXICO Y CALLE BOLIVIA	Total Contrato	\$853,632.47
Localizacion	COLONIA PANAMERICANO CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE	Total Ampliaciones	\$12,162.51
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal.	Total Contratado	\$865,794.98
Programa	SC AGUA POTABLE	Anticipo (50)%	\$426,816.24
SubPrograma	01 REHABILITACION	Estimado Anterior	\$853,632.47
Supervisor	CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA (CAGC9207139Q5)	Esta Estimacion	\$12,162.51
Contratista	O.L. DISEÑO Y URBANIZACION, S.A. DE C.V. (330)	Total Estimado	\$865,794.98
Contrato	FISMDF 016/2022 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ARGENTINA ENTRE LA CALLE MÉXICO Y CALLE BOLIVIA	Saldo por Estimar	\$0.00
Estimacion No.	6 (De Cierre)		
Recibí de	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO la Cantidad de: \$12,162.51 DOCE MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 51/100 M.N.		

GRUPO	PARTIDA		
* EXTRAORDINARIOS			\$11,753.30
	- EXTRAORDINARIOS		\$11,753.30
* INDIRECTOS NO EJECUTADOS			\$-1,268.38
	- INDIRECTOS NO EJECUTADOS		\$-1,268.38
Fecha Terminación Prog.		SUMA	\$10,484.92
		AJUSTE DE COSTOS (+)	\$0.00
		AMORTIZACION DE ANTICIPO (-)	\$0.00
		SUBTOTAL	\$10,484.92
		IVA (+)	\$1,677.59
		SUBTOTAL CON IVA	\$12,162.51

O.L. DISEÑO Y URBANIZACION, S.A. DE C.V. (ODU110201AR0)

Contratista

INGENIERO CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA

(CAGC9207139Q5)
SUPERVISOR

CONCEPTOS DE ESTIMACION



De Cierre

Obra.	FISDMF 016/2022 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ARGENTINA ENTRE LA CALLE MÉXICO Y CALLE BOLIVIA				Total Contrato	\$853,632.47
Localizacion	COLONIA PANAMERICANO CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE				Total Ampliaciones	\$12,162.51
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal.				Total Contratado	\$865,794.98
Programa	SC AGUA POTABLE				Anticipo (50)%	\$426,816.24
SubPrograma	01 REHABILITACION				Estimado Anterior	\$853,632.47
Supervisor	CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA (CAGC9207139Q5)				Esta Estimacion	\$12,162.51
Contratista	O.L. DISEÑO Y URBANIZACION, S.A. DE C.V. (330)				Total Estimado	\$865,794.98
Contrato	FISDMF 016/2022	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ARGENTINA ENTRE LA CALLE MÉXICO Y			Saldo por Estimar	\$0.00
Estimacion No.	6 (De Cierre)	CALLE BOLIVIA	Del 19 Sep 2022 al 03 Oct 2022			
Recibí de	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	la Cantidad de:	\$12,162.51 DOCE MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 51/100 M.N.			

No.	Concepto	Unid. Mer	Volumen				Precio Contratado	Importe
			Contratado	Acumulado	Anterior	Actual		

GRUPO: INDIRECTOS NO EJECUTADOS

PARTIDA: INDIRECTOS NO EJECUTADOS

26	Indirecto por administración de obra por el convenio de ampliación en monto por la cantidad de \$12,162.51	IN	0.00	-1.00	0.00	-1.00	\$1,268.38	\$-1,268.38
----	--	----	------	-------	------	-------	------------	-------------

Total Partida **\$-1,268.38**
Total Grupo **\$-1,268.38**

GRUPO: EXTRAORDINARIOS

PARTIDA: EXTRAORDINARIOS

39	REPOSICION DE BANQUETA EN MAL ESTADO EN DIFERENTES AREAS, A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HUMEDECIDO, COLADO, TERMINADO RAYADO, CURADO CON CURACRETO, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, TRABAJO TERMINADO.	M2.	0.00	66.75	36.29	30.46	\$385.90	\$11,753.30
----	--	-----	------	-------	-------	-------	----------	-------------

Total Partida **\$11,753.30**
Total Grupo **\$11,753.30**

Total Presupuestado **\$10,484.92**
Ajuste de Costos **\$0.00**
Total **\$10,484.92**

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 2022

O.L. DISEÑO Y URBANIZACION, S.A. DE C.V. (ODU110201AR0)
 CONTRATISTA

INGENIERO CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA
 (CAGC9207139Q5)
 SUPERVISOR

CONCENTRADO DE ESTIMACIONES

Obra. REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ARGENTINA ENTRE LA CALLE MÉXICO Y CALLE BOLIVIA
 Localización COLONIA PANAMERICANO CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE
 Supervisor INGENIERO CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA (CAGC920713BQ5)
 Contratista O.L. DISEÑO Y URBANIZACION, S.A. DE C.V. (330)
 Contrato FISMDF 016/2022

Total Contrato \$853,632.47
 Total Ampliaciones \$12,162.51
 Total Contratado \$865,794.98
 Anticipo (50)% \$426,816.24
 Total Estimado \$865,794.98

No.	Concepto	Unid. Med.	Volumen Contratado	Importe Contratado	Volumen Estimac. 1	Volumen Estimac. 2	Volumen Estimac. 3	Volumen Estimac. 4	Volumen Estimac. 5	Volumen Estimac. 6	Volumen Exedente	Volumen Total	Importe Total
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ARGENTINA ENTRE LA CALLE MÉXICO Y CALLE BOLIVIA													
RED DE AGUA POTABLE													
1	SONDEO PARA LOCALIZACIÓN DE REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, TELEFÓNICAS Y/O ELÉCTRICAS EXISTENTES. I	SON DE	2.00	\$581.32	3.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	6.00	8.00	\$4,650.56
2	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO. INCLUYE: EQUIPO TOPGRÁFICO NECESARIO	m	365.15	\$10.75	366.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68	366.83	\$3,943.42
3	CORTE CON DISCO DIAMANTADO DE 14" EN PAVIMENTO Y/O BANQUETA EXISTENTE (HASTA 8.00 cm. DE PROFUNDIDA	m	696.70	\$26.34	115.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-580.78	115.92	\$3,053.33
4	DEMOLICION A MAQUINA DE PAVIMENTO (CONCRETO, ASFALTO Y/O EMPEDRADO) EXISTENTE Y/O BANQUETA (DE HAST	M3	36.57	\$360.24	49.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.86	49.43	\$17,806.66
5	EXCAVACIÓN DE ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO II. INCLUYE: AFINE CON MAQUINA, MANO DE OB	M3	243.85	\$77.71	63.75	46.85	0.00	46.56	0.00	0.00	-86.69	157.16	\$12,212.90
6	CARGA Y ACARREO EN CAMION AL TIRADERO OFICIAL DE MATERIAL MIXTO AL TIRADERO OFICIAL, ZONA URBANA, S	M3	280.42	\$36.77	113.18	46.85	0.00	46.56	0.00	0.00	-73.83	206.59	\$7,596.31
7	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUE	M3/K M	1,121.68	\$14.84	418.77	173.35	0.00	172.27	0.00	0.00	-357.29	764.39	\$11,343.55
8	PLANTILLA CON ARENA CON UN ESPESOR DE 10 CM. INCLUYE: ACOMODADO Y COMPACTADO ASÍ COMO ACARREO LIBRE	M3	25.56	\$688.16	7.50	0.00	5.45	5.45	0.00	0.00	-7.16	18.40	\$12,662.14
9	RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM CON BAILARINA EN CAPAS DE HASTA 20 cm. DE ESPESOR.	M3	169.03	\$372.72	39.75	0.00	28.93	29.05	0.00	0.00	-71.30	97.73	\$36,425.93
10	RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM CON BAILARINA EN CAPAS DE HASTA 20 cm. DE ESPESOR.	M3	48.27	\$378.67	15.00	0.00	10.91	10.95	0.00	0.00	-11.91	36.86	\$13,957.78
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED HIDRÁULICA DE PVC RD 26 DE 3" DE DIÁMETRO, INCLUYE : PRUEBA HIDROST	m	365.25	\$204.22	149.36	0.00	108.80	104.65	0.00	0.00	-2.34	362.81	\$74,093.06
TOMAS DOMICILIARIAS													
12	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO. INCLUYE: EQUIPO TOPGRÁFICO NECESARIO	m	257.46	\$10.75	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-244.49	12.97	\$139.43
13	CORTE CON DISCO DIAMANTADO DE 14" EN PAVIMENTO Y/O BANQUETA EXISTENTE (HASTA 8.00 cm. DE PROFUNDIDA	m	430.22	\$26.34	12.97	0.00	0.00	5.11	18.08	0.00	-394.08	36.16	\$952.45
14	DEMOLICION A MAQUINA DE PAVIMENTO (CONCRETO, ASFALTO Y/O EMPEDRADO) EXISTENTE Y/O BANQUETA (DE HAST	M3	20.46	\$360.24	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20.46	0.27	\$97.26
15	EXCAVACIÓN DE ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO II. INCLUYE: AFINE CON MAQUINA, MANO DE OB	M3	66.86	\$77.71	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-64.82	1.24	\$96.36
16	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II 0.00 A 2.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD	M3	16.51	\$433.39	0.71	0.00	0.00	0.36	19.32	0.00	3.88	20.39	\$8,836.82
17	CARGA Y ACARREO EN CAMION AL TIRADERO OFICIAL DE MATERIAL MIXTO AL TIRADERO OFICIAL, ZONA URBANA, S	M3	103.30	\$36.77	2.22	0.00	0.00	0.00	29.33	0.00	-71.75	31.55	\$1,160.09

OPERADO POR
 OBRA INFRA ESTRUCTURAL
 SOCIAL MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 2022

18	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECU	M3/K M	413.20	\$14.84	8.21	0.00	0.00	0.00	108.52	0.00	-296.47	116.73	\$1,732.27
19	RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO AL 90% DE SU PVS CON BAILARINA EN CAPAS DE HASTA 20 cm. DE ESPESOR.	M3	65.68	\$372.72	14.07	0.00	8.66	17.41	19.32	0.00	-6.22	59.46	\$22,161.93
20	RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% DE SU PVS CON BAILARINA EN CAPAS DE HASTA 20 cm. DE ESPESOR.	M3	25.40	\$378.67	10.52	0.00	6.01	6.99	0.00	0.00	-1.88	23.52	\$8,906.32
21	CONSTRUCCION DE TOMA DOMICILIARIA DE LONGITUD PROMEDIO 1.00 M, (NOMINAL) A BASE DE TUBO KITEC DE 1/	pieza	43.00	\$824.88	22.00	13.00	0.00	12.00	0.00	0.00	4.00	47.00	\$38,769.36
22	CONSTRUCCION DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE TUBO KITEC DE 1/2" AZUL INCLUYE: ENCAMISADO CON POLIDUC	m	214.46	\$117.60	129.60	0.00	71.84	71.59	0.00	0.00	58.57	273.03	\$32,108.33
GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO													
23	PAVIMENTO HIDRÁULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-38 KG/CM2, T.M.A. 1 1/2" RR 7 DÍAS, GRAVA TR	M2	535.70	\$616.88	0.00	0.00	223.27	262.25	-485.52	0.00	-535.70	0.00	\$0.00
24	GUARNICIÓN DE 15X20X40 CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OB	m	15.00	\$377.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15.00	0.00	\$0.00
25	LIMPIEZA FINAL , INCLUYE: BARRIDO CON AGUA , MATERIALES, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBR	M2	356.89	\$14.12	0.00	0.00	552.87	338.46	102.84	0.00	637.28	994.17	\$14,037.68
INDIRECTOS NO EJECUTADOS													
INDIRECTOS NO EJECUTADOS													
26	Indirecto por administración de obra por el convenio de ampliación en monto por la cantidad de \$12,	IN	0.00	\$1,268.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	-1.00	-1.00	\$-1,268.38
EXTRAORDINARIOS													
EXTRAORDINARIOS													
27	CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS TIPO II SEGUN ESPECIFICACIONES PARA VALVULA DE 75 - 150 mm, 0.90 x	PZA	0.00	\$15,232.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	\$15,232.53
28	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA FoFo, VASTAGO FIJO DE 3", INCLUYE: INSTALACION EN LINEA VIVA, A	PZA	0.00	\$5,750.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	\$5,750.47
29	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD CAMPANA DE 3" DE DIAMETRO RD 26, INCLUYE: INSTALACION E	PZA	0.00	\$420.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	\$841.90
30	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE REPARACION DE 3" DE DIAMETRO RD 26, INCLUYE: INSTA	PZA	0.00	\$296.59	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	8.00	\$2,372.72
31	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC HIDRAULICO RD DE 3"X3"X3", INCLUYE: INSTALACION EN LINEA V	PZA	0.00	\$897.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	\$1,795.44
32	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ DE PVC HIDRAULICO RD DE 3"X3"X3"X3", INCLUYE: INSTALACION EN LI	PZA	0.00	\$1,291.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	\$1,291.27
33	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPANA DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 3" PARA CORTE DE LINEA DE AGUA	PZA	0.00	\$294.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	\$1,470.50
34	RETIRO DE VALVULA COMPUERTA VASTAGO FIJO DE 3" EN MAL ESTADO, EN LINEA DE AGUA VIVA, INCLUYE:	PZA	0.00	\$456.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	\$456.47
35	DEMOLICION CONTROLADA DE CAJA DE VALVULA TPIO II DE 0.90X1.00mX1.00m DE ALTO, EXISTENTE DE F	PZA	0.00	\$1,733.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	\$1,733.65
36	DEMOLICION A MANO CON MARRO, CINCEL Y ROMPEDOR MANUAL DE CONCRETO SIMPLE EN BANQUETAS, CON UN ESPES	M2	0.00	\$100.41	0.00	0.00	0.00	0.00	168.27	0.00	168.27	168.27	\$16,895.99
37	REPOSICION DE BANQUETA EN TOMAS DOMICILIARIAS A BASE DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 HECHO EN OBRA D	M2	0.00	\$467.57	0.00	0.00	0.00	0.00	57.66	0.00	57.66	57.66	\$26,960.09
38	INSTALACION DE TOMAS DE AGUA DOMICILIARIAS DE FORMA PROVISIONAL EN CASAS HABITACION, A BA	TOM A	0.00	\$277.25	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	\$8,317.50
39	REPOSICION DE BANQUETA EN MAL ESTADO EN DIFERENTES AREAS, A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG	M2.	0.00	\$385.90	0.00	0.00	0.00	0.00	36.29	30.46	66.75	66.75	\$25,759.34
40	FORJADO DE RAMPA PARA DISCAPACITADOS EN BANQUETA, A	M2.	0.00	\$20,235.72	0.00	0.00	0.00	0.00	24.12	0.00	24.12	24.12	\$20,235.72

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

2022



MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]


BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 DE

41	INTERCONEXIÓN A RED HIDRÁULICA MUNICIPAL EXISTENTE. INCLUYE: CORTE DE TUBERÍA EN LÍNEA VIVA, ACHICU	PZA	0.00	\$1,118.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	\$2,236.26
42	PAVIMENTO HIDRÁULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-38 KG/CM2, T.M.A. 1 1/2" RR 7 DÍAS, GRAVA TR	M2	0.00	\$596.37	0.00	0.00	0.00	0.00	485.52	0.00	485.52	485.52	\$289,549.56



MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS RÍOS
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL
2022






NUMEROS GENERADORES

NO. DE OBRA:	FISMDF 016/2022
NO. DE CONTRATO:	FISMDF 016/2022
DESCRIPCIÓN:	FISMDF 016/2022 - REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ARGENTINA
UBICACIÓN:	ENTRE LA CALLE MÉXICO Y CALLE BOLIVIA COLONIA PANAMERICANO CABECERA MUNICIPAL EN EL MUN

ESTIMACION NO. 1

CROQUIS


39 REPOSICION DE BANQUETA EN MAL ESTADO EN DIFERENTES AREAS, A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HUMEDECIDO, COLADO, TERMINADO RAYADO, CURADO CON CURACRETO, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, TRABAJO TERMINADO.

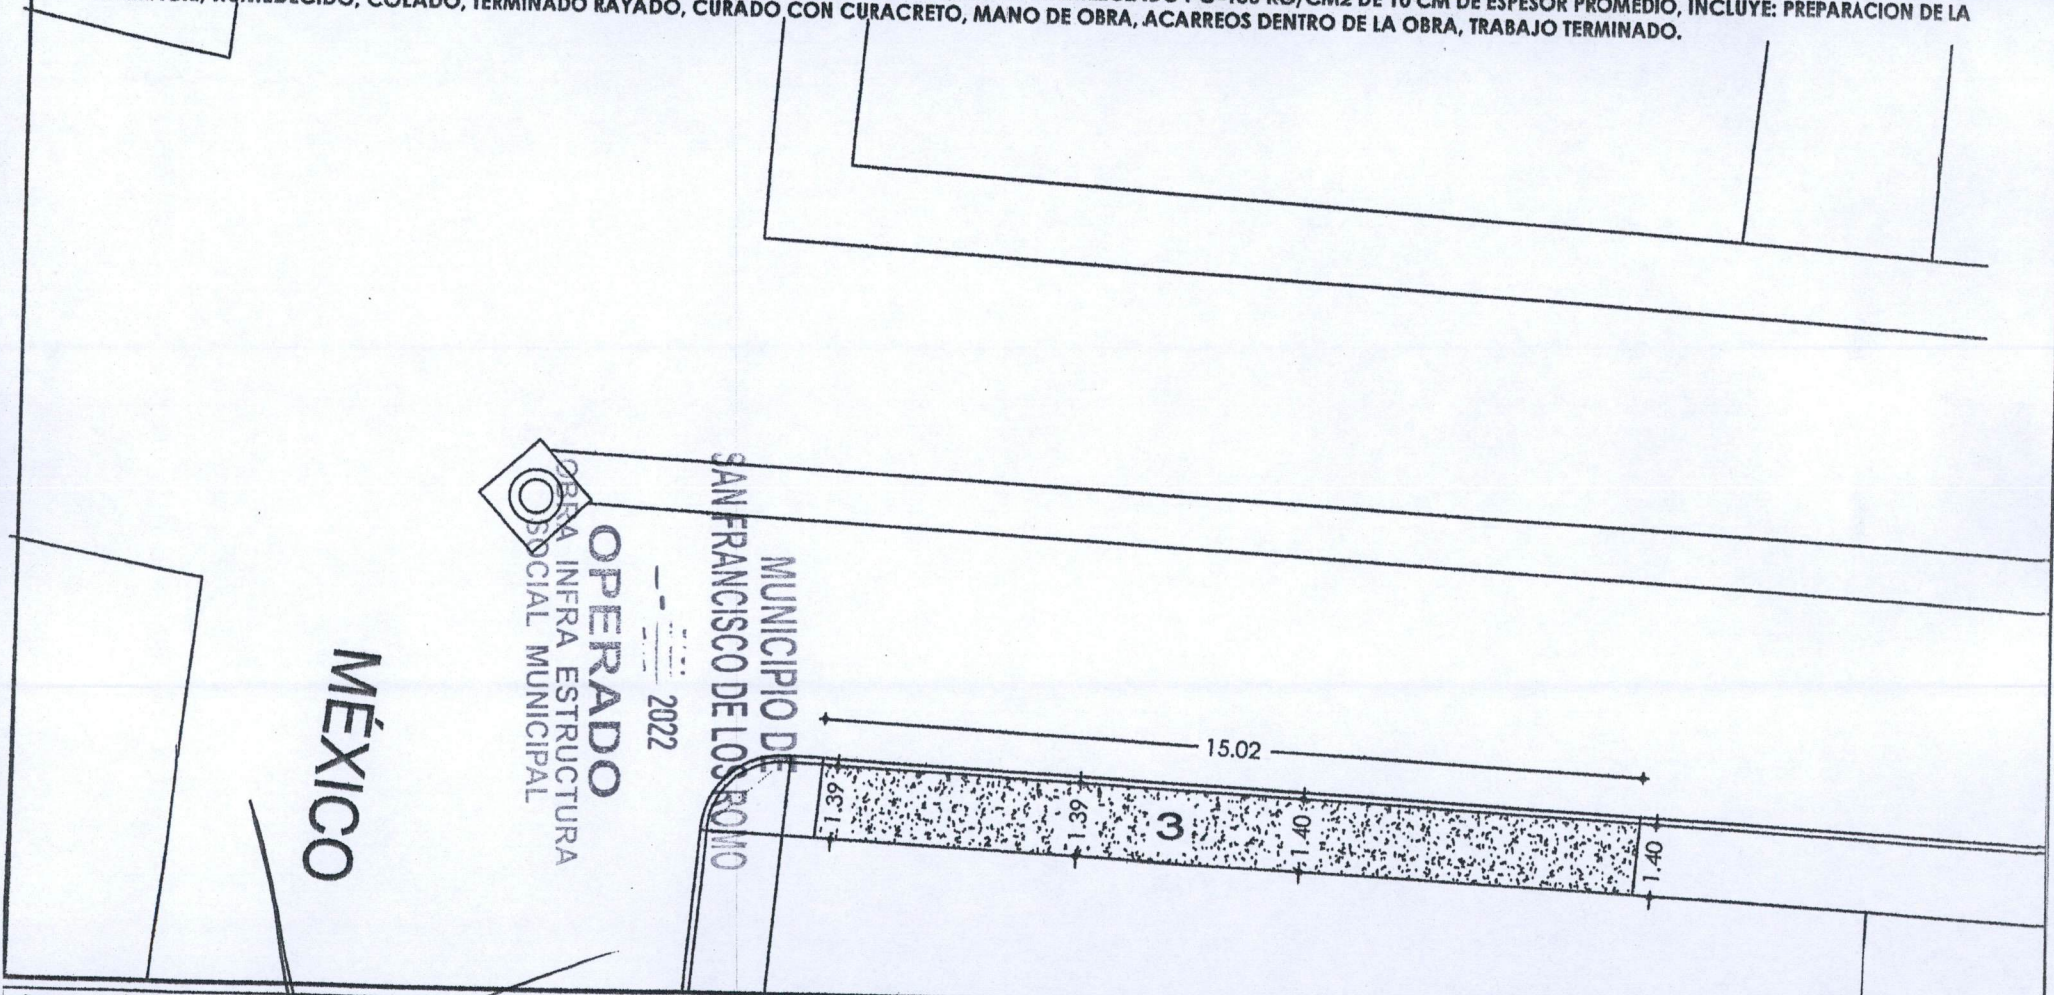

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA
 O.L. DISEÑO Y URBANIZACION, S.A. DE C.V

RESIDENTE DE SUPERVISION
 Ing. Carlos Armando Chavez Garcia
 Dir. Obras Publicas




NUMEROS GENERADORES

NO. DE OBRA:	FISMDF 016/2022
NO. DE CONTRATO:	FISMDF 016/2022
DESCRIPCIÓN:	FISMDF 016/2022 - REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ARGENTINA
UBICACIÓN:	ENTRE LA CALLE MÉXICO Y CALLE BOLIVIA COLONIA PANAMERICANO CABECERA MUNICIPAL EN EL MUN

39 REPOSICION DE BANQUETA EN MAL ESTADO EN DIFERENTES AREAS. A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HUMEDECIDO, COLADO, TERMINADO RAYADO, CURADO CON CURACRETO, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, TRABAJO TERMINADO.


MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS RIOS
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURAS
SOCIAL MUNICIPAL
2022

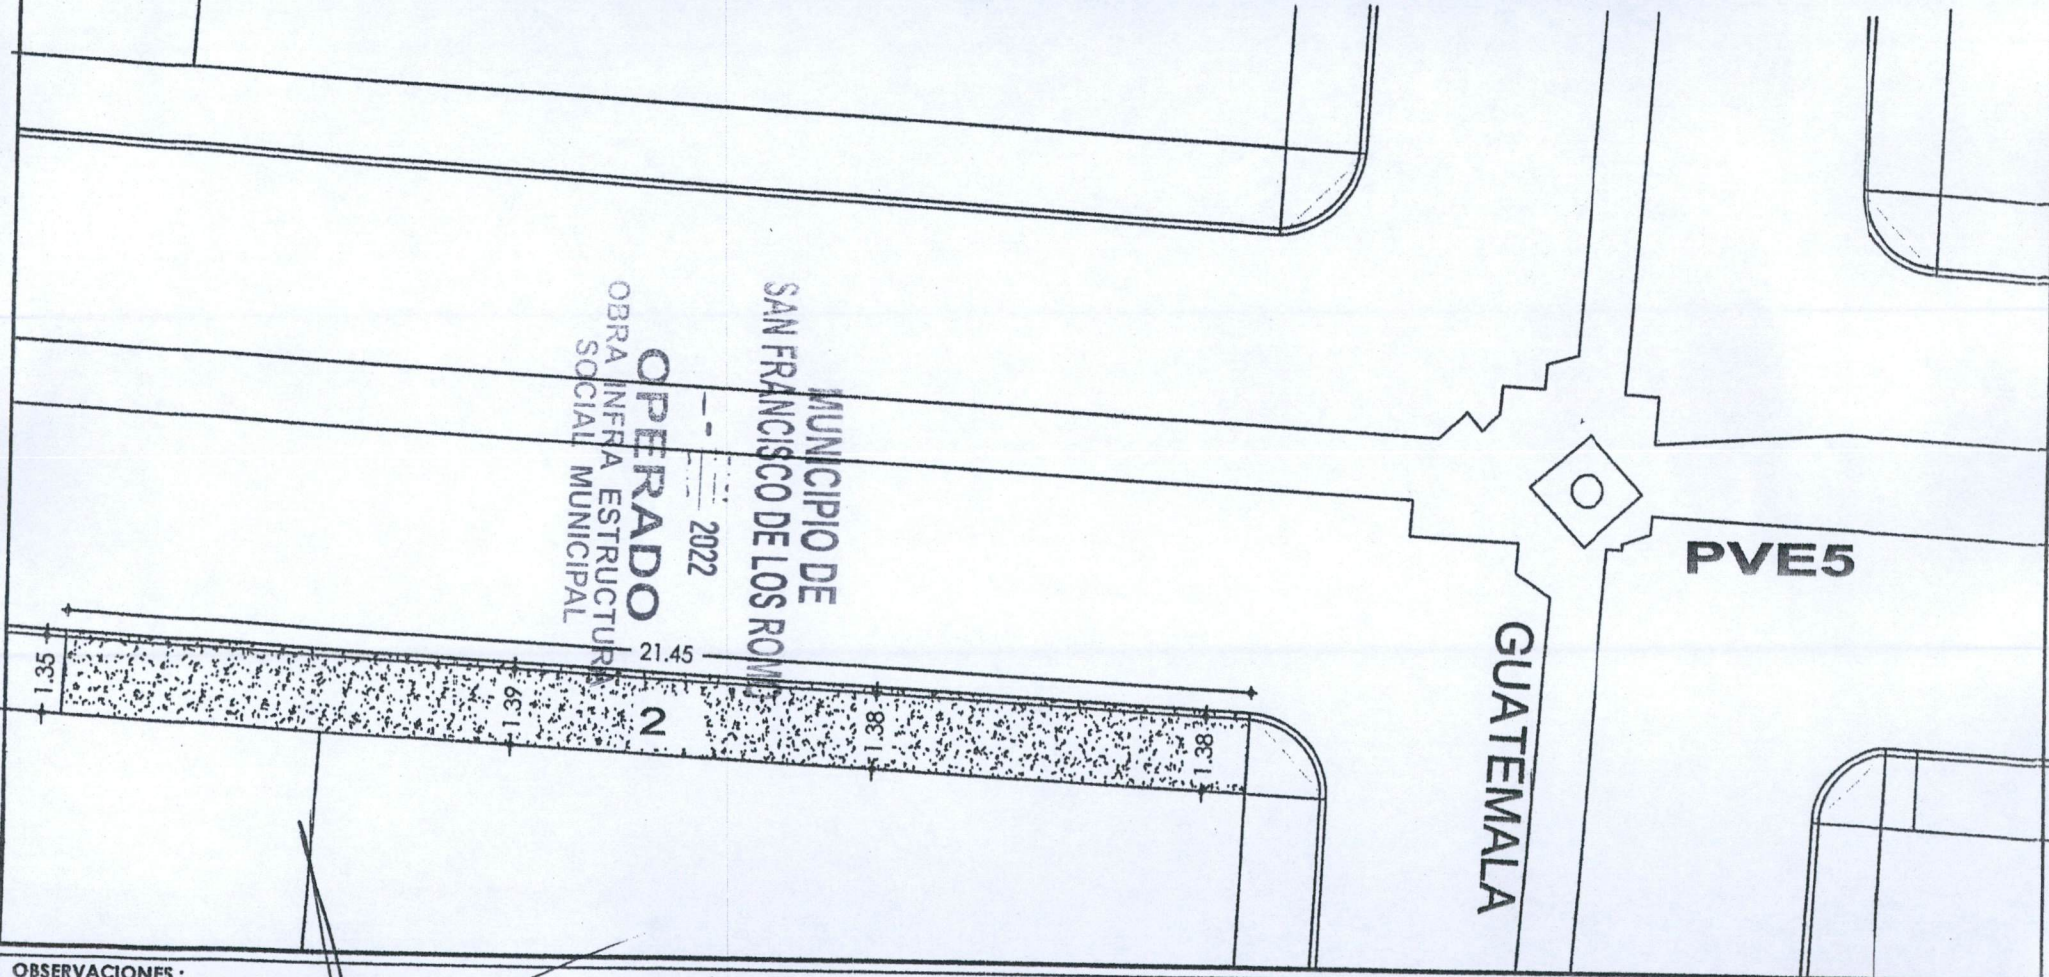

OBSERVACIONES :

RESIDENTE DE OBRA
O.L. DISEÑO Y URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE SUPERVISION
Ing. Carlos Amando Chavez Garcia
Dir. Obras Publicas




NUMEROS GENERADORES

NO. DE OBRA:	FISMDF 016/2022
NO. DE CONTRATO:	FISMDF 016/2022
DESCRIPCIÓN:	FISMDF 016/2022 - REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ARGENTINA
UBICACIÓN:	ENTRE LA CALLE MÉXICO Y CALLE BOLIVIA COLONIA PANAMERICANO CABECERA MUNICIPAL EN EL MUN

ESTIMACION NO. 1

CROQUIS

39 REPOSICION DE BANQUETA EN MAL ESTADO EN DIFERENTES AREAS, A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HUMEDECIDO, COLADO, TERMINADO RAYADO, CURADO CON CURACRETO, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, TRABAJO TERMINADO.

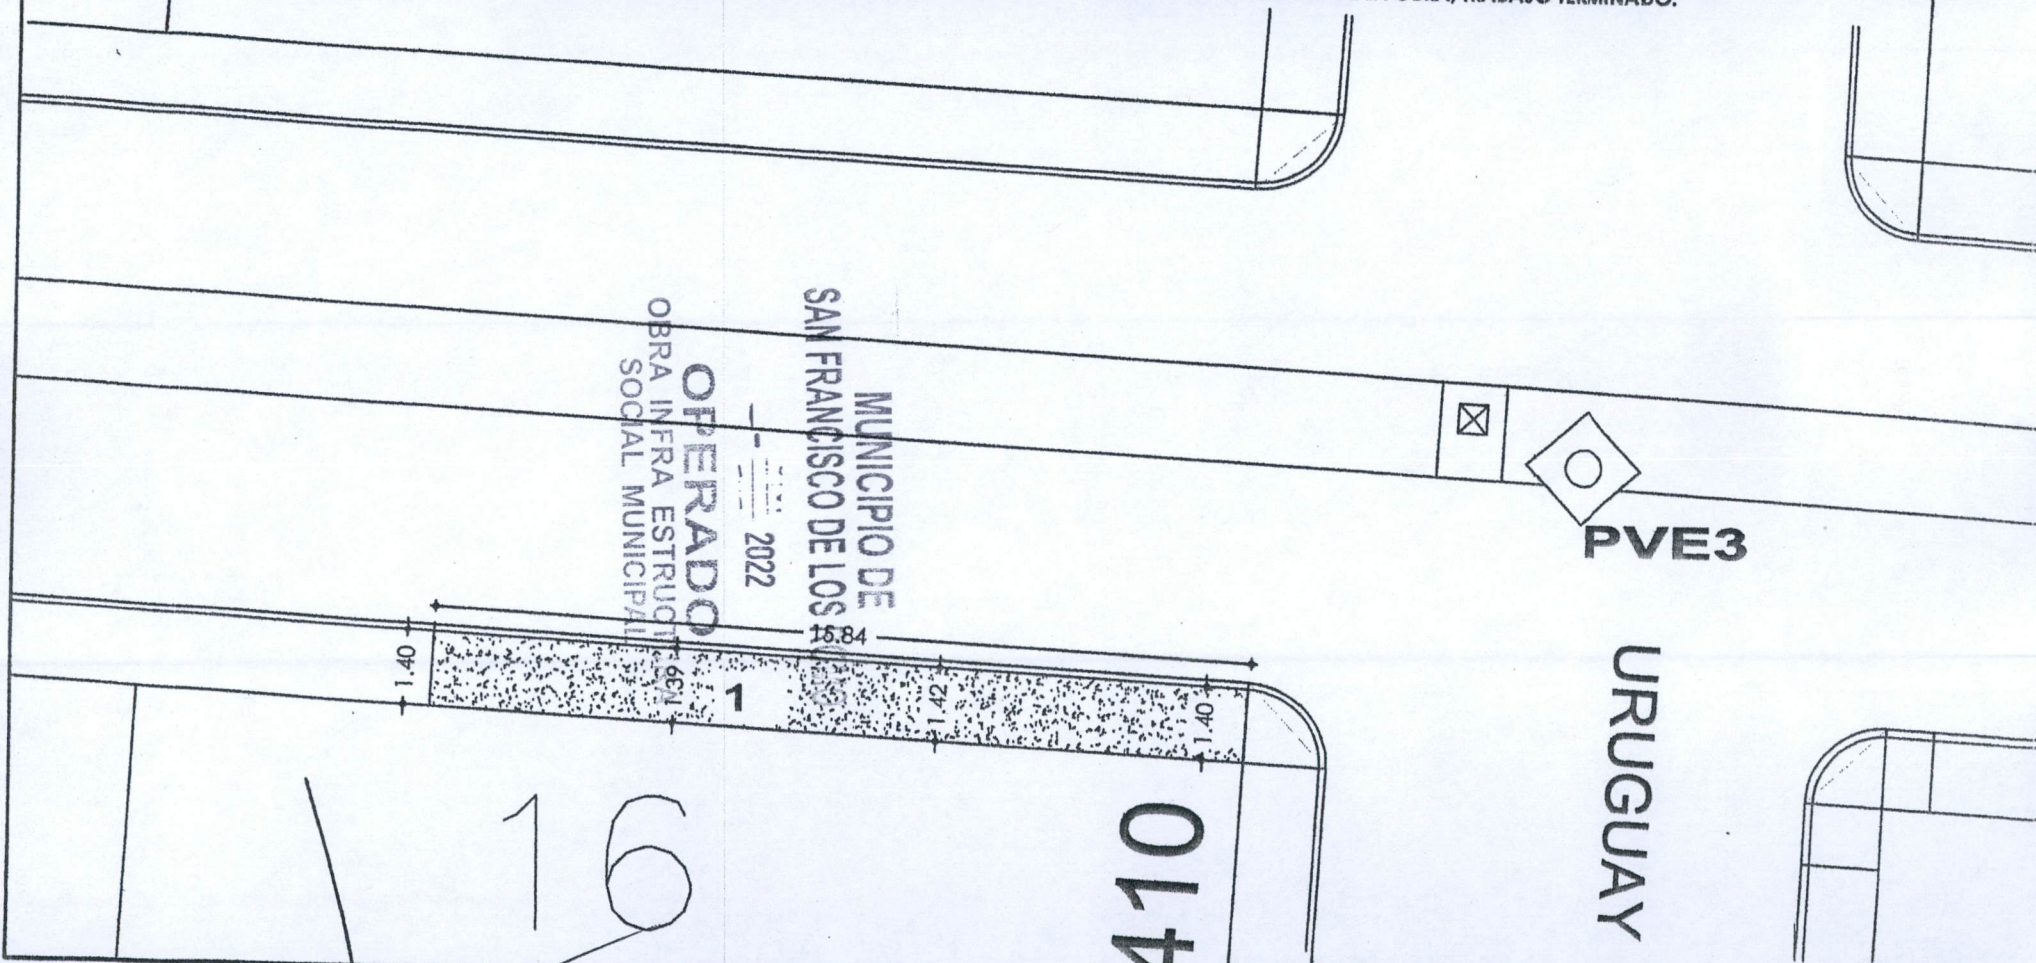

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA
 O.L. DISEÑO Y URBANIZACION, S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE SUPERVISION
 Ing. Carlos Armando Chavez Garcia
 Dir. Obras Publicas

411



diseño y urbanización


NUMEROS GENERADORES

NO. DE OBRA:	FISMDF 016/2022
NO. DE CONTRATO:	FISMDF 016/2022
DESCRIPCIÓN:	FISMDF 016/2022 - REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ARGENTINA
UBICACIÓN:	ENTRE LA CALLE MÉXICO Y CALLE BOLIVIA COLONIA PANAMERICANO CABECERA MUNICIPAL EN EL MUN

ESTIMACION NO

FOTOGRAFIAS

39 REPOSICION DE BANQUETA EN MAL ESTADO EN DIFERENTES AREAS, A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HUMEDECIDO, COLADO, TERMINADO RAYADO, CURADO CON CURACRETO, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, TRABAJO TERMINADO.

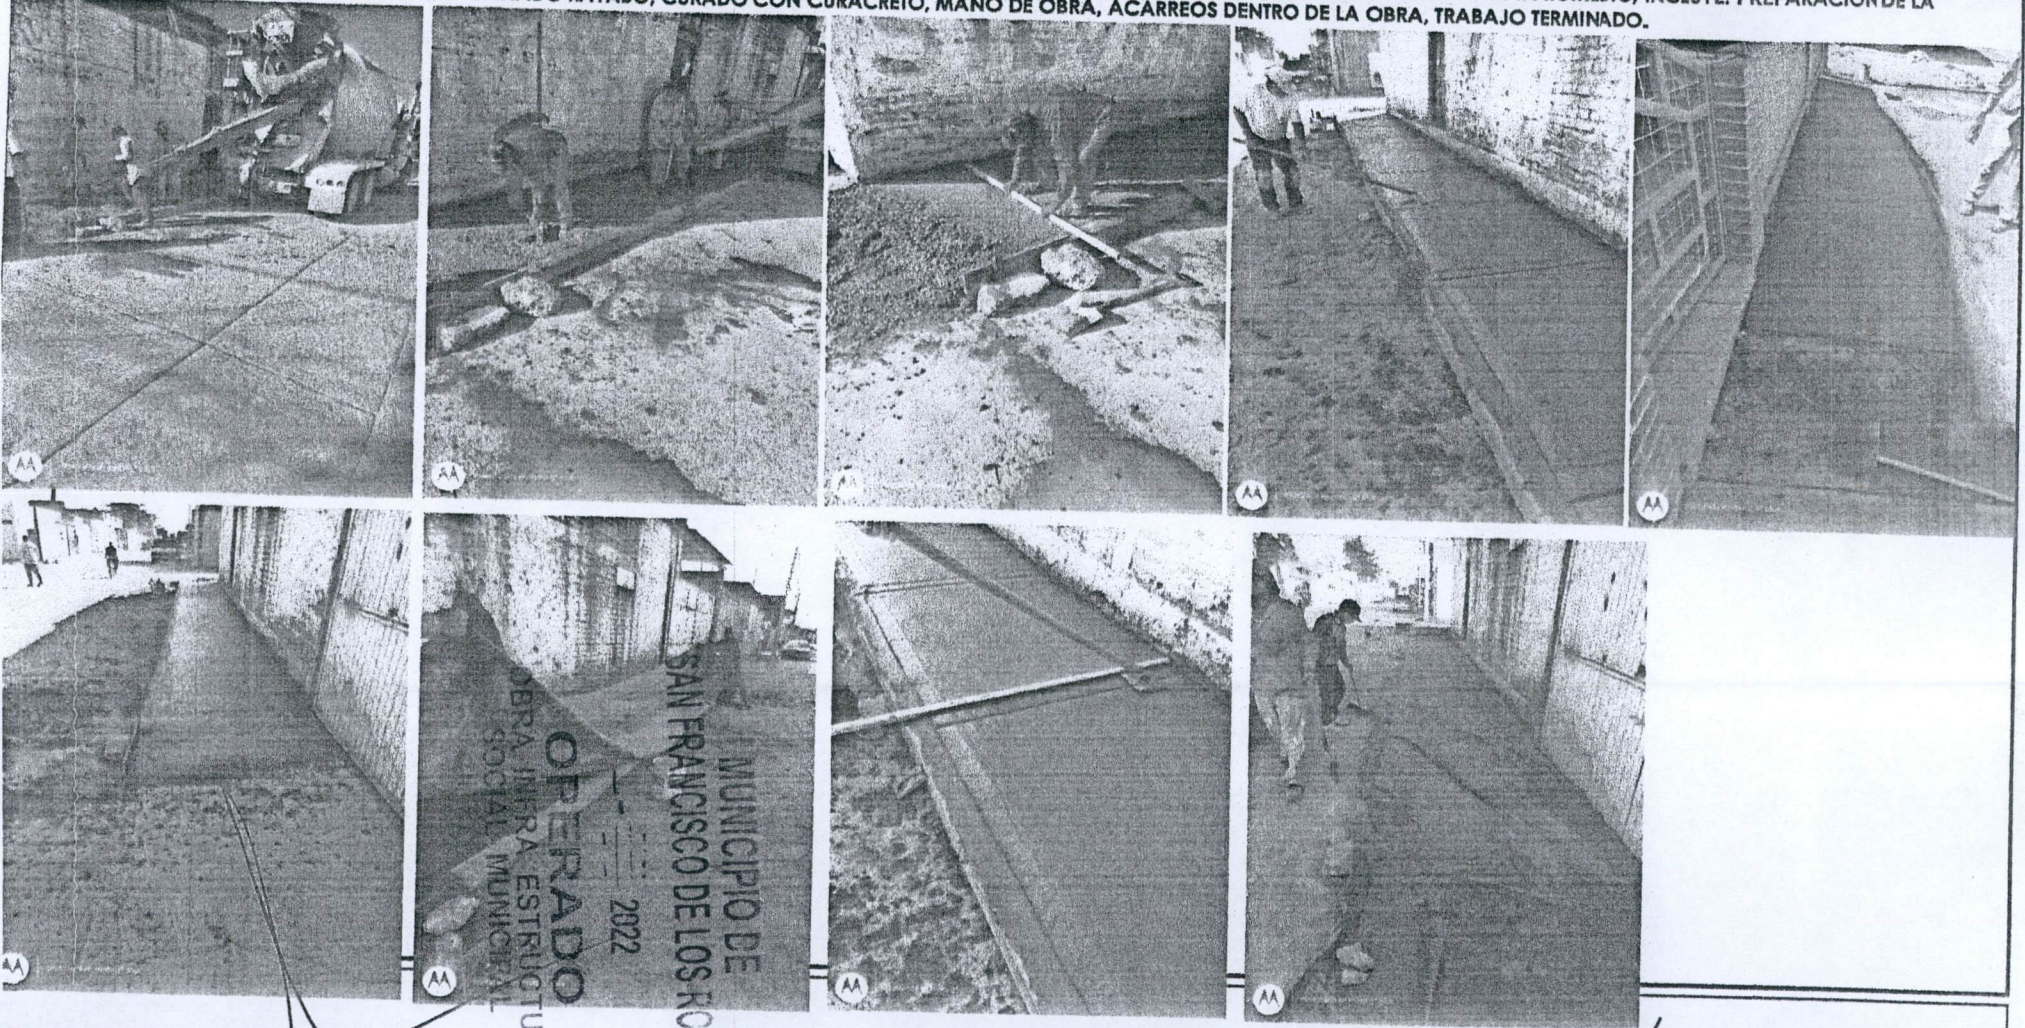

OPERADO
 OBRA PARA ESTRUCTURA
 SOCIAL MUNICIPAL
 2022
 MUNICIPIO DE
 SAN FRANCISCO DE LOS RIOS

RESIDENTE DE OBRA
 O.L. DISEÑO Y URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V

RESIDENTE DE SUPERVISION
 Ing. Carlos Armando Chavez Garza
 Dir. Obras Publicas

BITÁCORA DE OBRA

HOJA _____


CONTRATO FISMDF 016/2022

OBRA FISMDF 016/2022


Nota 03 de Noviembre del 2022

Con esta fecha se concluye la revisión del resumen y números generadores de obra correspondientes a la estimación 6 (seis) de cierre con periodo del 19 de septiembre del 2022 al 02 de octubre del 2022. Se autoriza bajo la siguiente estructura:

Monto Base	\$ 10,484.92
Amortización Anticipada (-)	\$ 0.00
Subtotal con I.V.A	\$ 12,162.81
Retenciones (-)	\$ 104.84
Total a Pagar	\$ 12,057.67




MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
- - - - 2022
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL



Dirección de
OBRAS PÚBLICAS



Ayuntamiento de
**SAN FRANCISCO
DE LOS ROMO**
2021 ♦ 2024



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN
FRANCISCO DE LOS ROMO
No. Oficio: DOP/578/22
San Francisco de los Romo, Ags., 19 de diciembre de 2022
Asunto: LIBERACIÓN DE PAGO

C.P. MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
PRESENTE

2297

Por medio del presente le remito la documentación de la estimación No. 6 (de Finiquito), para que se realicen los trámites necesarios para su pago.

No. de Obra: FIS MDF 016/2022 ✓
Nombre de la Obra: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ARGENTINA ENTRE LA CALLE MÉXICO Y CALLE BOLIVIA

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal ✓
Contratista: O.L. DISEÑO Y URBANIZACION, S.A. DE C.V. (ODU110201AR0)
Contrato: FIS MDF 016/2022 ✓ No Factura: 000170 ✓
Objeto del Contrato: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ARGENTINA ENTRE LA CALLE MÉXICO Y CALLE BOLIVIA, COLONIA PANAMERICANO CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Monto del Contrato: \$865,794.98 (OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 98/100 M.N.)
Monto a Pagar: \$12,057.67 (DOCE MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS 67/100 M.N.)

Así mismo le solicito que una vez termiando dicho trámite se nos haga llegar el auxiliar contable .

Sin otro particular de momento, me es grato enviarle un cordial saludo agradeciendo de antemano las atenciones al presente.

ATENTAMENTE

ING. JOSE DE JESUS CHAVEZ GARCIA
DIRECTOR DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

2022

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

C.c.p. Archivo

Av. Benito Juárez S/N, Rancho La Trinidad,
San Francisco de los Romo, Ags. Tel: (465) 967 0124 ext. 1654
