



Usr: SuSaNa
Rep: rptPoliza

Municipio de San Francisco de los Romo
ESTADO DE AGUASCALIENTES

Póliza: C05329 Del 02/12/2022



Fecha y hora de Impresión | 09/dic./2022 04:47 p. m.
Página | 1

Concepto: FISM 2022 PAGADO EST 2 OBRA FIS MDF 020-2022 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 12 DE.
GP Folio: 358

Beneficiario: **PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTES SA DE CV**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-2501-K027-J04-61402-2	CONSTRUCCIÓN Y/O	\$48,425.27		GP Folio: 358
0002	8260-2501-K027-J04-61402-2	CONSTRUCCIÓN Y/O		\$48,425.27	GP Folio: 358
0003	2113-000387	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	\$48,425.27		GP Folio: 358
0004	1112-003-002	Bancomer Cta. 011793039-9 FISM		\$23,795.17	GP Folio: 358
0005	1134-003-006	Proyectos y Construcciones JE de la		\$24,212.64	FISM 2022 PAGADO EST 2 OBRA FIS MDF 020-2022
0006	2117-9-005-001	0.1% COLEGIO DE		\$41.75	FISM 2022 PAGADO EST 2 OBRA FIS MDF 020-2022
0007	2117-9-005-002	0.2% ORGANO SUPERIOR DE		\$83.49	FISM 2022 PAGADO EST 2 OBRA FIS MDF 020-2022
0008	2117-9-005-003	0.2% INST. DE CAPACIT. DE LA		\$83.49	FISM 2022 PAGADO EST 2 OBRA FIS MDF 020-2022
0009	2117-9-005-004	0.5% CONTRALORIA MUNICIPAL		\$208.73	FISM 2022 PAGADO EST 2 OBRA FIS MDF 020-2022
Sumas iguales =>			<u>96,850.54</u>	<u>96,850.54</u>	

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
-- 2022
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTES SA DE CV

PCJ150422SA7
 TLATELOLCO 101
 LOMAS DE JESUS MARIA
 JESUS MARIA, JESUS MARIA.
 AGUASCALIENTES, México C.P. 20925
 (626) Régimen Simplificado de Confianza
 Teléfonos: 449 9189061
Tipo Comprobante: (P) Pago

Documento Pago DP 93
Folio fiscal
 cd30ceea-9b05-46dd-8f51-1720b4886446
RFC Certificador
 LSO1306189R5
No. certificado del SAT
 00001000000509846663
Fecha y hora certificación
 2022-12-20 09:39:43
Lugar Expedición: Aguascalientes, 20925

RFC	MSF920130TQ9	Fecha expedición	20/12/2022 09:39:41
Nombre	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	Uso CFDI	(P01) Por definir
Calle	FRANCISCO ROMO JIMENEZ 102		
Colonia	FRACC. SAN JOSE DE BUENAVISTA C.P. 20300		
Ciudad, Estado	SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.. México		

Clave	ProdServ	Cantidad	Cve. Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
	84111506	1	(ACT) Actividad	Pago	0	0
Subtotal						0.00
Total						0.00

CERO XXX 00/100

Ordenante	BBA830831LJ2	0117930399	Beneficiario	BBA830831LJ2	012010001110764938
Forma Pago	(03) Transferencia electrónica de fondos			Número Operación	ASD 6550927880
Fecha Pago	2022-12-02T12:00:00				

Documentos Pagados

UUID	Documento	Metodo Pago	Importe	Moneda
010dc085-03ed-4504-8284-d81de76a517b	278	PPD	23,795.18	MXN
<i>Parcialidad : 3</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Insoluto</i>	<i>0.00</i>	
VEINTITRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 18/100 M.N.			Total	23,795.18 MXN

Número Certificado 00001000000414634971

Sello digital del CFDI

e6F6Gr4ZDmM/jmTbhShyzLakO/zirL8xdztBV61YjvRNwKVU06h1JJKM73KiJpPnLW+YoyVC8xRHC1sJ38M3hDExIBOqQEaSKTT/3j6Q0UpnozN1f9ht7OGsxq/L1hLxhvvrP7dOvN3RM/ivewJE3OW6MzCb3JCD0mubn8NvNbQuGR13Ro77ETgJIweiaNyi6LjSq9enih02kKPtGdkU9tBm011CUOGnaVdPbtX7bMjSKGX09MKGd/4dALVtCU+OIsTuVg0KtDPH6ss9vAZcfzmjXMOQ1G1xrOhvVFAAyp9HKituRE9hCpsouDgouEGQbR1KGBDXpnfMEE4TFUEoQ==


Sello del SAT

WxxgVkbLq0Agm4WdNvXw4DrTZfx7ClNXdBddvMDT1sz9sfhpy8S60ijKfzcClGLRo26Yvx9QA00Mzmrp7Z+izywoVKYomAZpWd4qiD8muM+9N7ysSAU6YMapksLBjXQ08Y0TjM2PSSJ46041F5Udb8yjcKI9mzSqr+viGoCcUqr/91wJMXhETH6ojcNBcIwppbmatNwEKGuHNA5bIRmkSLOeaQdvgx7WsoejE2kbrQlmmuZJig0Ui48/+ROi3JiXB4ieZU7Ulp7yUMSqvH0tNvs5Nnj6EXhQIUK032k6DjTEXJIxJL9RctZH2U5hrd2RkTj f7RsUzIAzdg71R+cQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|cd30ceea-9b05-46dd-8f51-1720b4886446|2022-12-20T09:39:43|LSO1306189R5|e6F6Gr4ZDmM/jmTbhShyzLakO/zirL8xdztBV61YjvRNwKVU06h1JJKM73KiJpPnLW+YoyVC8xRHC1sJ38M3hDExIBOqQEaSKTT/3j6Q0UpnozN1f9ht7OGsxq/L1hLxhvvrP7dOvN3RM/ivewJE3OW6MzCb3JCD0mubn8NvNbQuGR13Ro77ETgJIweiaNyi6LjSq9enih02kKPtGdkU9tBm011CUOGnaVdPbtX7bMjSKGX09MKGd/4dALVtCU+OIsTuVg0KtDPH6ss9vAZcfzmjXMOQ1G1xrOhvVFAAyp9HKituRE9hCpsouDgouEGQbR1KGBDXpnfMEE4TFUEoQ==|00001000000509846663||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3



[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

2022

OPERADO
 OBRA INFRA ESTRUCTURA
 SOCIAL MUNICIPAL



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PCJ150422SA7	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTES SA DE CV	MSF920130TQ9	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CD30CEEA-9B05-46DD-8F51-1720B4886446	2022-12-20T09:39:41	2022-12-20T09:39:43	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$0.00	Pago	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
-- 2022
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/Pagos
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pagos/Pagos10.xsd" xmlns:pago10="http://www.sat.gob.mx/Pagos" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
Certificado="MIIGnTCCBIWgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MTQ2MzQ5NzEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbg
Sello="e6F6Gr4ZDmM/jmTbhShyzLakO/zirL8xdztBV6lYjvRNwkVU06hIJMK73KiJpPnLW+YoyVC8xRHC1sJ38M3hDExIBOqQEaSKTT/3j6Q0UpnozNI9ht7C
NoCertificado="00001000000414634971" LugarExpedicion="20925" TipoDeComprobante="P" Total="0" Moneda="XXX" SubTotal="0" Fecha="2022-12-20T09:39:41"
Folio="93" Serie="DP" Version="3.3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="626" Nombre="PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTES SA DE CV"
    Rfc="PCJ150422SA7"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO" Rfc="MSF920130TQ9" UsoCFDI="P01"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="0" ValorUnitario="0" Descripcion="Pago" ClaveUnidad="ACT" Cantidad="1" ClaveProdServ="84111506"></cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Complemento>
    - <pago10:Pagos Version="1.0">
      - <pago10:Pago CtaBeneficiario="012010001110764938" RfcEmisorCtaBen="BBA830831LJ2" CtaOrdenante="0117930399"
        RfcEmisorCtaOrd="BBA830831LJ2" NumOperacion="ASD 6550927880" Monto="23795.18" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="03" FechaPago="2022-
        12-02T12:00:00">
          <pago10:DoctoRelacionado Folio="278" ImpSaldoInsoluto="0.00" ImpPagado="23795.18" ImpSaldoAnt="23795.18" NumParcialidad="3"
            MetodoDePagoDR="PPD" MonedaDR="MXN" IdDocumento="010dc085-03ed-4504-8284-d81de76a517b"/>
        </pago10:Pago>
      </pago10:Pagos>
    <tfid:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
      instance" Version="1.1" xmlns:tfid="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
      SelloSAT="WxxgVkbLq0Agm4WdNNvxW4DrTZfx7CINXdBDDvMDT1sz9sfhpy8S6OijKfzcCIGLRoZ6Yvx9QA00Mzmrp7Z+iZywpoVKYomAZpW
      NoCertificadoSAT="00001000000509846663"
      SelloCFD="e6F6Gr4ZDmM/jmTbhShyzLakO/zirL8xdztBV6lYjvRNwkVU06hIJMK73KiJpPnLW+YoyVC8xRHC1sJ38M3hDExIBOqQEaSKTT/3j6
      RfcProvCertif="LSO1306189R5" FechaTimbrado="2022-12-20T09:39:43" UUID="cd30ceea-9b05-46dd-8f51-1720b4886446"/>
    </cfdi:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>

```

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

-- 2022

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL



Fecha y hora de consulta

02/12/2022 3:56:59 PM

Contrato

00796395

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: EST 2 FIS MDF 020

Importe de la operación: 23,795.17 MXP

Cuenta de retiro: 0117930399

Cuenta de depósito: 0111076493

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Titular de la cuenta: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCA SA DE CV

Fecha de creación: 02/12/2022

Fecha de aplicación: 02/12/2022

Hora: 15:56:45

Instrumento de seguridad: ASD 6550927880

Motivo de pago: PAGO EST 2 FIS MDF 11-020

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0014687049

Folio único: I323202212021556450014687056

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	02/12/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	02/12/2022

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO


2022

OPERADO OBRA INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Dirección de
OBRAS PÚBLICAS



Ayuntamiento de
**SAN FRANCISCO
DE LOS ROMO**
2021 + 2024



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN
FRANCISCO DE LOS ROMO
No. Oficio: DOP/527/22
San Francisco de los Romo, Ags., 2 de diciembre de 2022
Asunto: LIBERACIÓN DE PAGO
2148

C.P. MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
PRESENTE

Por medio del presente le remito la documentación de la estimación No. 2, para que se realicen los trámites necesarios para su pago.

No. de Obra: FIS MDF 020/2022

Nombre de la Obra: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 12 DE DICIEMBRE ENTRE LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal

Contratista: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. (PCJ150422SA7)

Contrato: FIS MDF 007-020-024/2022 No Factura: 278

Objeto del Contrato: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 12 DE DICIEMBRE ENTRE LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, COLONIA 28 DE ABRIL EN CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO

Monto del Contrato: \$118,510.25 (CIENTO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 25/100 M.N.)

Monto a Pagar: \$23,795.17 (VEINTITRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 17/100 M.N.)

Sin otro particular de momento, me es grato enviarle un cordial saludo agradeciendo de antemano las atenciones a presente.

ATENTAMENTE

ING. JOSE DE JESUS CHAVEZ GARCIA
DIRECTOR DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

2022

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

C.c.p. Archivo

Av. Benito Juárez S/N, Rancho La Trinidad,
San Francisco de los Romo, Ags. Tel: (465) 967 0124 ext. 1654

www.sanfranciscodelosromo.gob.mx

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

CÉDULA DE SEGUIMIENTO A ESTIMACIONES DE OBRA

Ayuntamiento de
**SAN FRANCISCO
DE LOS ROMO**
2021 * 2024



DATOS GENERALES

CONTRATISTA: <u>Proyectos y Construcciones JE de la Parra, en Aqs., S.A.</u>	N° DE CONTRATO: <u>FISMDF 007,020,024/2022</u>
SUPERVISOR: <u>Fernando Luna Medina</u>	N° DE OBRA: <u>FISMDF 020/2022</u>
OBRA: <u>Rehab. de red de agua potable c. 12 de diciembre</u>	N° DE FACTURA:
FECHA DE CORTE: DEL: <u>11</u> AL: <u>24 de Septiembre de 2022</u>	N° DE ESTIMACION: <u>2 (Dos)</u>
	IMPORTE LIQUIDO:

FORMATO DE NÚMEROS GENERADORES

INGRESO	REVISIÓN	NOTA	CAPTURA EN SISTEMA	ENTREGA DE PRE FACTURA
<u>25/10/2022</u>	<u>28/10/2022</u>	<i>Sr. contratista regrese esta cédula con la estimación original de lo contrario no se le dara tramite</i>	<u>28/10/2022</u>	<u>28/10/2022</u>
CONTRATISTA	SUPERVISOR		SUPERVISOR	SUPERVISOR

FORMATO DE ESTIMACIÓN

INGRESO	REGISTRO	SUPERVISOR	RECIBIDO	AUTORIZADO	JEFE DE DEPARTAMENTO
<u>02/12/2022</u>	<u>02/12/22</u>	<u>02/12/2022</u>	<u>02/12/2022</u>	<u>02/12/2022</u>	ARQ.-ALFREDO FLORES MARMOLEJO
CONTRATISTA	CONTROL DE ESTIMACIONES		RECIBIDO	AUTORIZADO	RECIBIDO / AUTORIZADO

OPERADO
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
OPERADORA INEREA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
2022

DEVOLUCION

FECHA DE DEVOLUCIÓN: 28/10/2022
 FECHA DE REINGRESO: 02/12/2022
 MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN:
- Falta de fotografías
- Corrección de croquis

CONTENIDO

CÁRATULA	/
RESUMEN	/
CONCEPTOS	/
ESTADO DE CUENTA	/
CONCENTRADO DE CONCEPTOS (FIN)	/
GENERADORES Y RESUMEN	/
CROQUIS	/
FOTOGRAFÍAS	/
ANÁLISIS PRECIO UNITARIO	/
REPORTE(S) DE LABORATORIO	/
FIANZA(S) (FIN)	/
NOTA DE BITACORA DE OBRA	/

DIRECTOR GENERAL

ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA

RECIBIDO: 02.12.22 AUTORIZADO: 02.12.22

FINANZAS

RECIBIDO AUTORIZADO

TRÁMITE DE PAGO

FECHA DE INICIO DE TRÁMITE EN DOP-SFR	FIRMA DEL DIRECTOR	OFICIO DE LIBERACIÓN	FECHA DE ENTREGA
<u>25</u> <u>10</u> <u>22</u>	<u>02</u> <u>12</u> <u>22</u>	<u>02</u> <u>12</u> <u>22</u>	
DÍA: MES: AÑO:	DÍA: MES: AÑO:	DÍA: MES: AÑO:	DIRECCIÓN DE EGRESOS.

PRE-FACTURA Normal



PRE-FACTURA DEL CONTRATISTA:

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. (653)

A NOMBRE DE: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 RFC: MSF920130TQ9
 DIRECCION: FCO ROMO JIMENEZ 102, SAN JOSE DE BUENAVISTA, SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS,
 CIUDAD: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE L ESTADO: AGUASCALIENTES

DESCRIPCION

PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 Del 11 Sep 2022 al 24 Sep 2022
 DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 12 DE DICIEMBRE ENTRE LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE
 UBICADA EN: COLONIA 28 DE ABRIL EN CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO
 CON AMPARO DEL CONTRATO No.: FIS MDF007-020-024/2022 20
 DE FECHA:: 18/07/2022
 BAJO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA:

MONTO BASE	\$41,745.91
AJUSTE DE COSTOS (+)	\$0.00
AMORTIZACION DE ANTICIPO (-)	\$20,872.95
SUBTOTAL	\$20,872.96
IVA (+)	\$3,339.67
SUBTOTAL CON IVA	\$24,212.64

Inversion Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal 2022
 Programa SC AGUA POTABLE
 SubPrograma 01 REHABILITACION
 Obra. FIS MDF 020/2022 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 12 DE DICIEMBRE ENTRE LA CALLE 15 DE SEPTIEMB
 Localizacion COLONIA 28 DE ABRIL EN CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO

CAPACITACION DE LOS TRABAJADORES DEL CONTRATISTA	\$83.49 (0.20%)	TOTAL DE RETENCIONES (-)	\$417.46
COLEGIOS DE PROFESIONISTAS SEGUN CORRESPONDA	\$41.75 (0.10%)	SANCION POR RETRASO (-)	\$0.00
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	\$0.00 (0.00%)	SUBTOTAL MENOS RETENCIONES	\$23,795.17
FISCALIZACION DEL H. CONGRESO DEL ESTADO	\$83.49 (0.20%)	RETENCION POR RETRASO(-)	\$0.00
INSPECCION DE VIGILANCIA PARA LA CONTRALORIA	\$208.73 (0.50%)	REINTEGRO POR RETENCION	\$0.00
SERVICIOS RELATIVOS ALAS CONSTRUCCIONES	\$0.00	OTRAS SANCIONES(-)	\$0.00
Avance Fisico Real %	\$417.46	TOTAL A PAGAR	\$23,795.17
Avance Fisico Proaramado %			
Fecha Terminación Prog.			

VEINTITRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 17/100 M.N.

**MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL
 2022

ESTADO DE CUENTA

Obra.	FIS MDF 020/2022 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 12 DE DICIEMBRE ENTRE LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE		Total Contrato	116,354.15
Localización	COLONIA 28 DE ABRIL EN CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO		Total Ampliaciones	2,156.10
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura So		Total Contratado	118,510.25
Programa	SC AGUA POTABLE		Anticipo ()%	58,177.07
SubPrograma	01 REHABILITACION		Estimado Anterior	92,141.51
Contratista	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 12 DE DICIEMBRE ENTRE LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE		Esta Estimación	24,212.64
Contrato	FIS MDF007-020-024/2022 20		Total Estimado	116,354.15
Estimación No.	2 Del 11 Sep 2022 al 24 Sep 2022		Total por Estimar	2,156.10

No. Estimac.	Periodo	Importe Estimacion	Amortizacion de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA (+)	Cargo a la Obra	DEDUCCIONES (-)						Retencion (-)	Reintegro (+)	Sanciones (-)	Importe a Pagar
							CMIG(0)	Calo.Prof.(0)	SFP(0.5)	Conc. Edo.(0.2)	Municipal	ISRuOtro(0)				
Anticipo				50,152.65	8,024.42	58,177.07										58,177.07
1	Del 01 Ago 2022 al 10 Sep	58,559.39	29,279.70	20,872.95	4,684.75	33,964.44	117.12	58.56	0.00	117.12	292.80	0.00	0.00	0.00	0.00	33,378.84
2	Del 11 Sep 2022 al 24 Sep 2022	41,745.91	20,872.95	0.00	3,339.67	24,212.64	83.49	41.75	0.00	83.49	208.73	0.00	0.00	0.00	0.00	23,795.17
TOTALES		100,305.30	50,152.65		16,048.84	116,354.14	200.61	100.31	0.00	200.61	501.53	0.00	0.00	0.00	0.00	115,351.08

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL
 2022

RESUMEN DE ESTIMACION

Obra.	FIS MDF 020/2022 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 12 DE DICIEMBRE ENTRE LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	Total Contrato	\$116,354.15
Localización	COLONIA 28 DE ABRIL EN CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO	Total Ampliaciones	\$2,156.10
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal.	Total Contratado	\$118,510.25
Programa	SC AGUA POTABLE	Anticipo (50)%	\$58,177.07
SubPrograma	01 REHABILITACION	Estimado Anterior	\$92,141.51
Supervisor	FERNANDO LUNA MEDINA (LUMF740415)	Esta Estimacion	\$24,212.64
Contratista	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. (653)	Total Estimado	\$116,354.15
Contrato	FIS MDF007-020-024/2022 20 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 12 DE DICIEMBRE ENTRE LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	Saldo por Estimar	\$2,156.10
Estimacion No.	2		
Recibí de	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	la Cantidad de:	\$24,212.63 VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS 63/100 M.N.

GRUPO	PARTIDA	
* EXTRAORDINARIOS		\$31,960.95
- EXTRAORDINARIOS		\$31,960.95
* INDIRECTOS NO EJECUTADOS		\$-150.89
- INDIRECTOS NO EJECUTADOS		\$-150.89
* REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 12 DE DICIEMBRE ENTRE LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CAL		\$9,935.85
- TOMAS DOMICILIARIAS		\$9,935.85
	SUMA	\$41,745.91
Fecha Terminación Prog.	AJUSTE DE COSTOS (+)	\$0.00
	AMORTIZACION DE ANTICIPO (-)	\$20,872.95
	SUBTOTAL	\$20,872.96
	IVA (+)	\$3,339.67
	SUBTOTAL CON IVA	\$24,212.64


MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 2022

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A.
 DE C.V. (PCJ150422SA7)
 Contratista

T.C. FERNANDO LUNA MEDINA (LUMF740415)
 SUPERVISOR

CONCEPTOS DE ESTIMACION

Normal



Obra.	FISMDF 020/2022 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 12 DE DICIEMBRE ENTRE LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE		Total Contrato	\$116,354.15
Localización	SEPTIEMBRE COLONIA 28 DE ABRIL EN CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO		Total Ampliaciones	\$2,156.10
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal.		Total Contratado	\$118,510.25
Programa	SC AGUA POTABLE		Anticipo (50)%	\$58,177.07
SubPrograma	01 REHABILITACION		Estimado Anterior	\$92,141.51
Supervisor	FERNANDO LUNA MEDINA (LUMF740415)		Esta Estimacion	\$24,212.64
Contratista	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. (653)		Total Estimado	\$116,354.15
Contrato	FISMDF007-020-024/2022 20 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 12 DE DICIEMBRE ENTRE LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE		Saldo por Estimar	\$2,156.10
Estimación No.	2 Del 11 Sep 2022 al 24 Sep 2022			
Recibí de	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO la Cantidad de:	\$24,212.63		

No.	Concepto	Unid. Med	Volumen					Precio Contratado	Importe
			Contratado	Acumulado	Anterior	Actual	Excedente		

GRUPO: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 12 DE DICIEMBRE ENTRE LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN COLONIA 28 DE ABRIL EN

CABECE

PARTIDA: TOMAS DOMICILIARIAS

15	DEMOLICION A MAQUINA DE PAVIMENTO (CONCRETO, ASFALTO Y/O EMPEDRADO) EXISTENTE Y/O BANQUETA (DE HASTA 15 cm DE ESPESOR PROMEDIO). INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA (PRIMERA ESTACION), LIMPIEZAS.	M3	0.71	22.87	0.87	22.00	22.16	\$354.73	\$7,802.72
18	CARGA Y ACARREO EN CAMION AL TIRADERO OFICIAL DE MATERIAL MIXTO AL TIRADERO OFICIAL, ZONA URBANA, SUBURBANA, TERRACERIAS, ETC. (CARGA MECANICA) MEDIDO COMPACTO.	M3	21.72	32.59	10.60	22.00	10.87	\$38.26	\$841.58
19	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES AL TIRADERO OFICIAL AUTORIZADO MÁS CERCANO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3/KM	86.88	130.01	42.39	87.62	43.13	\$14.74	\$1,291.55
								Total Partida	\$9,935.85
								Total Grupo	\$9,935.85

GRUPO: INDIRECTOS NO EJECUTADOS

PARTIDA: INDIRECTOS NO EJECUTADOS

26	Indirecto por administración de obra por el convenio de ampliación en monto por cantidad de \$2,156.10	IN	0.00	-1.00	0.00	-1.00	\$150.89	\$-150.89	
								Total Partida	\$-150.89
								Total Grupo	\$-150.89

GRUPO: EXTRAORDINARIOS

PARTIDA: EXTRAORDINARIOS

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 2022


PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. (PCJ150422SA7)
CONTRATISTA


T.C. FERNANDO LUNA MEDINA (LUMF740415)
SUPERVISOR

No.	Concepto	Unid. Med	Volumen					Precio Contratado	Importe
			Contratado	Acumulado	Anterior	Actual	Excedente		
27	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 10+2 CM ACABADO RAYADO FINO CON BROCHA DE PELO, JUNTAS FRIAS CON DOBLADOR DE 2", SECCION DE LOSAS DE ACUERDO A LA EXISTENTE, INCLUYE: COLADO, CURADO CON MEMBRANA A BASE DE AGUA Y TRABAJO TERMINADO SEGUN FICHA TECNICA FT-200.	M2.	0.00	83.51	0.00	83.51	83.51	\$382.73	\$31,960.95

Total Partida	\$31,960.95
Total Grupo	\$31,960.95
Total Presupuestado	\$41,745.91
Ajuste de Costos	\$0.00
Total	\$41,745.91

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL
 2022


 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA PENA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE
 C.V. (PCJ 50422SA7)
 CONTRATISTA


 T.C. FERNANDO LUNA MEDINA (LUMF740415)
 SUPERVISOR



FECHA: 6 de septiembre de 2022

NOMBRE DE LA OBRA : REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 12 DE DIC LOCALIDAD: COL. 28 DE ABRIL, SAN FRANCISCO DE LOS RO
 No. DE CONTRATO Y OBRA : FISMDF 007-020-024/2022 FISMDF 020/22
 IMPORTE DE CONTRATO : \$116,354.15 (CIENTO DIEZ Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 15/100 M.N.)
 FECHA DE INICIO REAL : 1 de agosto de 2022
 FECHA DE INICIO VIGENTE (REPROGRAMACION SEGÚN ANTICIPO): 27 de julio de 2022
 PLAZO DEL CONTRATO : 60 (SESENTA) DIAS CALENDARIO
 FECHA DE TERMINO VIGENTE : 25 de septiembre de 2022 FECHA DE TERMINO REAL : 29 de septiembre de 2022
 No. DE ESTIMACION : 2 (DOS)
 PERIODO : 11.sep.22 AL 24.sep.22
 AVANCE FISICO : 98%
 AVANCE FINANCIERO : 100%

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN			PU.	IMPORTE
			CONTRATADO	EXCEDENTE	EJECUTADO		
	TOMAS DOMICILIARIAS						
15.-	DEMOLICION A MAQUINA DE PAVIMENTO (CONCRETO, ASFALTO Y/O EMPEDRADO) EXISTENTE Y/O BANQUETA (DE HASTA 15 cm DE ESPESOR PROMEDIO). INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA (PRIMERA ESTACION), LIMPIEZAS.	M3	0.71	0.00	22.00	\$ 354.73	\$ 7,802.72
18.-	CARGA Y ACARREO EN CAMION AL TIRADERO OFICIAL DE MATERIAL MIXTO AL TIRADERO OFICIAL, ZONA URBANA, SUBURBANA, TERRACERIAS, ETC. (CARGA MECANICA) MEDIDO COMPACTO.	M3	21.72	0.00	22.00	\$ 38.26	\$ 841.58
19.-	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES AL TIRADERO OFICIAL AUTORIZADO MÁS CERCANO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3/KM	86.88	0.00	87.62	\$ 14.74	\$ 1,291.55
	EXTRAORDINARIOS						
27.-	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 10+2 CM ACABADO RAYADO FINO CON BROCHA DE PELO, JUNTAS FRIAS CON DOBLADOR DE 2", SECCION DE LOSAS DE ACUERDO ALA EXISTENTE, INCLUYE: COLADO , CURADO CON MEMBRANA A BASE DE AGUA Y TRABAJO TERMINADO SEGUN FICHA TECNICA FT-200.	M2	7.10	0.00	83.51	\$ 382.73	\$ 31,960.95

SUB-TOTAL \$ 41,896.80
 ANTICIPO 50% \$ 20,948.40
 TOTAL \$ 20,948.40

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUAS CALIENTES, S.A. DE C.V.

NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA

F.C. FERNANDO LUNA MEDINA
 Residente de Obra

Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

ARQ. ALFREDO FLORES MARTINEZ
 Jefe Departamento de Supervisión

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA
PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.



NUMEROS GENERADORES

NO. DE OBRA: FSMDF 020/22
 NO. DE CONTRATO: FSMDF 009-020-024/2022
 DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 12 DE DICIEMBRE EN
 UBICACIÓN: COL. 28 DE ABRIL, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.

E S T I M A C I O N N.º 1

No.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	TOTAL	CROQUIS	FOTOGRAFIA
			EJE	TRAMO	TIPO								
15.-	DEMOLICION A MAQUINA DE PAVIMENTO (CONCRETO, ASFALTO Y/O EMPEDRADO) EXISTENTE Y/O BANQUETA (DE HASTA 15 cm DE ESPESOR PROMEDIO). INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA (PRIMERA ESTACION), LIMPIEZAS.	M3				DEMOLICION DE BANQUETAS						ANEXO	
						65.97	1.50	0.10		9.90		BANQUETA PONIENTE	
						1.40	1.35	0.10		0.19			
						1.40	1.35	0.10		0.19			
						3.00	1.35	0.10		0.41			
						3.65	1.35	0.10		0.49			
						1.35	1.65	0.10	2.00	0.11		RAMPA	
						1.25	1.45	0.10		0.18		RAMPA	
						65.94	1.50	0.10		9.89		BANQUETA ORIENTE	
						8.15	1.35	0.10		1.10			
						1.00	1.35	0.10		0.14			
						1.35	1.50	0.10		0.20			
						1.46	1.38	0.10		0.20			
						1.25	1.30	0.10	2.00	0.08		RAMPA	
						1.35	1.45	0.10	2.00	0.10		RAMPA	
						BANQUETA DE CONCRETO AGUA POTABLE							
						-1.53	0.20	0.10		-0.03		TOMA DOM 1	
						-1.53	0.20	0.10		-0.03		TOMA DOM 2	
						-1.54	0.20	0.10		-0.03		TOMA DOM 3	
						-1.54	0.20	0.10		-0.03		TOMA DOM 4	
						-1.54	0.20	0.10		-0.03		TOMA DOM 5	
						-1.55	0.20	0.10		-0.03		TOMA DOM 6	
						-1.49	0.20	0.10		-0.03		TOMA DOM 7	
						0.00	0.20	0.10		0.00		TOMA DOM 8	
						-1.45	0.20	0.10		-0.03		TOMA DOM 9	
						-1.44	0.20	0.10		-0.03		TOMA DOM 10	
						DEMOLICION BANQUETAS ALCANTARILLADO							
						-1.53	0.60	0.10		-0.09		DESCARGA DOM 1	
						-1.53	0.60	0.10		-0.09		DESCARGA DOM 2	
						-1.54	0.60	0.10		-0.09		DESCARGA DOM 3	
						-1.54	0.60	0.10		-0.09		DESCARGA DOM 4	
						-1.54	0.60	0.10		-0.09		DESCARGA DOM 5	
						-1.55	0.60	0.10		-0.09		DESCARGA DOM 6	
											TOTAL	22.35	

OPERADO
 OBRA INFRA ESTRUCTURA
 SOCIAL MUNICIPAL
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 MUNICIPIO DE
 2022

OBSERVACIONES:

SUPERINTENDENTE DE OBRA
 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN A
 NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA

RESIDENTE DE OBRA
 Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
 T.C. FERNANDO LUNA MEDINA

NUMEROS GENERADORES

NO. DE OBRA:	FIS MDF 020/22
NO. DE CONTRATO:	FIS MDF 009-020-024/2022
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 12 DE DICIEMBRE EN I
UBICACIÓN:	COL. 28 DE ABRIL, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.



E S T I M A C I O N N o. 1


CROQUIS

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO

DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE PAVIMENTO (CONCRETO, ASFALTO Y/O EMPEDRADO) EXISTENTE Y/O BANQUETA (DE HASTA 15 cm DE ESPESOR PROMEDIO). INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA (PRIMERA ESTACIÓN), LIMPIEZAS.

C. 16 DE SEPTIEMBRE

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL
2022

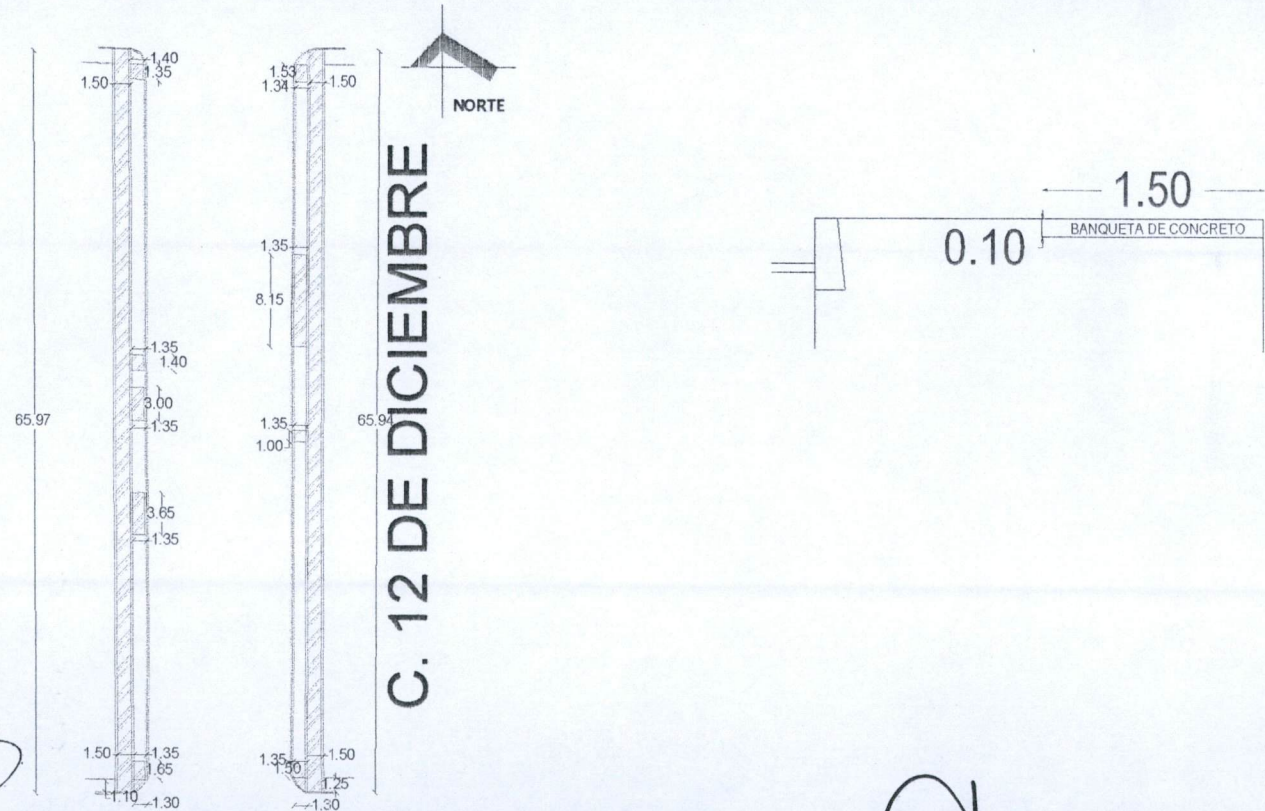

C. 15 DE SEPTIEMBRE

OBSERVACIONES :

SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTES
NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA

RESIDENTE DE OBRA
Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
T.C. FERNANDO LUNA MEDINA

NUMEROS GENERADORES

NO. DE OBRA:	FSMDF 020/22
NO. DE CONTRATO:	FSMDF 009-020-024/2022
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 12 DE DICIEMBRE ENI
UBICACIÓN:	COL. 28 DE ABRIL, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.



Ayuntamiento de
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
2021 • 2024

ESTIMACION No. 1

FOTOGRAFIA

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO


DEMOLICION A MAQUINA DE PAVIMENTO (CONCRETO, ASFALTO Y/O EMPEDRADO) EXISTENTE Y/O BANQUETA (DE HASTA 15 cm DE ESPESOR PROMEDIO). INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA (PRIMERA ESTACION), LIMPIEZAS.




MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL
2022



OBSERVACIONES:


SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTI
NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA


RESIDENTE DE OBRA
Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
T.C. FERNANDO LUNA MEDINA

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA
PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.



NUMEROS GENERADORES

NO. DE OBRA: FISDMF 020/22
 NO. DE CONTRATO: FISDMF 009-020-024/2022
 DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 12 DE DICIEMBRE EN
 UBICACIÓN: COL. 28 DE ABRIL, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.

ESTIMACION No. 1

No.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	TOTAL	CROQUIS	FOTOGRAFIA
			EJE	TRAMO	TIPO								
18.-	CARGA Y ACARREO EN CAMION AL TIRADERO OFICIAL DE MATERIAL MIXTO AL TIRADERO OFICIAL, ZONA URBANA, SUBURBANA, TERRACERIAS, ETC. (CARGA MECANICA) MEDIDO COMPACTO.	M3											
						DEMOLICION DE BANQUETAS						ANEXO	
						65.97	1.50	0.10		9.90			BANQUETA PONIENTE
						1.40	1.35	0.10		0.19			
						1.40	1.35	0.10		0.19			
						3.00	1.35	0.10		0.41			
						3.65	1.35	0.10		0.49			
						1.35	1.65	0.10	2.00	0.11			RAMPA
						1.25	1.45	0.10		0.18			RAMPA
						65.94	1.50	0.10		9.89			BANQUETA ORIENTE
						8.15	1.35	0.10		1.10			
						1.00	1.35	0.10		0.14			
						1.35	1.50	0.10		0.20			
						1.46	1.38	0.10		0.20			
						1.25	1.30	0.10	2.00	0.08			RAMPA
						1.35	1.45	0.10	2.00	0.10			RAMPA
						BANQUETA DE CONCRETO AGUA POTABLE							
						-1.53	0.20	0.10		-0.03			TOMA DOM 1
						-1.53	0.20	0.10		-0.03			TOMA DOM 2
						-1.54	0.20	0.10		-0.03			TOMA DOM 3
						-1.54	0.20	0.10		-0.03			TOMA DOM 4
						-1.54	0.20	0.10		-0.03			TOMA DOM 5
						-1.55	0.20	0.10		-0.03			TOMA DOM 6
						-1.49	0.20	0.10		-0.03			TOMA DOM 7
						0.00	0.20	0.10		0.00			TOMA DOM 8
						-1.45	0.20	0.10		-0.03			TOMA DOM 9
						-1.44	0.20	0.10		-0.03			TOMA DOM 10
						DEMOLICION BANQUETAS ALCANTARILLADO							
						-1.53	0.60	0.10		-0.09			DESCARGA DOM 1
						-1.53	0.60	0.10		-0.09			DESCARGA DOM 2
						-1.54	0.60	0.10		-0.09			DESCARGA DOM 3
						-1.54	0.60	0.10		-0.09			DESCARGA DOM 4
						-1.54	0.60	0.10		-0.09			DESCARGA DOM 5
						-1.55	0.60	0.10		-0.09			DESCARGA DOM 6
										TOTAL	22.35		

OBSERVACIONES:

SUPERINTENDENTE DE OBRA
 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN A
 NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA

RESPONSABLE DE OBRA
 Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
 T.C. FERNANDO LUNA MEDINA

MUNICIPIO DE
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 OPERADO
 OBRA INFRA ESTRUCTURA
 SOCIAL MUNICIPAL
 2022

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

NO. DE OBRA: FISMDF 020/22
 NO. DE CONTRATO: FISMDF 009-020-024/2022
 DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 12 DE DICIEMBRE EN
 UBICACIÓN: COL. 28 DE ABRIL, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.



ALTERNATIVA DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 2020 - 2022

NUMEROS GENERADORES


E S T I M A C I O N N o . 1

CROQUIS

DESCRIPCION DE CONCEPTO

CARGA Y ACARREO EN CAMION AL TIRADERO OFICIAL DE MATERIAL MIXTO AL TIRADERO OFICIAL, ZONA URBANA, SUBURBANA, TERRACERIAS, ETC. (CARGA MECANICA) MEDIDO COMPACTO.

16 DE SEPTIEMBRE

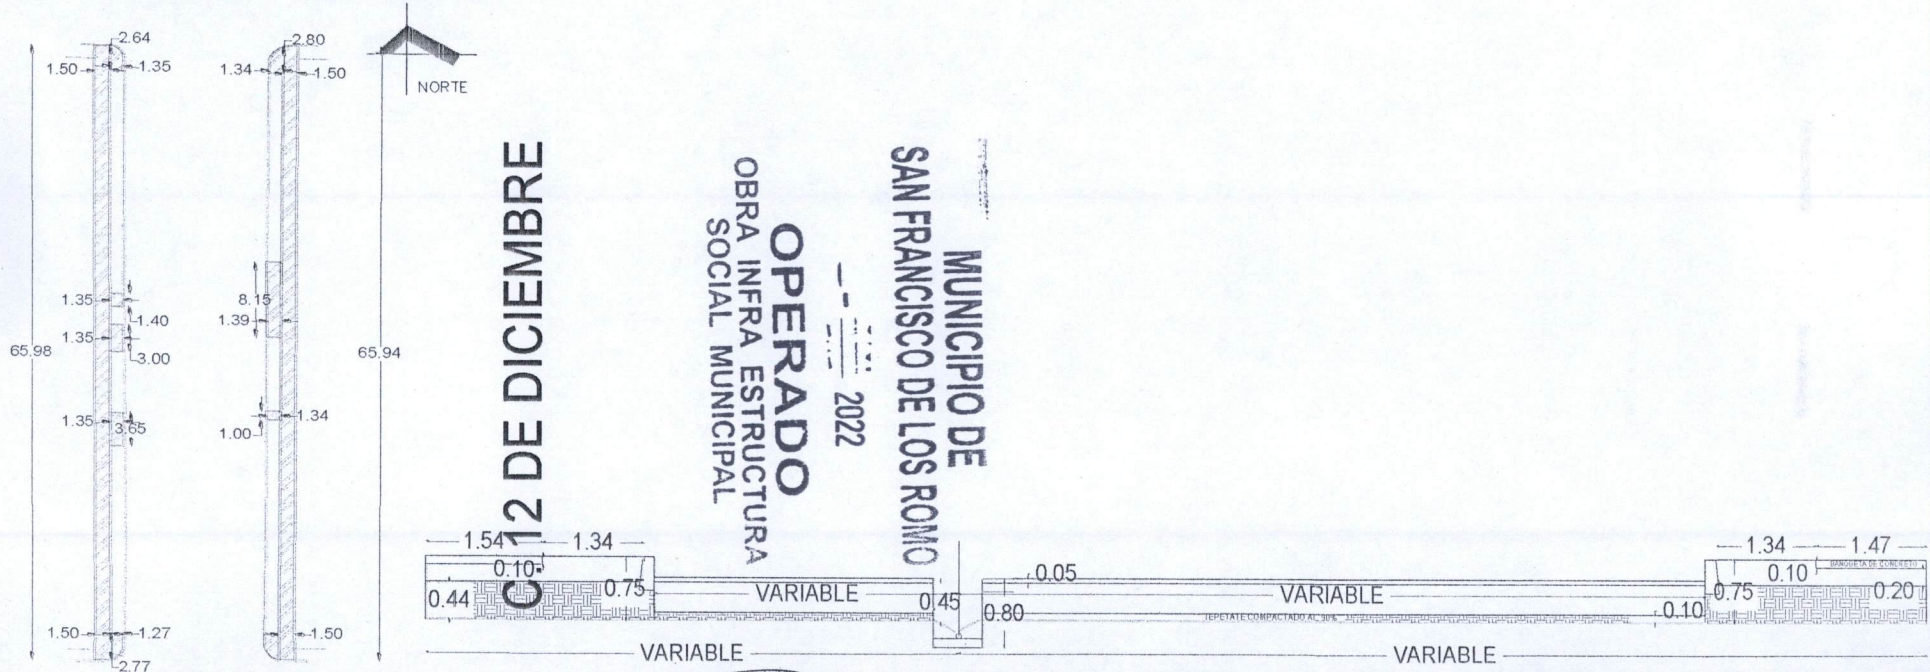

OBSERVACIONES:
15 DE SEPTIEMBRE

SUPERINTENDENTE DE OBRA
 CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTES
 NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA

RESIDENTE DE OBRA
 Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
 T.C. FERNANDO LUNA MEDINA



NUMEROS GENERADORES

NO. DE OBRA:	FISMDF 020/22
NO. DE CONTRATO:	FISMDF 009-020-024/2022
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 12 DE DICIEMBRE EN
UBICACIÓN:	COL. 28 DE ABRIL, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.

E S T I M A C I O N N o 1

FOTOGRAFIA

DESCRIPCION DE CONCEPTO

CARGA Y ACARREO EN CAMION AL TIRADERO OFICIAL DE MATERIAL MIXTO AL TIRADERO OFICIAL, ZONA URBANA, SUBURBANA, TERRACERIAS, ETC. (CARGA MECANICA) MEDIDO COMPACTO.



MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL
2022

OBSERVACIONES :

SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTE
NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA

RESIDENTE DE OBRA
Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
T.C. FERNANDO LUNA MEDINA

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.



NUMEROS GENERADORES

NO. DE OBRA: FIS MDF 020/22
 NO. DE CONTRATO: FIS MDF 009-020-024/2022
 DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 12 DE DICIEMBRE EN
 UBICACIÓN: COL. 28 DE ABRIL, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.

ESTIMACION No. 1

No.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	KMS	RESULTADO	TOTAL	CROQUIS	FOTOGRAFIA
			EJE	TRAMO	TIPO								
19.-	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES AL TIRADERO OFICIAL AUTORIZADO MÁS CERCANO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3/KM											
						DEMOLICION DE BANQUETAS						ANEXO	
						65.97	1.50	0.10	4.00	39.58			BANQUETA PONIENTE
						1.40	1.35	0.10	4.00	0.76			
						1.40	1.35	0.10	4.00	0.76			
						3.00	1.35	0.10	4.00	1.62			
						3.65	1.35	0.10	4.00	1.97			
						1.35	1.65	0.10	4.00	0.45			RAMPA
						1.25	1.45	0.10	4.00	0.36			RAMPA
						65.94	1.50	0.10	4.00	39.56			BANQUETA ORIENTE
						8.15	1.35	0.10	4.00	4.40			
						1.00	1.35	0.10	4.00	0.54			
						1.35	1.50	0.10	4.00	0.81			
						1.46	1.38	0.10	4.00	0.81			
						1.25	1.30	0.10	4.00	0.33			RAMPA
						1.35	1.45	0.10	4.00	0.39			RAMPA
						BANQUETA DE CONCRETO AGUA POTABLE							
						-1.53	0.20	0.10	4.00	-0.12			TOMA DOM 1
						-1.53	0.20	0.10	4.00	-0.12			TOMA DOM 2
						-1.54	0.20	0.10	4.00	-0.12			TOMA DOM 3
						-1.54	0.20	0.10	4.00	-0.12			TOMA DOM 4
						-1.54	0.20	0.10	4.00	-0.12			TOMA DOM 5
						-1.55	0.20	0.10	4.00	-0.12			TOMA DOM 6
						-1.49	0.20	0.10	4.00	-0.12			TOMA DOM 7
						0.00	0.20	0.10	4.00	0.00			TOMA DOM 8
						-1.45	0.20	0.10	4.00	-0.12			TOMA DOM 9
						-1.44	0.20	0.10	4.00	-0.12			TOMA DOM 10
						DEMOLICION BANQUETAS ALCANTARILLADO							
						-1.53	0.60	0.10	4.00	-0.37			DESCARGA DOM 1
						-1.53	0.60	0.10	4.00	-0.37			DESCARGA DOM 2
						-1.54	0.60	0.10	4.00	-0.37			DESCARGA DOM 3
						-1.54	0.60	0.10	4.00	-0.37			DESCARGA DOM 4
						-1.54	0.60	0.10	4.00	-0.37			DESCARGA DOM 5
						-1.55	0.60	0.10	4.00	-0.37			DESCARGA DOM 6
										TOTAL	89.03		

OPERADO
 OBRA INFRA ESTRUCTURA
 SOCIAL MUNICIPAL
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 MUNICIPIO DE
 2022

OBSERVACIONES:

SUPERINTENDENTE DE OBRA
 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN A
 NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA

RESIDENTE DE OBRA
 Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
 T.C. FERNANDO LUNA MEDINA

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA
PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.



Ayuntamiento de
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
2021 • 2024

NUMEROS GENERADORES

NO. DE OBRA:	RSMDF 020/22
NO. DE CONTRATO:	RSMDF 009-020-024/2022
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 12 DE DICIEMBRE ENI
UBICACIÓN:	COL. 28 DE ABRIL, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.

E S T I M A C I O N N o 1

CROQUIS

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO

ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES AL TIRADERO OFICIAL AUTORIZADO MÁS CERCANO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.



OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL
MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
2022

OBSERVACIONES:

SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTES
NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA

RESIDENTE DE OBRA
Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
T.C. FERNANDO LUNA MEDINA








NUMEROS GENERADORES

NO. DE OBRA:	#jREFI
NO. DE CONTRATO:	#jREFI
DESCRIPCIÓN:	#jREFI
UBICACIÓN:	#jREFI

E S T I M A C I O N N o. 1

FOTOGRAFIA

#jREFI

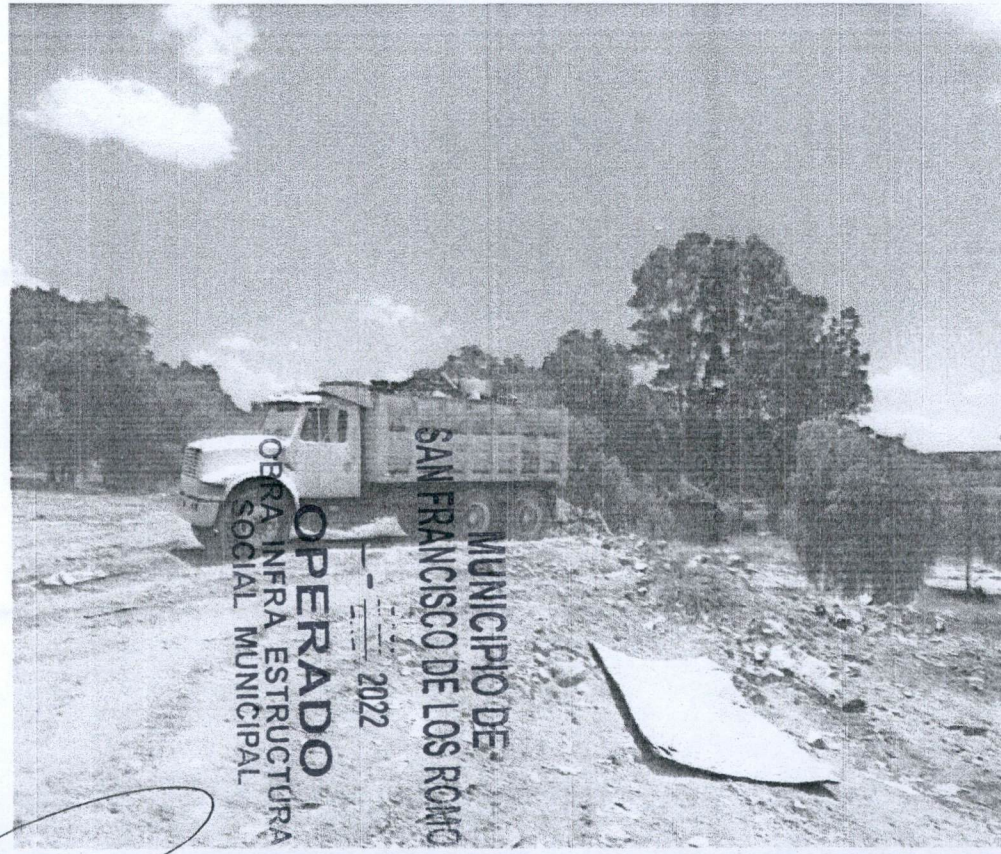

OBSERVACIONES :

SUPERINTENDENTE DE OBRA

#jREFI

#jREFI

RESIDENTE DE OBRA

Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo

#jREFI

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.



NUMEROS GENERADORES

NO. DE OBRA: FISMDF 020/22
 NO. DE CONTRATO: FISMDF 009-020-024/2022
 DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 12 DE DICIEMBRE EN
 UBICACIÓN: COL. 28 DE ABRIL SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.

E S T I M A C I O N N o . 1

No.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	TOTAL	CROQUIS	FOTOGRAFIA
			EJE	TRAMO	TIFO								
27.-	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 10+2 CM ACABADO RAYADO FINO CON BROCHA DE PELO, JUNTAS FRIAS CON DOBLADOR DE 2", SECCION DE LOSAS DE ACUERDO A LA EXISTENTE, INCLUYE: COLADO , CURADO CON MEMBRANA A BASE DE AGUA Y TRABAJO TERMINADO SEGUN FICHA TECNICA FT-200.	M2				56.47	1.50			84.71		ANEXO ACERA PONIENTE	
						-0.60	0.40		5.00	-1.20			
										TOTAL	83.51		

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 2022

OBSERVACIONES:

SUPERINTENDENTE DE OBRA
 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN A
 NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA

RESIDENTE DE OBRA
 Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
 T.C. FERNANDO LUNA MEDINA

NUMEROS GENERADORES

NO. DE OBRA:	FSMDF 020/22
NO. DE CONTRATO:	FSMDF 009-020-024/2022
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 12 DE DICIEMBRE ENI
UBICACIÓN:	COL. 28 DE ABRIL, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.


E S T I M A C I O N N o . 1

CROQUIS

DESCRIPCION DE CONCEPTO

CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 10+-2 CM ACABADO RAYADO FINO CON BROCHA DE PELO, JUNTAS FRIAS CON DOBLADOR DE 2", SECCION DE LOSAS DE ACUERDO ALA EXISTENTE, INCLUYE: COLADO, CURADO CON MEMBRANA A BASE DE AGUA Y TRABAJO TERMINADO SEGUN

C. 16 DE SEPTIEMBRE

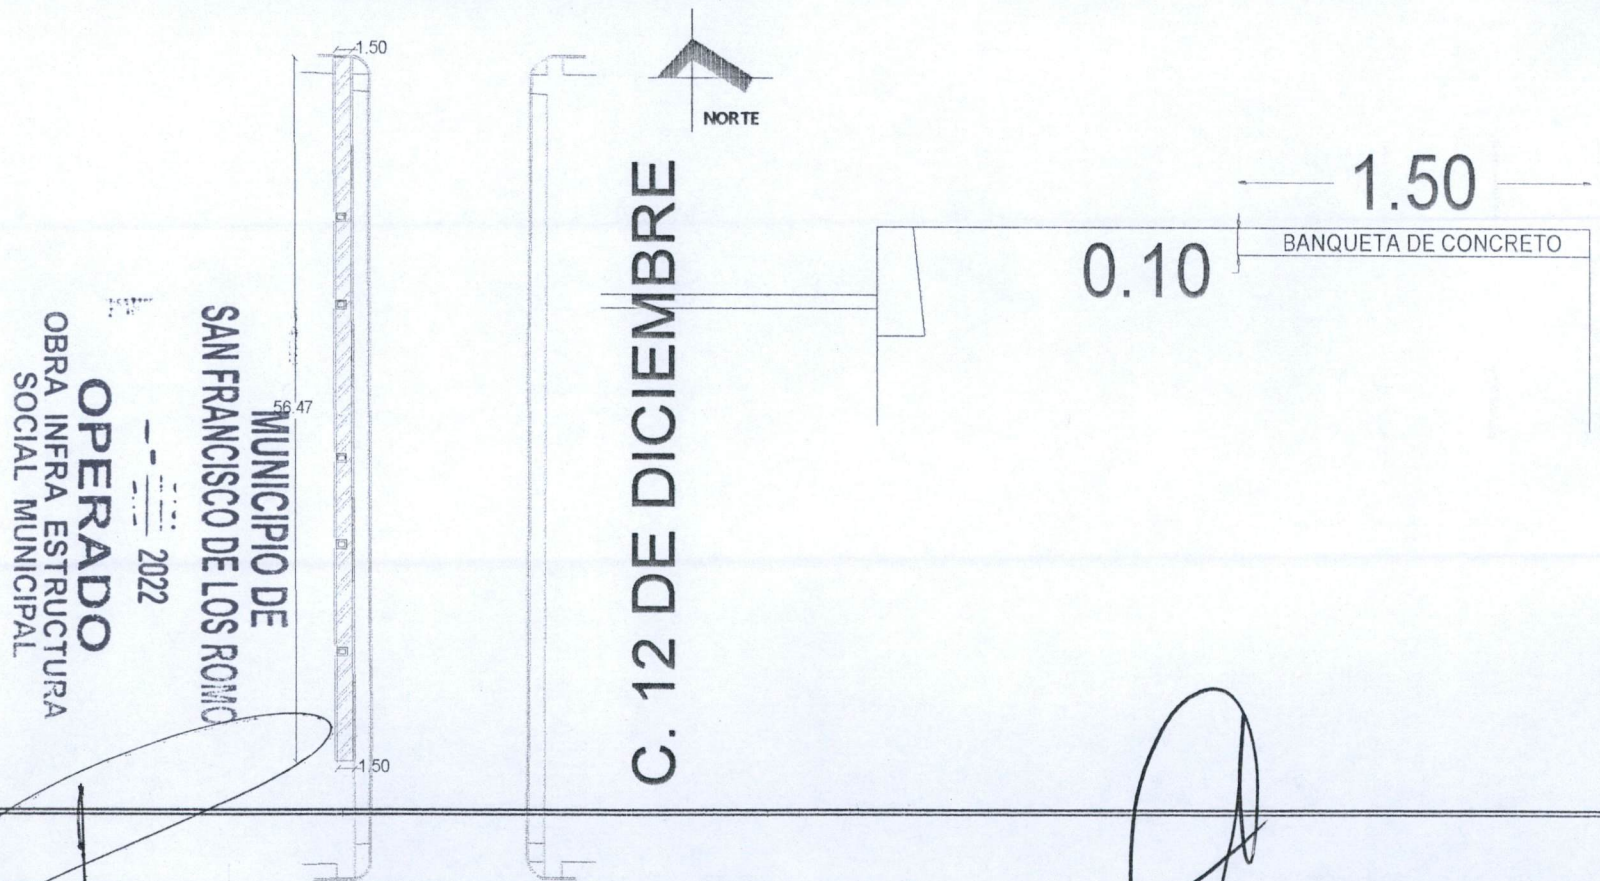

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL
MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
2022

OBSERVACIONES :

SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTE
NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA

C. 15 DE SEPTIEMBRE

RESIDENTE DE OBRA
Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
T.C. FERNANDO LUNA MEDINA

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.



Ayuntamiento de
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
2021 • 2022

NUMEROS GENERADORES

NO. DE OBRA:	FISMDF 020/22
NO. DE CONTRATO:	FISMDF 009-020-024/2022
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 12 DE DICIEMBRE EN
UBICACIÓN:	COL. 28 DE ABRIL, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.

ESTIMACION No. 1

FOTOGRAFIA

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO

CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 10+-2 CM ACABADO RAYADO FINO CON BROCHA DE PELO, JUNTAS FRIAS CON DOBLADOR DE 2", SECCION DE LOSAS DE ACUERDO ALA EXISTENTE, INCLUYE: COLADO , CURADO CON MEMBRANA A BASE DE AGUA Y TRABAJO TERMINADO SEGUN



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 2022

OBSERVACIONES :

SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTE
NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA

RESIDENTE DE OBRA
Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
T.C. FERNANDO LUNA MEDINA

BITÁCORA DE OBRA

HCUA

CONTRATO FISMDF 007,020,024/2022

OBRA FISMDF 020/2022

Con fecha de hoy esta supervisión autoriza las estimaciones numero 2 y 3 Finiquido de la obra FISMDF 020/2022 de la empresa Proyecciones y Construcciones JE de la Peña en Aguascalientes S.A. de C.V. dichas estimaciones del contrato de esta obra, bajo las siguientes características:

Estimación 2

- Periodo del 11 al 24 de Septiembre de 2022
- Entrega de generadores 25 de Octubre de 2022
- Monto base \$ 41,745.91
- Amortización de Anticipo \$ 20,872.95
- Total de retenciones \$ 417.46
- Total a pagar \$ 23,795.17

Estimación 3 Finiquido

- Periodo del 25 al 29 de Septiembre de 2022
- Entrega de generadores 25 de Octubre de 2022
- Monto base \$ 1,858.71
- Amortización de anticipo \$ 0.00
- Total de retenciones \$ 18.59
- Total a pagar \$ 2137.51

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

2022

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

USO DE BITÁCORA
