



Usr: susana  
Rep: rptPoliza

**Municipio de San Francisco de los Romo**  
**ESTADO DE AGUASCALIENTES**

Póliza: C03640 Del 07/09/2022



Fecha y hora de Impresión | 08/sep./2022 02:49 p. m.  
Página | 1

Concepto: FISM 2022 PAGADO EST 1 OBRA FISMDF 023/2022 REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN CALLE VIÑEDOS CALIFOR. GP Folio: 226

Beneficiario: AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-2501-K013-J04-61401-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$867,745.82		GP Folio: 226
0002	8260-2501-K013-J04-61401-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y		\$867,745.82	GP Folio: 226
0003	1112-003-002	Bancomer Cta. 011793039-9 FISM		\$426,392.35	GP Folio: 226
0004	1134-003-003	AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA		\$433,872.91	FISM 2022 PAGADO EST 1 OBRA FISMDF 023/2022
0005	2117-9-005-001	0.1% COLEGIO DE		\$748.06	FISM 2022 PAGADO EST 1 OBRA FISMDF 023/2022
0006	2117-9-005-002	0.2% ORGANO SUPERIOR DE		\$1,496.11	FISM 2022 PAGADO EST 1 OBRA FISMDF 023/2022
0007	2117-9-005-003	0.2% INST. DE CAPACIT. DE LA		\$1,496.11	FISM 2022 PAGADO EST 1 OBRA FISMDF 023/2022
0008	2117-9-005-004	0.5% CONTRALORIA MUNICIPAL		\$3,740.28	FISM 2022 PAGADO EST 1 OBRA FISMDF 023/2022
0009	2113-000635	AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA	\$867,745.82		GP Folio: 226
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>1,735,491.64</b>	<b>1,735,491.64</b>	

**MUNICIPIO DE**  
**SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**  
-- 2022  
**OPERADO**  
**OBRA INFRA ESTRUCTURA**  
**SOCIAL MUNICIPAL**



Fecha y hora de consulta

07/09/2022 1:17:30 PM

Contrato

00796395

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO  
DE LOS ROMO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

## Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

## Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

## Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: EST 1 FISDMF 023

Importe de la operación: 426,392.35 MXP

Cuenta de retiro: 0117930399

Cuenta de depósito: 072010008168421428

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE SAN FRA  
NCISCO DE LOS ROMOTitular de la cuenta: AZAEL JARIB CORDOVA  
HUERTA

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha de creación: 07/09/2022

Fecha de aplicación: 07/09/2022

Concepto de pago: PAGO EST 1 FISDMF 11-023

Referencia numérica: 070922

Instrumento de seguridad: ASD 6550927880

Hora de captura en el canal: 13:17:11

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000629124

Clave de rastreo: 002601002209070000629124

Folio de firma: 0067596018

Folio único: 1401202209071317110067596024

## Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	07/09/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	07/09/2022

RFC emisor: COHA811227BM0  
 Nombre emisor: AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA  
 Folio: 277-2  
 RFC receptor: MSF920130TQ9  
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO  
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: 6F4BC8A6-DEB9-4C1D-9125-9D1BAF8DAB7C  
 No. de serie del CSD: 00001000000504903550  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 20266 2022-09-15 12:38:27  
 Efecto de comprobante: Pago  
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
84111506		1	ACT		0	0			
Descripción		Pago							

Moneda: Los códigos asignados para las transacciones en que intervenga ninguna moneda  
 Subtotal: \$ 0.00  
 Total: \$ 0.00

**Información del pago**

Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)  
 Fecha de pago: 2022-09-07 12:00:00  
 Moneda de pago: Peso Mexicano  
 Monto: 426392.35

**Documento relacionado**

Id documento: 81329D60-BFA9-428F-B47C-838DA1D6272B  
 Folio: 277  
 Número parcialidad: 2  
 Moneda del documento relacionado: Peso Mexicano  
 Método de pago del documento relacionado: Pago en parcialidades o diferido  
 Importe de saldo anterior: 727248.67  
 Importe pagado: 426392.35  
 Importe de saldo insoluto: 300856.32

**Sello digital del CFDI:**

eEX5pdBrcCHloGjB4kDMVW6XpMFwGGf5N+cnk5k/ZGkkt/WBzGjmvyc3s1Xg8JclwY5pdKQm6E7Vb7T+tbPNw4F8LknFZG9NWA8jmqSkUCLiojp7QrPiUiFYZ/fYQ+EdKLM9hd8uzBOIE5rJ9YHfMz8oi54QH9FOgB3uRTJifjUDLoEDXyRO68doK0bcRm3u6o6FCu54WXXK69Mortcvs7VQUdtSKM6lPdDzW8klDxnTYcDiD4J1jULk1deEwAFKW5ky7nvaDKf0ydUBKwy4GeZ2rOEmIEQNxDqJsgdWBE3qww2GzPVTb5DZXZTeZtoXcC31G03e1ObcXwkyyg==

**Sello digital del SAT:**

CIKEb9pBolb2CdXZ+IAXE8t0p481gicYBdbmlrZIVU5blmNjllMgAKXGUK3XF65dhGbkNDhrjWtVn98kviUObi7uDG4OYH2XISybBZIEWq+79pQKTFuFsvEPUHqT0T5pBpYpGVIP/u+uRC73RHfLR8oAx88c+xnU544tH3ZUBHYSEHCzaxzn5KK1LNDuyOawhd3HxFknKvIrSyASRPev5yHZHU10GZ+A07iO/osAuQaAVdG+vJiX7AC+EnW/thAw30xpd9Sd7MY3wmtDy4bOgHxLU4bcNmuMdAL1rcv0XjYe7fmaeYAWw6s/3rbE7q1v0hhim92rvp5MB1Qw==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|6F4BC8A6-DEB9-4C1D-9125-9D1BAF8DAB7C|2022-09-15T12:42:50|SAT970701NN3|eEX5pdBrcCHloGjB4kDMVW6XpMFwGGf5N+cnk5k/ZGkkt/WBzGjmvyc3s1Xg8JclwY5pdKQm6E7Vb7T+tbPNw4F8LknFZG9NWA8jmqSkUCLiojp7QrPiUiFYZ/fYQ+EdKLM9hd8uzBOIE5rJ9YHfMz8oi54QH9FOgB3uRTJifjUDLoEDXyRO68doK0bcRm3u6o6FCu54WXXK69Mortcvs7VQUdtSKM6lPdDzW8klDxnTYcDiD4J1jULk1deEwAFKW5ky7nvaDKf0ydUBKwy4GeZ2rOEmIEQNxDqJsgdWBE3qww2GzPVTb5DZXZTeZtoXcC31G03e1ObcXwkyyg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-09-15 12:42:50

No. de serie del certificado SAT: 00001000000504465028



MUNICIPIO DE  
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.

**PAGADO  
 FINANZAS**

MUNICIPIO DE  
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

2022  
**OPERADO**  
 OBRA INFRA ESTRUCTURA  
 SOCIAL MUNICIPAL

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:pago10="http://www.sat.gob.mx/Pagos" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" Version="3.3" Folio="277-2" Fecha="2022-09-15T12:38:27"
Sello="eEX5pdBreCHIoGjB4kDMVW6XpMFwGGf5N+cnk5k/ZGkkt/WBzGjmvyc3s1Xg8JcIwY5pdkQm6E7Vb7T+tbPNw4F8LknFZG9NWA8jmQSkUCLic
NoCertificado="00001000000504903550" SubTotal="0"
Certificado="MIIGPzCCBCegAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDQ5MDM1NTAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwggGEMSAwHgYDVQQDDBdVVVR
Moneda="XXX" Total="0" TipoDeComprobante="P" LugarExpedicion="20266" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/Pagos http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pagos/Pagos10.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="612" Nombre="AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA" Rfc="COHA811227BM0"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO" Rfc="MSF920130TQ9" UsoCFDI="P01"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="0" ValorUnitario="0" Descripcion="Pago" ClaveUnidad="ACT" Cantidad="1" ClaveProdServ="84111506"/>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Complemento>
    - <pago10:Pagos Version="1.0">
      - <pago10:Pago Monto="426392.35" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="03" FechaPago="2022-09-07T12:00:00">
        <pago10:DoctoRelacionado Folio="277" ImpSaldoInsoluto="300856.32" ImpPagado="426392.35" ImpSaldoAnt="727248.67"
          NumParcialidad="2" MetodoDePagoDR="PPD" MonedaDR="MXN" IdDocumento="81329D60-BFA9-428F-B47C-838DA1D6272B"/>
      </pago10:Pago>
    </pago10:Pagos>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/Timb.+FiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
      SelloSAT="CIKEb9pBoIb2CdXZ+lJAXE8t0p481glcYBdbmIrZiVU5blmNnjlhMgAKXxGUK3XF65dhGbkNDhrjWtVn98kvlUObi7uDG4OYH2"
      NoCertificadoSAT="00001000000504465028"
      SelloCFD="eEX5pdBreCHIoGjB4kDMVW6XpMFwGGf5N+cnk5k/ZGkkt/WBzGjmvyc3s1Xg8JcIwY5pdkQm6E7Vb7T+tbPNw4F8LknFZG9N
      RfcProvCertif="SAT970701NN3" FechaTimbrado="2022-09-15T12:42:50" UUID="6F4BC8A6-DE89-4C1D-9125-9D1BAF8DAB7C"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

**MUNICIPIO DE**  
**SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**  
 - - - - 2022  
**OPERADO**  
**OBRA INFRA ESTRUCTURA**  
**SOCIAL MUNICIPAL**

Dirección de  
**OBRAS PÚBLICAS** MUNICIPIO  
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO  
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



Ayuntamiento de  
**SAN FRANCISCO  
DE LOS ROMO**  
2021 ♦ 2024



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN  
FRANCISCO DE LOS ROMO  
No. Oficio: DOP/354/22  
San Francisco de los Romo, Ags., 06 de septiembre de 2022  
Asunto: LIBERACIÓN DE PAGO

**C.P.MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ**  
**DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION**  
**PRESENTE**

Por medio del presente le remito la documentación de la estimación No. 1 para que se realicen los trámites necesarios para su pago.

No. de Obra: FISMDF 023/2022

Nombre de la Obra: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE VIÑEDOS CALIFORNIA ENTRE LA AVENIDA CONSTITUCIÓN Y CALLE VIÑEDOS SAN MARCOS

Programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2022

Contratista: C. I.C. Azael Jarib Córdova Huerta

Contrato: FISMDF023/2022 No Factura: 277

Objeto del Contrato: PAVIMENTACION EN CALLE VIÑEDOS CALIFORNIA

Monto del Contrato: \$1,480,014.85 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CATORCE PESOS 85/100 M.N)

Monto a Pagar: \$426,392.35 (CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 35/100 M.N.)

Sin otro particular de momento, me es grato enviarle un cordial saludo agradeciendo de antemano las atenciones al presente.

ATENTAMENTE

ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA  
DIRECTOR DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO


MUNICIPIO DE  
**SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**

2022

**OPERADO**  
OBRA INFRA ESTRUCTURA  
SOCIAL MUNICIPAL

C.c.p. Archivo

Av. Benito Juárez S/N, Rancho La Trinidad,  
San Francisco de los Romo, Ags. Tel: (465) 967 0124 ext. 1654



Ayuntamiento de  
**SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**  
2021 • 2024

**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**  
CÉDULA DE SEGUIMIENTO A ESTIMACIONES DE OBRA

DATOS GENERALES			
CONTRATISTA: <b>ING. AZAFI JAVIER CORDOVA HUERTA</b>	Nº DE CONTRATO: <b>FISMDF 023/2022</b>		
SUPERVISOR: <b>T.C. FERRANIX LUAN MENDIJA</b>	Nº DE OBRA: <b>FISMDF 023/2022</b>		
OBRA: <b>REHABILITACION DE PAVIMENTACION C. VIA PUEBLOS CALIFORNIA</b>	Nº DE FACTURA: <b>277</b>		
FECHA DE CORTE: <b>DEL 31 DE AGOSTO DEL 2022</b>	Nº DE ESTIMACION: <b>020 (1)</b>		
	IMPORTE LIQUIDO: <b>426.392.35</b>		
FORMATO DE NUMEROS GENERADORES			
INGRESO	REVISION	CAPTURA EN SISTEMA	ENTREGA DE PRE-FACTURA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
CONTRATISTA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	SUPERVISOR
<b>31/08/2022</b>	<b>02/ SEP/ 2022</b>	<b>02/ SEP/ 2022</b>	<b>02/ SEP/ 2022</b>
FORMATO DE ESTIMACION			
INGRESO	REGISTRO	SUPERVISOR	JEFE DE DEPARTAMENTO
<i>[Signature]</i>	<b>Donel Chavez Avelon</b>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
CONTRATISTA	CONTROL DE ESTIMACIONES	RECIBIDO	RECIBIDO
<b>06 Sep 22</b>	<b>06 Sep 22</b>	<b>06 Sep 22</b>	<b>06 Sep 22</b>
		AUTORIZADO	AUTORIZADO
CONTENIDO			
DEVOLUCION	FECHA DE DEVOLUCION: <b>02 Sep 2022</b>	DIRECTOR GENERAL	
	FECHA DE REINGRESO: <b>06 Sep 2022</b>	<i>[Signature]</i>	
	MOTIVO DE LA DEVOLUCION: <b>Falta de bitácoras</b>	ING. JOSÉ DE FRANCISCA GARCIA	
	Claves	RECIBIDO	
		AUTORIZADO	
		FINANZAS	
		RECIBIDO	
		AUTORIZADO	
		RECIBIDO	
		AUTORIZADO	
FRAMITE DE PAGO			
FECHA DE INICIO DE TRAMITE EN DOP-SFR	FECHA DE LIBERACION	OFICIO DE LIBERACION	FECHA DE ENTREGA
<b>31</b>	<b>06</b>	<b>06</b>	<b>02</b>
DIA: MES: AÑO:	DIA: MES: AÑO:	DIA: MES: AÑO:	DIA: MES: AÑO:
<b>31 08 22</b>	<b>06 Sep 22</b>	<b>06 Sep 22</b>	<b>02</b>
			DIRECCION DE EGRESOS.

**MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**  
OPERACION  
OBRA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
2022

# PRE-FACTURA Normal

PRE-FACTURA DEL CONTRATISTA: AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA (437)

A NOMBRE DE: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO  
 RFC: MSF920130TQ9  
 DIRECCION: FCO ROMO JIMENEZ 102, SAN JOSE DE BUENAVISTA, SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS,  
 CIUDAD: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE L ESTADO: AGUASCALIENTES

DESCRIPCION

PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 Del 01 Ago 2022 al 31 Ago 2022

DE LA OBRA: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN CALLE VIÑEDOS CALIFORNIA ENTRE LA AVENIDA CONSTITUCION Y CALLE VIÑEDOS SAN MARCOS

UBICADA EN: EN EX VIÑEDOS GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTE  
 CON AMPARO DEL CONTRATO No.: FISMDF 023/2022

DE FECHA: 18/07/2022

BAJO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA:

Inversion Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal 2022

Programa SF PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES  
 SubPrograma 01 CONCRETO

Obra. FISMDF 023/2022 REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN CALLE VIÑEDOS CALIFORNIA ENTRE LA AVENIDA CONSTITUCION  
 Localizacion EN EX VIÑEDOS GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES

MONTO BASE \$748,056.74  
 AJUSTE DE COSTOS (+) \$0.00  
 AMORTIZACION DE ANTICIPO (-) \$374,028.37  
 SUBTOTAL \$374,028.37  
 IVA (+) \$59,844.54  
 SUBTOTAL CON IVA \$433,872.91

CAPACITACION DE LOS TRABAJADORES DEL CONTRATISTA \$1,496.11 ( 0.20%)  
 COLEGIOS DE PROFESIONISTAS SEGUN CORRESPONDA \$748.06 ( 0.10%)  
 SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA \$0.00 ( 0.00%)  
 FISCALIZACION DEL H. CONGRESO DEL ESTADO \$1,496.11 ( 0.20%)

TOTAL DE RETENCIONES (-) \$7,480.56  
 SANCION POR RETRASO (-) \$0.00  
 SUBTOTAL MENOS RETENCIONES \$426,392.35  
 RETENCION POR RETRASO(-) \$0.00  
 REINTEGRO POR RETENCION \$0.00  
 OTRAS SANCIONES(-) \$0.00  
 TOTAL A PAGAR \$426,392.35

Avance Fisico Real %  
 Avance Fisico Programado %  
 Fecha Terminación Prog.

CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 35/100 M.N.

MUNICIPIO DE  
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO  
 2022  
 OPERADO  
 OBRA INFRA ESTRUCTURA  
 SOCIAL MUNICIPAL

## ESTADO DE CUENTA

Obra. FISMDF 023/2022 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE VIÑEDOS CALIFORNIA ENTRE LA AVENIDA CONSTITUCIÓN Y CALLE VIÑEDOS SAN MARCOS EN EX VIÑEDOS GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Localizacion Fuente Financ. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura So Programa SF PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES SubPrograma 01 CONCRETO Contratista AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA (437) Contrato FISMDF 023/2022 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE VIÑEDOS CALIFORNIA ENTRE LA AVENIDA ESTIMACION No. 1 Del 01 Ago 2022 al 31 Ago 2022 CONSTITUCIÓN Y CALLE VIÑEDOS, SAN MARCOS	Total Contrato 1,480,014.85 Total Ampliaciones 0.00 Total Contratado 1,480,014.85 Anticipo ( 50 %) 740,007.42 Estimado Anterior 0.00 Esta Estimacion <b>433,872.91</b> Total Estimado 1,173,880.33 Total por Estimar 306,134.52
---	--

No. Estimar.	Período	Importe Estimacion	Amortización de Anticipo (-)	IVA (+)	Cargo a la Obra	DEDUCCIONES (-)			Retencion (-)	Reintegro (+)	Sanciones (-)	Importe a Pagar
						CMIC(0)	Calle, Prof.(0)	SFE(0,3)				
		637,937.43		102,059.99	740,007.42							740,007.42
1	Del 01 Ago 2022 al 31 Ago	748,056.74	374,028.37	59,844.54	433,872.91	1,496.11	748.06	0.00	1,496.11	0.00	0.00	426,392.35
<b>TOTALES</b>		748,056.74	374,028.37	161,914.53	1,173,880.33	1,496.11	748.06	0.00	1,496.11	0.00	0.00	1,166,399.77



**MUNICIPIO DE  
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**  
 2022  
**OPERADO**  
 OBRA INFRA ESTRUCTURA  
 SOCIAL MUNICIPAL


# RESUMEN DE ESTIMACION

Obra.	FISMDF 023/2022 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE VIÑEDOS CALIFORNIA ENTRE LA AVENIDA CONSTITUCIÓN Y CALLE VIÑEDOS EN SAN MARCOS GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES	Total Contrato \$1,480,014.85
Localización	EN SAN MARCOS GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES	Total Ampliaciones \$0.00
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal.	Total Contratado \$1,480,014.85
Programa	SF PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES	Anticipo ( 50 ) % \$740,007.42
SubPrograma	01 CONCRETO	Estimado Anterior \$0.00
Supervisor	FERNANDO LUNA MEDINA (LUMF740415)	Esta Estimación \$433,872.91
Contratista	AZAEEL JARIB CORDOVA HUERTA (437)	Total Estimado \$1,173,880.33
Contrato		Saldo por Estimar \$306,134.52
Estimación No.	1	
Recibi de	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO la Cantidad de: \$433,872.91 CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 91/100 M.N.	

<b>GRUPO</b>	<b>PARTIDA</b>	
	* REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE VIÑEDOS CALIFORNIA ENTRE LA AVENIDA CONSTITUCIÓN Y CALL	\$748,056.74
	- TERRACERIAS	\$83,684.14
	- PAVIMENTO	\$664,372.60
	<b>SUMA</b>	<b>\$748,056.74</b>
	AJUSTE DE COSTOS (+)	\$0.00
	AMORTIZACION DE ANTICIPO (-)	\$374,028.37
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$374,028.37</b>
	IVA (+)	\$59,844.54
	<b>SUBTOTAL CON IVA</b>	<b>\$433,872.91</b>

  
**MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**  
 2022  
**OPERADO**  
 OBRA INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

  
 T.C. FERNANDO LUNA MEDINA (LUMF740415)  
 SUPERVISOR

  
 AZAEEL JARIB CORDOVA HUERTA (COHA811227BM0)  
 Contratista

# CONCEPTOS DE ESTIMACION

Normal



Obra.	FISMDF 023/2022 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE VIÑEDOS CALIFORNIA ENTRE LA AVENIDA CONSTITUCIÓN Y CALLE VIÑEDOS SAN MARCOS	Total Contrato	\$1,480,014.85
Localización	EN EX VIÑEDOS GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES	Total Ampliaciones	\$0.00
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal.	Total Contratado	\$1,480,014.85
Programa	SF PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES	Anticipo ( 50 ) %	\$740,007.42
SubPrograma	01 CONCRETO	Estimado Anterior	\$0.00
Supervisor	FERNANDO LUNA MEDINA (LUMF740415)	Esta Estimacion	\$433,872.91
Contratista	AZAEEL JARIB CORDOVA HUERTA (437)	Total Estimado	\$1,173,880.33
Contrato	FISMDF 023/2022 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE VIÑEDOS CALIFORNIA ENTRE LA AVENIDA CONSTITUCIÓN Y CALLE VIÑEDOS SAN MARCOS	Saldo por Estimar	\$306,134.52
Estimacion No.	1		
Recibió de	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO la Cantidad de: \$433,872.91 CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 91/100 M.N.		

No.	Concepto	Unid. Med.	Volumen			Precio Contratado	Importe
			Contratado	Acumulado	Anterior		

GRUPO: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE VIÑEDOS CALIFORNIA ENTRE LA AVENIDA CONSTITUCIÓN Y CALLE VIÑEDOS SAN MARCOS EN EX VIÑEDOS GUADALUPE EN EL MUN							
PARTIDA:	TERRACERIAS						
1	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO Y/O CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CON MAQUINARIA, INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE ACORPIO PARA SU CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA.	M3	85.49	80.90	0.00	80.90	\$294.89
4	CONFORMACION DE SUBBASE EXISTENTE POR MEDIOS MECANICOS AL 95% DE SU P.V.S.M. INCLUYE: ESCARIFICACION, MANIOBRAS, HUMEDECIDO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO, LIMPIEZAS.	M2	1,709.80	1,084.06	0.00	1,084.06	\$25,323.64
5	CARGA MECÁNICA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE ESCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO AL 1er. KM, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3	273.57	456.28	0.00	456.28	\$16,695.29
6	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES AL TIRADERO, OFICIAL AUTORIZADO MÁS CERCANO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3/KM	1,094.28	1,368.84	0.00	1,368.84	\$17,808.61
						182.71	
						274.56	
							\$13.01
							\$83,684.14

GRUPO: PAVIMENTO							
7	PAVIMENTO HIDRÁULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-38 KG/CM2, T.M.A. 1 1/2" RR 7 DIAS, GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 8 A 8 CMS. FRAGUADO NORMAL, DE 15 CMS. DE ESPESOR, INC: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, REGLEADO, ACABADO RAYADO CON CEPILL	M2	1,917.30	1,126.94	0.00	1,126.94	\$585.46
10	CONSTRUCCION DE DENTELLON DE 15x30 cm DE CONCRETO HECHO EN OBRA F=250 Kg/cm2 TMA 38 mm, INCLUYE: CIMBRADO COLADO, ALINEADO, NIVELADO, DESCIMBRADO, CURADO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS.	m	10.10	16.18	0.00	16.18	\$283.95
						6.08	
							\$8,594.31
							\$664,372.60
							\$748,056.74

*(Handwritten signature)*

T.C. FERNANDO LUNA MEDINA (LUMF740415)  
SUPERVISOR

**MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**  
2022  
**OPERADO**  
OBRA INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

AZAEEL JARIB CORDOVA HUERTA (COHA811227BM0)  
CONTRATISTA

No.	Concepto	Unid. Med.	Volumen			Precio Contratado	Importe
			Contratado	Acumulado	Anterior		
Total Presupuestado							\$748,066.74
Ajuste de Costos							\$0.00
Total							\$748,066.74

MUNICIPIO DE  
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

2022

**OPERADO**  
OBRA INFRA ESTRUCTURA  
SOCIAL MUNICIPAL

AZAEEL JARIB-CORREOVA HUERTA (COHA811227BM0)

CONTRATISTA

T.C. FERNANDO LUNA MEDINA (LUMIF740415)

SUPERVISOR



**MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES**

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**

**PRESUPUESTO**

**OBRA:** REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE VIÑEDOS CALIFORNIA ENTRE LA AVENIDA CONSTITUCIÓN Y CALLE VIÑEDOS SAN MARCOS EN EX VIÑEDOS GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
**LUGAR:** MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

TIPO	CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	ESTIMACION 01	
							CANTIDAD	IMPORTE
Capítulo	AA	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE VIÑEDOS CALIFORNIA ENTRE LA AVENIDA				\$1,280,608.44		\$748,056.74
Subcapítulo	AA001	TERRACERIAS				\$89,397.58		\$83,684.14
Concepto	DEM PAV ASF	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO Y/O CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CON MAQUINARIA, INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE ACOPIO PARA SU CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA.	M3	85.49	\$294.89	\$25,210.15	80.90	\$23,856.60
Concepto	PAVI005B	CONFORMACION DE SUBBASE EXISTENTE POR MEDIOS MECANICOS AL 95% DE SU PVSM . INCLUYE: ESCARIFICACION, MANIOBRAS, HUMEDECIDO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO, LIMPIEZAS.	M2	1709.80	\$23.36	\$39,940.93	1,084.06	\$25,323.64
Concepto	ACAR020P	CARGA MECÁNICA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE ESCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO AL 1er. KM, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3	273.57	\$36.59	\$10,009.93	456.28	\$16,695.29
Concepto	ACAR021P	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES AL TIRADERO OFICIAL AUTORIZADO MÁS CERCAÑO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3/KM	1094.28	\$13.01	\$14,236.58	1,368.84	\$17,808.61
Subcapítulo	AA003	PAVIMENTO				\$1,191,210.86		\$664,372.60
Concepto	PAVI050	PAVIMENTO HIDRÁULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-38 KG/CM2, T.M.A. 1 1/2" RR 7 DÍAS, GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 6 A 8 CMS. FRAGUADO NORMAL, DE 15 CMS. DE ESPESOR, INC: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, REGLEADO, ACABADO RAYADO CON CEPILLO DE CERDAS DE ALUMINIO, CON DOBLADOR, CORTE CON DISCO,	M2	1917.30	\$585.46	\$1,158,770.88	1,126.94	\$659,778.29
Concepto	GUAR002	CONSTRUCCION DE DENTELLON DE 15x30 cm DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=250 Kg/cm2 TMA 38 mm. INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, ALINEADO, NIVELADO, DESCIMBRADO, CURADO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS.	M	10.10	\$283.95	\$2,902.58	16.18	\$4,594.31

SUBTOTAL \$1,313,961.76  
IVA \$210,233.88  
TOTAL \$1,524,195.64

\$748,056.74  
\$128,052.62  
\$928,381.47

MUNICIPIO DE  
**SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**  
2022  
**OPERADO**  
**OBRA INFRA ESTRUCTURA**  
**SOCIAL MUNICIPAL**




NO. DE OBRA:  
 NO. DE CONTRATO:  
 DESCRIPCIÓN:  
 UBICACIÓN:

REHABILITACION DE PAVIMENTO Y TOMAS HIDRAULICAS EN CALLE VINEDOS CALIFORNIA, EXVINEDOS DE GUADALUPE, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO CABAERA MUNICIPAL,SFR

CROQUIS

E S T I M A C I O N N O T

A	REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN CALLE VINEDOS CALIFORNIA ENTRE LA AVENIDA CONSTITUCIÓN Y CALLE VINEDOS SAN MARCOS EN EX VINEDOS GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES
AO1	PRELIMINARES
1	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO Y/O CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CON MAGUINARIA, INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE ACOPIO PARA SU CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA.

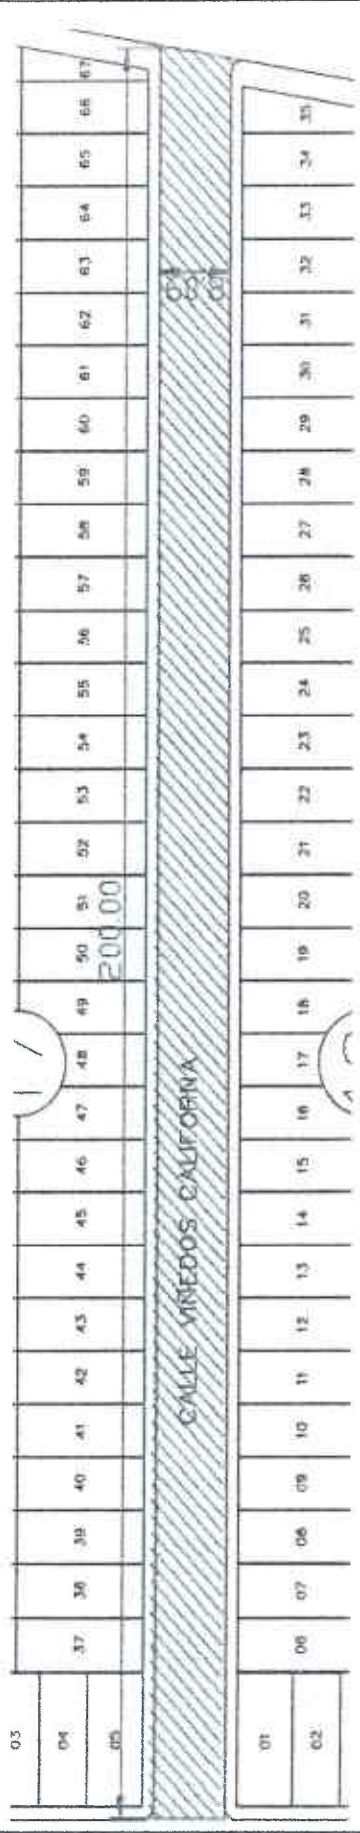

OBSERVACIONES :

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO  
 2022  
**OPERADO**  
 OBRA INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

RESIDENTE  
 Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo  
**ING. FERNANDO LUNA MEDINA**

SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)  
**ING. AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA.**



PRESIDENCIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

ING. AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA.

NO. DE OBRA:  
NO. DE CONTRATO:







DESCRIPCIÓN:

UBICACIÓN:

REHABILITACION DE PAVIMENTO Y TOMAS HIDRAULICAS EN CALLE VIÑEDOS CALIFORNIA, EXVIÑEDOS DE GUADALUPE, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO CABAERA MUNICIPAL SFR

FOTOGRAFIAS

ESTIMACION NO. 1

A	PRELIMINARES	REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN CALLE VIÑEDOS CALIFORNIA ENTRE LA AVENIDA CONSTITUCIÓN Y CALLE VIÑEDOS SAN MARCOS EN EX VIÑEDOS GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES
1	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO Y/O CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CON MAGUINARIA. INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE ACOPIO PARA SU CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA.	     

OBSERVACIONES :

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO  
2022  
OPERADO  
OBRA INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)

ING. AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA.

RESIDENTE

Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo  
ING. FERNANDO LUNA, MEDINA



PRESIDENCIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

**ING. AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA.**

NO. DE OBRA:  
NO. DE CONTRATO:

DESCRIPCIÓN:

UBICACIÓN:

REHABILITACION DE PAVIMENTO Y TOMAS HIDRAULICAS EN CALLE VIÑEDOS CALIFORNIA, EXVINEDOS DE GUADALUPE, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO CABAERA MUNICIPAL,SFR

**NUMEROS GENERADORES**

**E S T I M A C I O N N O 1**

No.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	PIAS	RESULTADO	TOTAL
			EJE	TRAMO						
4	CONFORMACION DE SUBBASE EXISTENTE POR MEDIOS MECANICOS AL 95% DE SU PVSM . INCLUYE: ESCARIFICACION, MANIOBRAS, HUMEDECIDO, ACARROS DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO, LIMPIEZAS.	M2			134.00	8.09		1.00	1,084.06	1,084.06
									TOTAL =	1,084.06

OBSERVACIONES :

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO  
2022  
OPERADO OBRA INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)  
ING. AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA.

RESIDENTE  
Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo  
ING. FERNANDO LUNA MEDINA



PRESIDENCIA MUNICIPAL



Municipio de SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

ING. AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA.


NO. DE OBRA:  
NO. DE CONTRATO:  
DESCRIPCIÓN:  
UBICACIÓN:

REHABILITACION DE PAVIMENTO Y TOMAS HIDRAULICAS EN CALLE VINEDOS CALIFORNIA, EXVINEDOS DE GUADALUPE, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO CABAERA MUNICIPAL,SFR

CROQUIS

E S T I M A C I O N N O. 1

4 CONFORMACION DE SUBBASE EXISTENTE POR MEDIOS MECANICOS AL 95% DE SU PYSM. INCLUYE: ESCARIFICACION, MANIOBRAS, HUMEDECIDO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO, LIMPIEZAS.

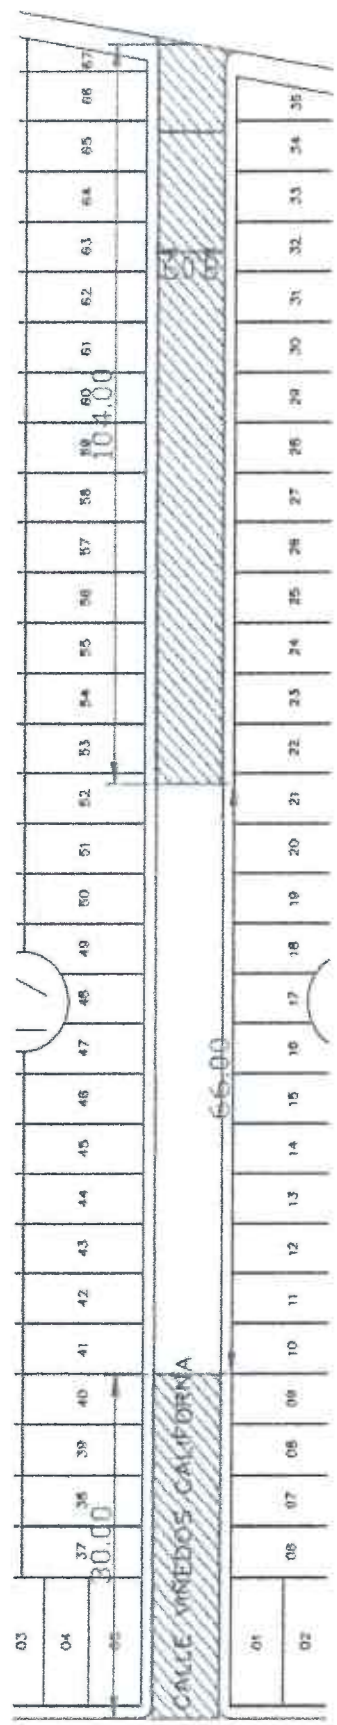

OBSERVACIONES :

*[Signature]*

SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)

ING. AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA.

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO  
2022  
OPERADO  
OBRA INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

*[Signature]*

RESIDENTE

Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo  
ING FERNANDO LUNA MEDINA

PRESIDENCIA MUNICIPAL



ING. AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA.





NO. DE OBRA:
NO. DE CONTRATO:
DESCRIPCIÓN:
UBICACIÓN:

REHABILITACION DE PAVIMENTO Y TOMAS HIDRAULICAS EN CALLE VIÑEDOS CALIFORNIA, EXVIÑEDOS DE GUADALUPE, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO CABAERA MUNICIPAL.SFR

FOTOGRAFIAS

E S T I M A C I O N N O. 1

CONFORMACION DE SUBBASE EXISTENTE POR MEDIOS MECANICOS AL 95% DE SU PVM. INCLUYE: ESCARIFICACION, MANIOBRAS, HUMEDECIDO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO. LIMPIEZAS.

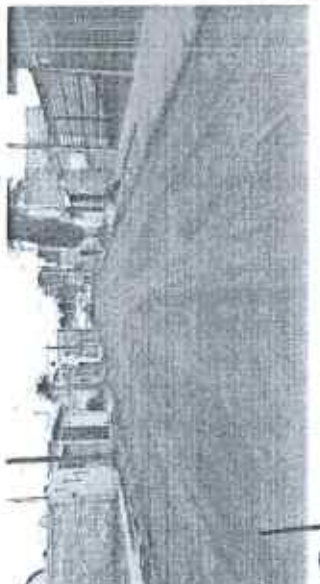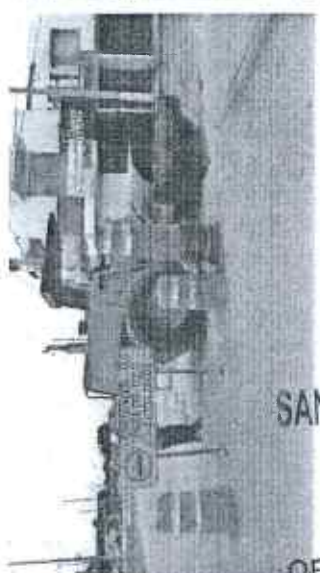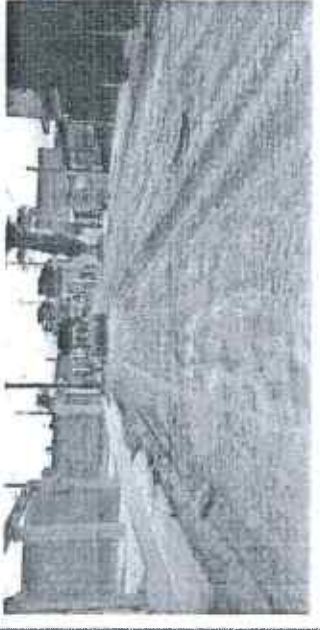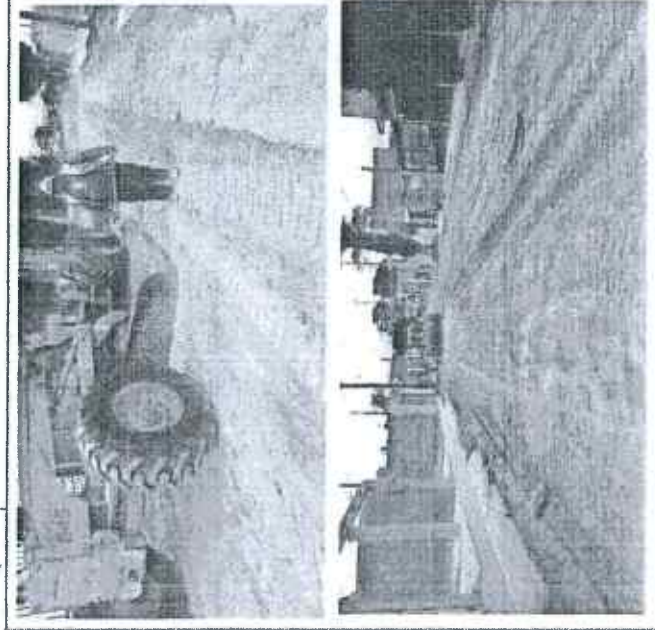

OBSERVACIONES :

--

SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)  
 ING. AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA.

MUNICIPIO DE  
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO  
 2022  
 OPERADO  
 OBRA INFRA ESTRUCTURA  
 SOCIAL MUNICIPAL

RESIDENTE  
 Direccion de Obras Publicas del Municipio de San Francisco de los Romo  
 ING. FERNANDO LUNA MEDINA



PRESIDENCIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO



### NUMEROS GENERADORES

### ING. AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA.

NO. DE OBRA:  
NO. DE CONTRATO:  
DESCRIPCIÓN:  
UBICACIÓN:

REHABILITACION DE PAVIMENTO Y TOMAS HIDRAULICAS EN CALLE VINEDOS CALIFORNIA, EXVIÑEDOS DE GUADALUPE, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO CABAERA MUNICIPAL SER

## ESTIMACION NO.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	TOTAL
			ESTR	TIPO						
5	CARGA MECÁNICA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE ESCAVACION Y DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO AL 1er. KM. VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3		DEMOLICION	200.00	8.09	0.05	1.00	80.90	80.90
				CORTE	200.00	8.09	0.10	1.00	161.80	161.80
						66.00	8.09	0.40	1.00	213.58
									<b>TOTAL =</b>	<b>456.28</b>

OBSERVACIONES:

MUNICIPIO DE  
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO  
2022  
OPERADO  
OBRA INFRA ESTRUCTURA  
SOCIAL MUNICIPAL

SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)

ING. AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA.

RESIDENTE

Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo

ING. FERNANDO LUNA MEDINA

PRESIDENCIA MUNICIPAL



ING. AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA.


NO. DE OBRA:  
 NO. DE CONTRATO:  
 DESCRIPCIÓN:  
 UBICACIÓN:

REHABILITACION DE PAVIMENTO Y TOMAS HIDRAULICAS EN CALLE VIÑEDOS CALIFORNIA, EXVIÑEDOS DE GUADALUPE, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO  
 CABAERA MUNICIPAL,SFR

CROQUIS

E S T I M A C I O N N O . 1

5 CARGA MECÁNICA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE ESCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO AL 1er. KM. VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.

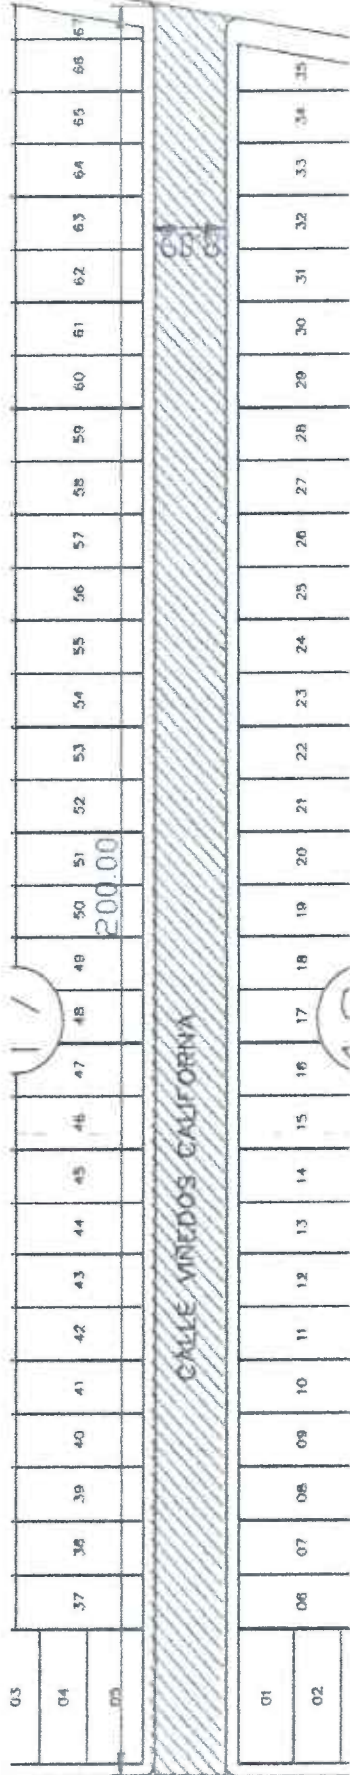

OBSERVACIONES :

MUNICIPIO DE  
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO  
 2022  
**OPERADO**  
 OBRA INFRA ESTRUCTURA  
 SOCIAL MUNICIPAL

SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)

ING. AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA.

RESIDENTE

Dirección de Obras Pùblicas del Municipio de San Francisco de los Romo

ING FERNANDO LUNA MEDINA

NO. DE OBRA:  
NO. DE CONTRATO:  
DESCRIPCIÓN:

REHABILITACION DE PAVIMENTO Y TOMAS HIDRAULICAS EN CALLE VIÑEDOS CALIFORNIA, EXVINEDOS DE GUADALUPE, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO


UBICACIÓN:  
CABAERA MUNICIPALSFR

FOTOGRAFIAS

E S T I M A C I O N N O. 1

5

CARGA MECÁNICA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE ESCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO AL 1er. KM. VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.

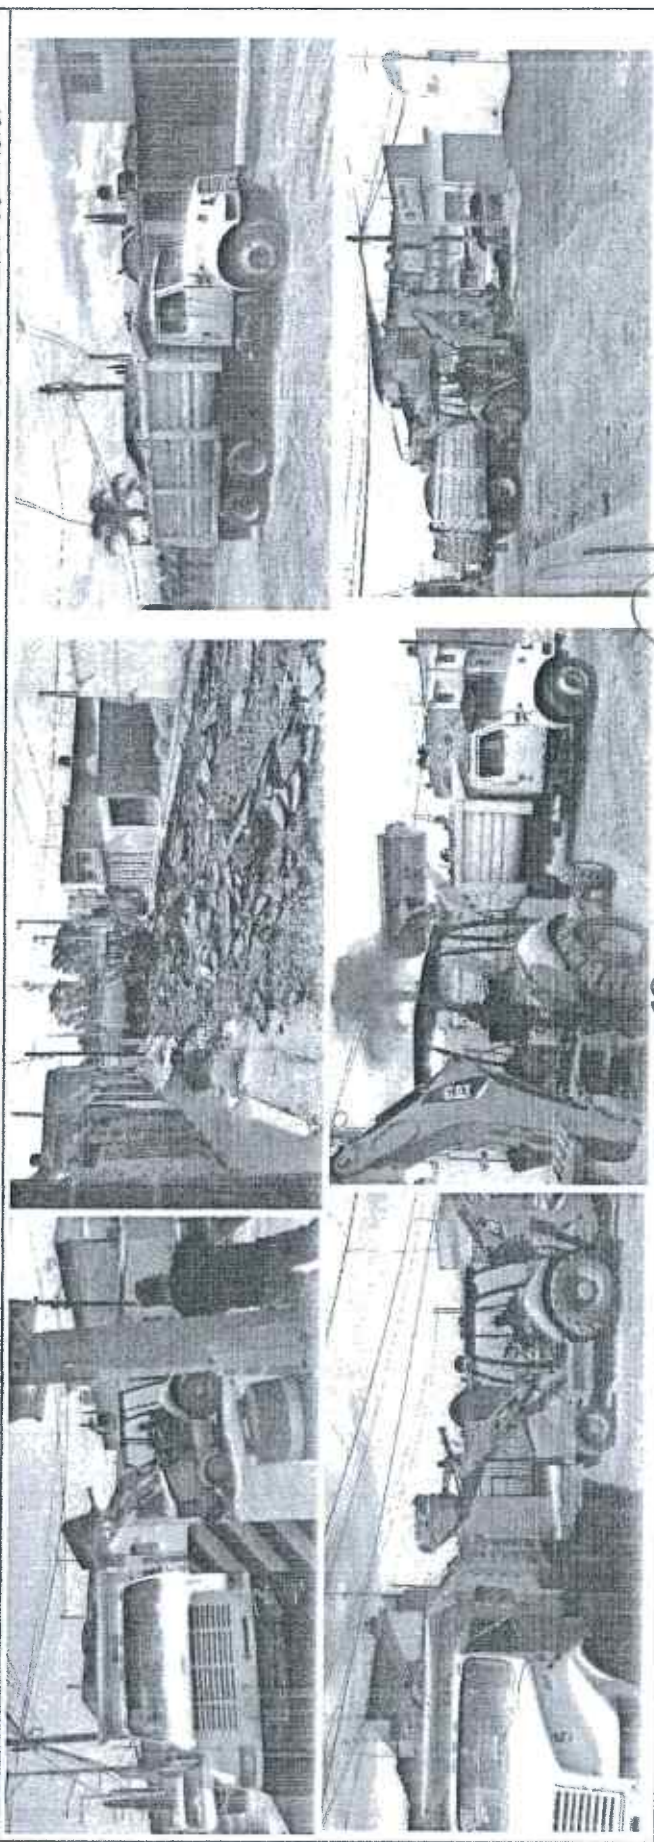

OBSERVACIONES :

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO  
2022  
OPERADO OBRA INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)

ING. AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA.

RESIDENTE

Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo

ING. FERNANDO LUNA MEDINA





# ING. AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA.

NO. DE OBRA:  
NO. DE CONTRATO:

DESCRIPCIÓN:

UBICACIÓN:

REHABILITACION DE PAVIMENTO Y TOMAS HIDRAULICAS EN CALLE VIÑEDOS CALIFORNIA, EXVIÑEDOS DE GUADALUPE, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO


CABAERA MUNICIPAL SFR



## CROQUIS

E S T I M A C I O N N O. 1

ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLIEO A KILOMETROS SUBSECUENTES AL TIRADERO OFICIAL AUTORIZADO MAS CERCAÑO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.

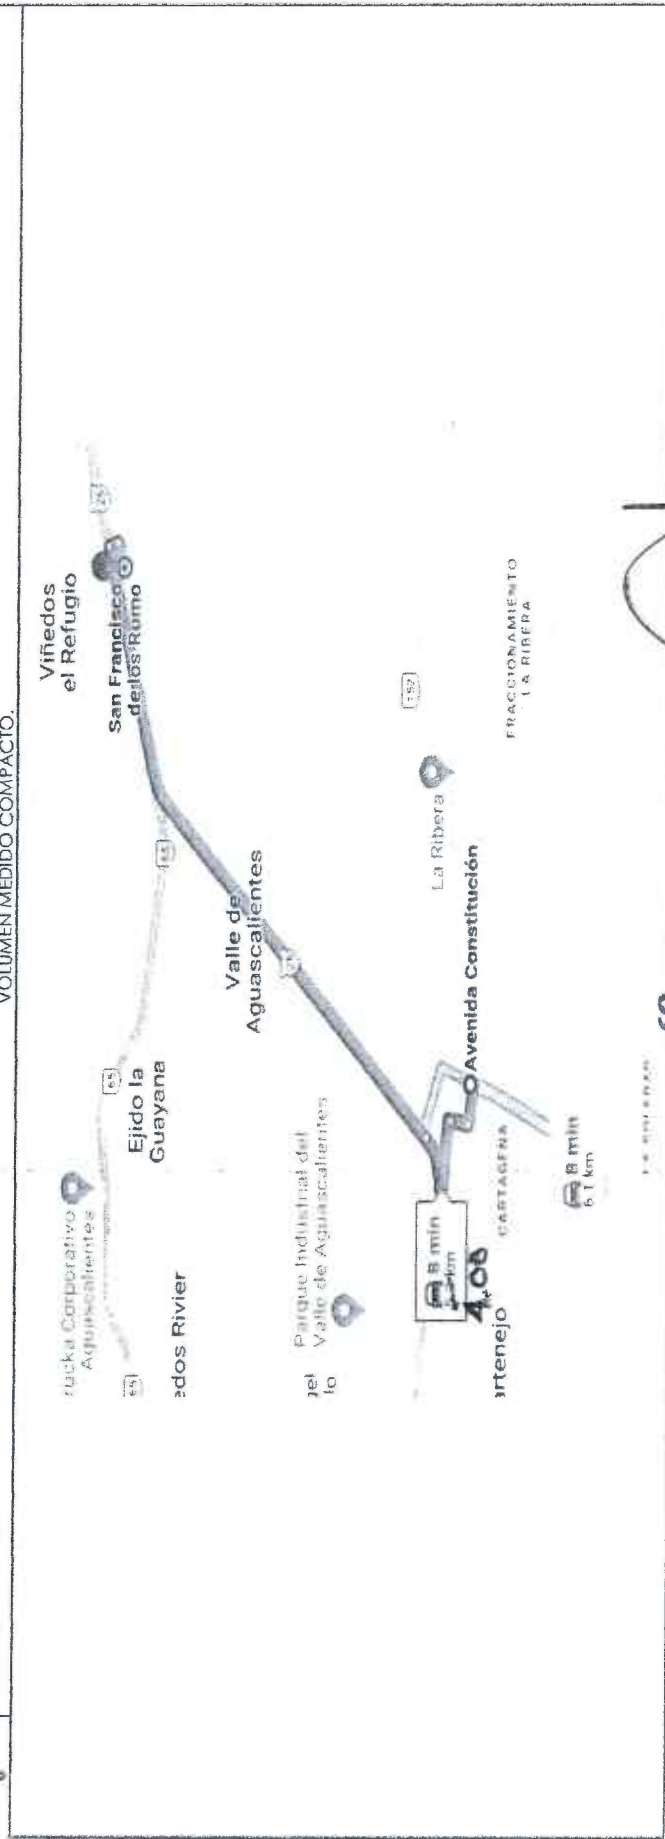

OBSERVACIONES:

### MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

2022

## OPERADO OBRA INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)

ING. AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA.

RESIDENTE

Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo

ING. FERNANDO LUNA MEDINA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Municipio de SAN FRANCISCO DE LOS ROMO



ING. AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA.




NO. DE OBRA:  
NO. DE CONTRATO:  
DESCRIPCIÓN:  
UBICACIÓN:

REHABILITACION DE PAVIMENTO Y TOMAS HIDRAULICAS EN CALLE VINEDOS CALIFORNIA. EXVINEDOS DE GUADALUPE, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO CABAERA MUNICIPAL SFR

FOTOGRAFIAS

E S T I M A C I O N N O . 1

6 ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLIEO A KILOMETROS SUBSECUENTES AL TIRADERO OFICIAL AUTORIZADO MAS CERCAÑO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.

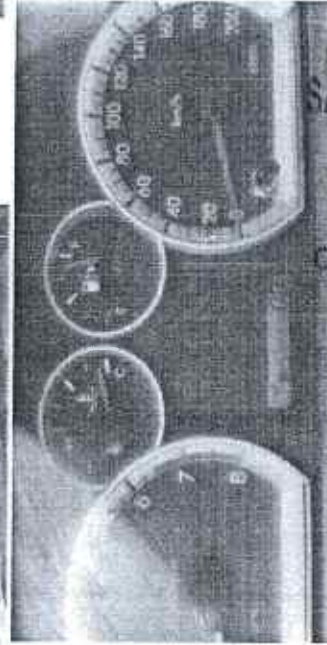

OBSERVACIONES :

SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)

ING. AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA.

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO  
2022  
OPERADO  
OBRA INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

RESIDENTE

Dirección de Obras Pùblicas del Municipio de San Francisco de los Romo  
ING. FERNANDO LUNA MEDINA




ING. AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA.

NO. DE OBRA:  
NO. DE CONTRATO:  
DESCRIPCIÓN:  
UBICACIÓN:

REHABILITACION DE PAVIMENTO Y TOMAS HIDRAULICAS EN CALLE VIÑEDOS CALIFORNIA, EXVIÑEDOS DE GUADALUPE, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO CABAERA MUNICIPAL, SFR

E S T I M A C I O N N O. 1

7 PAVIMENTO HIDRÁULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-38 KG/CM2, T.M.A. 1 1/2" RR 7 DIAS, GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 6 A 8 CMS. FRAGUADO NORMAL, DE 15 CMS. DE ESPESOR, INC: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, REGLEADO, ACABADO RAYADO CON CEPILLO DE ALUMINIO, CON DOBLADOR, CORTE CON DISCO, CALAFATEO CON BACK ROAD (COLA DE RATA), SELLADOR ELASTOMERICO, JUNTAS CONSTRUCTIVAS CON CELOTEX DE 1/2", CURADO CON MEMBRANA QUÍMICA BASE AGUA, Y TODO LO

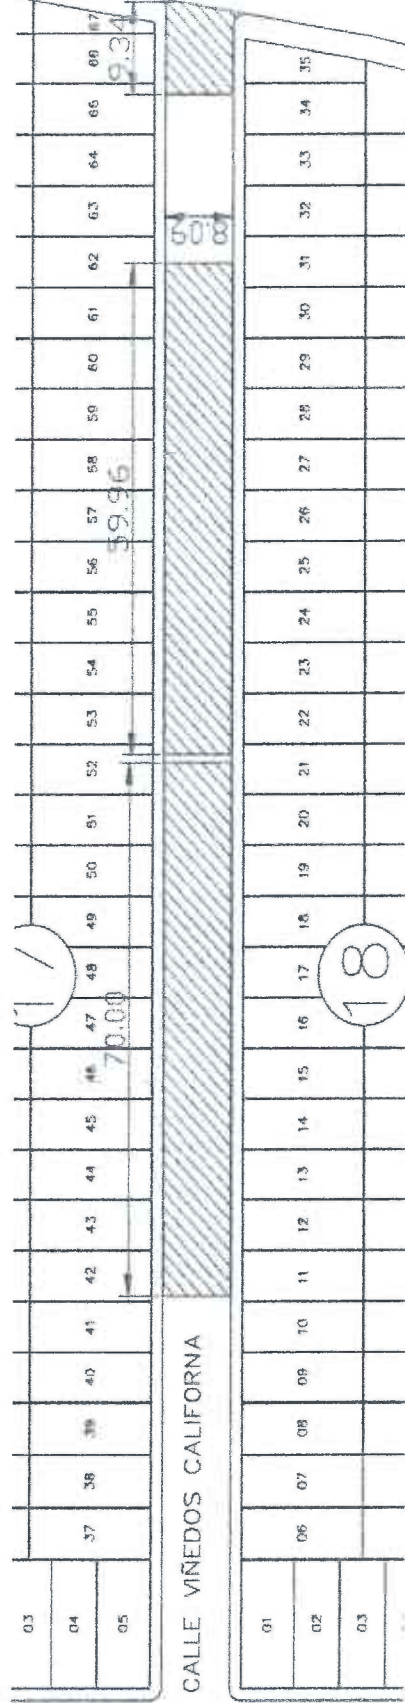

OBSERVACIONES:

MUNICIPIO DE  
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO  
2022  
OPERADO  
OBRA INFRA ESTRUCTURA  
SOCIAL MUNICIPAL

SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)

ING. AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA

REPRESENTANTE

Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo

ING. FERNANDO LUNA MEDINA

NO. DE OBRA: \_\_\_\_\_  
 NO. DE CONTRATO: \_\_\_\_\_  
 DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE PAVIMENTO Y TOMAS HIDRAULICAS EN CALLE VINEDOS CALIFORNIA, EXVINEDOS DE GUADALUPE, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO  
 UBICACIÓN: CABAERA MUNICIPAL SFR

FOTOGRAFIAS

E S T I M A C I O N N O. 1

<p>7</p> <p>PAVIMENTO HIDRÁULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-38 KG/CM2, T.M.A. 1 1/2" RR 7 DÍAS, GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 6 A 8 CMS. FRAGUADO NORMAL, DE 15 CMS. DE ESPESOR, INC: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, REGLEADO, ACABADO RAYADO CON CEPILLO DE CERDAS DE ALUMINIO, CON DOBLADOR, CORTE CON DISCO, CALAFATEO CON BACK ROAD (COLA DE RATA), SELLADOR ELASTOMERICO, JUNTAS CONSTRUCTIVAS CON CELOTEX DE 1/2", CURADO CON MEMBRANA QUIMICA BASE AGUA, Y TODO LO</p>		
		

OBSERVACIONES : \_\_\_\_\_

MUNICIPIO DE  
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO  
 2022  
 OPERADO  
 OBRA INFRA ESTRUCTURA  
 SOCIAL MUNICIPAL

SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)

ING. AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA.

RESIDENTE  
 Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo  
 ING. FERNANDO LUNA MEDINA





PRESIDENCIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

ING. AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA.

NO. DE OBRA:  
NO. DE CONTRATO:  
DESCRIPCIÓN:  
UBICACIÓN:


REHABILITACION DE PAVIMENTO Y TOMAS HIDRAULICAS EN CALLE VIÑEDOS CALIFORNIA, EXVIÑEDOS DE GUADALUPE, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO CABAERA MUNICIPAL,SFR

CROQUIS

ESTIMACION NO. 1

10

CONSTRUCCION DE DENTIALLON DE 15x30 cm DE CONCRETO HECHO EN OBRA Fc=250 Kg/cm2 TMA 38 mm. INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, ALINEADO, NIVELADO, DESCIMBRADO, CURADO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS.

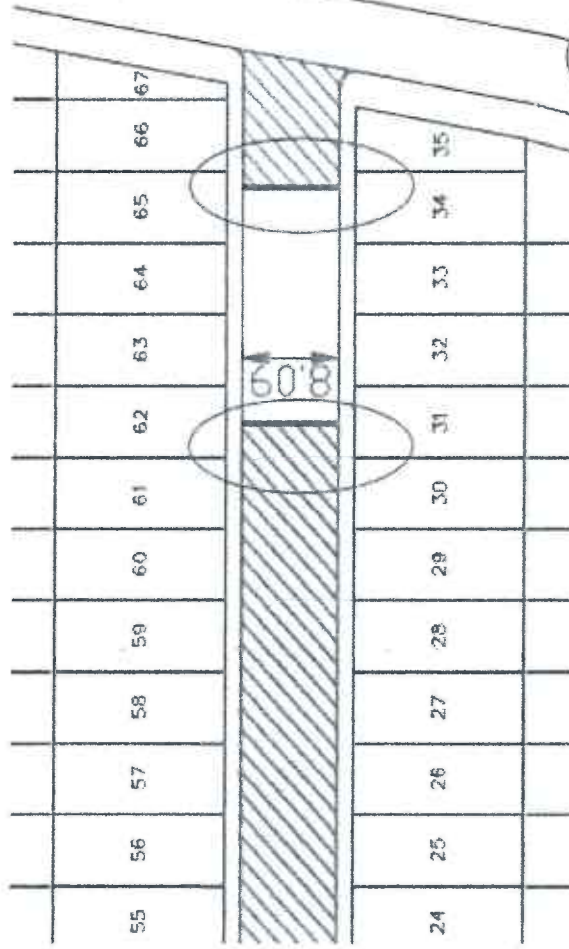

OBSERVACIONES:

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO  
2022  
OPERADO  
OBRA INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)

ING. AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA.

RESIDENTE

Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo

ING. FERNANDO LUNA MEDINA



PRESIDENCIA MUNICIPAL



Municipio de SAN FRANCISCO DE LOS ROMO 2001 - 2004

**ING. AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA.**

NO. DE OBRA:
NO. DE CONTRATO:
DESCRIPCIÓN:
UBICACIÓN:

REHABILITACION DE PAVIMENTO Y TOMAS HIDRAULICAS EN CALLE VIÑEDOS CALIFORNIA, EXVIÑEDOS DE GUADALUPE, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO CABAERA MUNICIPAL, SFR

### FOTOGRAFIAS

E S T I M A C I O N N O 1

10	<p>CONSTRUCCION DE DENTELLON DE 15x30 cm DE CONCRETO HECHO EN OBRA. Fc=250 kg/cm<sup>2</sup> TMA 38 mm. INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, ALINEADO, NIVELADO, DESCIMBRADO. CURADO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS</p> 
----	---

OBSERVACIONES:

MUNICIPIO DE  
**SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**  
 2022  
**OPERADO**  
 OBRA INFRA ESTRUCTURA  
 SOCIAL MUNICIPAL

SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)  
ING. AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA.

RESIDENTE  
 Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo  
ING. FERNANDO LUNA MEDINA

BITÁCORA DE OBRA

HOJA \_\_\_\_\_

CONTRATO FISMDF 023/2022

OBRA FISMDF 023/2022

2 / SEPT / 2022

Con fecha de hoy, esta supervisión autoriza la estimación número uno (1) de la obra FISMDF 023/2022 del Ing. Azael Jurib Cordova fuerte dicha estimación del contrato de esta obra bajo las siguientes características:

- Periodo del 1 al 31 de Agosto 2022.
- Entrega de generadores 31 de Agosto 2022.
- Monto base \$ 748,056.74
- Amortización de anticipo \$ 374,028.33
- Total de retenciones \$ 7,480.56
- Total a pagar \$ 426,392.35



MUNICIPIO DE  
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO  
2022  
OPERADO  
OBRA INFRA ESTRUCTURA  
SOCIAL MUNICIPAL
