



Usr: SuSaNa
Rep: rptPoliza

Municipio de San Francisco de los Romo
ESTADO DE AGUASCALIENTES

Póliza: C05724 Del 27/12/2022



Fecha y hora de Impresión | 03/ene./2023 04:46 p. m.
Página | 1

Concepto: FISM 2022 PAGADO EST 3 OBRA FISMDF 023/2022 REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN CALLE VIÑEDOS CALIFOR. GP Folio: 462

Beneficiario: **AZAEI JARIB CORDOVA HUERTA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-2501-K013-J04-61401-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$91,383.39		GP Folio: 462
0002	8260-2501-K013-J04-61401-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y		\$91,383.39	GP Folio: 462
0003	2113-000635	AZAEI JARIB CORDOVA HUERTA	\$91,383.39		GP Folio: 462
0004	1112-003-002	Bancomer Cta. 011793039-9 FISM		\$44,903.91	GP Folio: 462
0005	1134-003-003	AZAEI JARIB CORDOVA HUERTA		\$45,691.70	FISM 2022 PAGADO EST 3 OBRA FISMDF 023/2022
0006	2117-9-005-001	0.1% COLEGIO DE		\$78.78	FISM 2022 PAGADO EST 3 OBRA FISMDF 023/2022
0007	2117-9-005-002	0.2% ORGANO SUPERIOR DE		\$157.56	FISM 2022 PAGADO EST 3 OBRA FISMDF 023/2022
0008	2117-9-005-003	0.2% INST. DE CAPACIT. DE LA		\$157.56	FISM 2022 PAGADO EST 3 OBRA FISMDF 023/2022
0009	2117-9-005-004	0.5% CONTRALORIA MUNICIPAL		\$393.88	FISM 2022 PAGADO EST 3 OBRA FISMDF 023/2022
Sumas iguales =>			<u>182,766.78</u>	<u>182,766.78</u>	

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

-- 2022

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

BBVA

Fecha y hora de consulta

27/12/2022 4:06:18 PM

Contrato

00796395

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO
DE LOS ROMO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: EST 3 FISDMF 023

Importe de la operación: 44,903.91 MXP

Cuenta de retiro: 0117930399

Cuenta de depósito: 072010008168421428

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE SAN FRA
NCISCO DE LOS ROMOTitular de la cuenta: AZAEL JARIB CORDOVA
HUERTA

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha de creación: 27/12/2022

Fecha de aplicación: 27/12/2022

Concepto de pago: PAGO EST 3 FISDMF 11-023

Referencia numérica: 271222

Instrumento de seguridad: ASD 6550927880

Hora de captura en el canal: 16:06:03

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000365581

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Clave de rastreo: 002601002212270000365581

Folio de firma: 0022807152

2022

Folio único: 1401202212271606030022807158

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	---	27/12/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	27/12/2022

RFC emisor: COHA811227BM0
Nombre emisor: AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA
Folio: 277-4
RFC receptor: MSF920130TQ9
Nombre receptor: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: 7BA1414B-2620-464A-BF3E-9AD86C3ED57D
No. de serie del CSD: 00001000000504903550
Código postal, fecha y hora de emisión: 20266 2022-12-29 09:44:00
Efecto de comprobante: Pago
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
84111506		1	ACT		0	0			
Descripción	Pago								

Moneda: Los códigos asignados para las transacciones en que intervienga ninguna moneda
Subtotal Total \$ 0.00
Total \$ 0.00

Información del pago

Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Fecha de pago: 2022-12-27 12:00:00
Moneda de pago: Peso Mexicano
Monto: 44903.91

Documento relacionado

Id documento: 81329D60-BFA9-428F-B47C-838DA1D6272B
Folio: 277
Número parcialidad: 4
Moneda del documento relacionado: Peso Mexicano
Método de pago del documento relacionado: Pago en parcialidades o diferido
Importe de saldo anterior: 44903.91
Importe pagado: 44903.91
Importe de saldo insoluto: 0.00

Sello digital del CFDI:

Z3x0pvjYvkZj2039VK7LUNw4R+vi8WEI5QhocAlwyzcEj9yt5OPgo4LpoHOtdKQEtrbpFbUaZxPESPbihNDx7SAyX1AEH75gmCIXMqwonb/Bx94Hdv+XxZWEEm1jwZiPnCPujvt387IPk8RAL67VVAtWYMExnSpccFdXkbp33Wgt4QA7q6szpvvExxql+4oQHsPb73GpOrgssi4wmwAw/w3FwUAx1oq1OiyfGrVvZo8ANWIMbP5dwXJK4kBTMayCxPDC54eGm8JAEDhdATqxxzqx+4UAaUi3fDZj9tx6zC4jBaptyjLuboraZuhsUxH8RXXG9Nfj/G7dkzALZg==


Sello digital del SAT:

i2yUEterriRroqD+ZrzXZojCRObZAUieY1eMG5DfF9cXn5bziQkb3Zks5yD52j2aMIUb4Prcl5xvrKtr+coz/3h3/MHBW2fKDBfzTdfdxSqZlBNgyLQJSiKrwHOCU1FgQeZ9gJvcQQMOvBKPfJQc4F9Nif2gKwhQOjrEZ43JJQtpMp1/469ce/X+idJQW2Ffih8RJN64IAZN/O9c7JrAL/1ddnGiesmpHnuUMrmlMzsgsCSX1kTFBgJu91qoba/rtABDphBbW4GP95Z7UeHBRxGru8d28bzz/TUzqdBX1ShLkXA/YQvYR+IVIMI32I3cliEh8Fp70PeZHOgLUduA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7BA1414B-2620-464A-BF3E-9AD86C3ED57D|2022-12-29T09:49:00|SAT970701NN3|Z3x0pvjYvkZj2039VK7LUNw4R+vi8WEI5QhocAlwyzcEj9yt5OPgo4LpoHOtdKQEtrbpFbUaZxPESPbihNDx7SAyX1AEH75gmCIXMqwonb/Bx94Hdv+XxZWEEm1jwZiPnCPujvt387IPk8RAL67VVAtWYMExnSpccFdXkbp33Wgt4QA7q6szpvvExxql+4oQHsPb73GpOrgssi4wmwAw/w3FwUAx1oq1OiyfGrVvZo8ANWIMbP5dwXJK4kBTMayCxPDC54eGm8JAEDhdATqxxzqx+4UAaUi3fDZj9tx6zC4jBaptyjLuboraZuhsUxH8RXXG9Nfj/G7dkzALZg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3
Fecha y hora de certificación: 2022-12-29 09:49:00
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
-- 2022
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:pago10="http://www.sat.gob.mx/Pagos" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" Version="3.3" Folio="277-4" Fecha="2022-12-29T09:44:40"
Sello="Z3x0pvjYvkZj2039VK7LUNw4R+vi8WEI5QhocAlwyzcEj9yt5OPgo4LpoHOTxdQKEetrbpFbUaZxPESPbihNDx7SAyX1AEH75gmCtXMqwob/Bx94Hdv+;
NoCertificado="00001000000504903550" SubTotal="0"
Certificado="MIIGPzCCBcCegAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDQ5MDM1NTAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBBVVRPUkkl
Moneda="XXX" Total="0" TipoDeComprobante="P" LugarExpedicion="20266" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/Pagos http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pagos/Pagos10.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="612" Nombre="AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA" Rfc="COHA811227BM0"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO" Rfc="MSF920130TQ9" UsoCFDI="P01"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="0" ValorUnitario="0" Descripcion="Pago" ClaveUnidad="ACT" Cantidad="1" ClaveProdServ="84111506"/>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Complemento>
    - <pago10:Pagos Version="1.0">
      - <pago10:Pago Monto="44903.91" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="03" FechaPago="2022-12-27T12:00:00">
        <pago10:DoctoRelacionado Folio="277" ImpSaldoInsoluto="0.00" ImpPagado="44903.91" ImpSaldoAnt="44903.91" NumParcialidad="4"
          MetodoDePagoDR="PPD" MonedaDR="MXN" IdDocumento="81329D60-BFA9-428F-B47C-838DA1D6272B"/>
      </pago10:Pago>
    </pago10:Pagos>
    <tfid:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
      SelloSAT="i2yUEterrrRroqD+ZrzXZojCRObZAUIeY1eMG5DFt9cXn5bziQkb3ZKs5yD5j2aMIUb4PRcl5xvrKtR+coz/3h3/MHBW2fkDBfzTdfdxS;
      NoCertificadoSAT="00001000000504465028"
      SelloCFD="Z3x0pvjYvkZj2039VK7LUNw4R+vi8WEI5QhocAlwyzcEj9yt5OPgo4LpoHOTxdQKEetrbpFbUaZxPESPbihNDx7SAyX1AEH75gmCtXM
      RfcProvCertif="SAT970701NN3" FechaTimbrado="2022-12-29T09:49:00" UUID="7BA1414B-2620-464A-BF3E-9AD86C3ED57D"
      xmlns:tfid="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

-- 2022

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.

PAGADO
FINANZAS

PRE-FACTURA Normal



PRE-FACTURA DEL CONTRATISTA: AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA (437)

A NOMBRE DE: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 RFC: MSF920130TQ9
 DIRECCION: FCO ROMO JIMENEZ 102, SAN JOSE DE BUENAVISTA, SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS,
 CIUDAD: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE L ESTADO: AGUASCALIENTES
 DESCRIPCION

PAGO DE LA ESTIMACION No.	3 Del 25 Sep 2022 al 27 Sep 2022		MONTO BASE	\$78,778.79
DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE VIÑEDOS CALIFORNIA ENTRE LA AVENIDA CONSTITUCIÓN Y CALLE VIÑEDOS SAN MARCOS		AJUSTE DE COSTOS (+)	\$0.00
			AMORTIZACION DE ANTICIPO (-)	\$39,389.39
UBICADA EN:	EN EX VIÑEDOS GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTE		SUBTOTAL	\$39,389.40
CON AMPARO DEL CONTRATO No.:	FISMDF 023/2022		IVA (+)	\$6,302.30
DE FECHA.:	18/07/2022		SUBTOTAL CON IVA	\$45,691.70
BAJO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA:				

Inversion Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal 2022
 Programa SF PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES
 SubPrograma 01 CONCRETO
 Obra. FISMDF 023/2022 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE VIÑEDOS CALIFORNIA ENTRE LA AVENIDA CONSTITUCIÓN
 Localizacion EN EX VIÑEDOS GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CAPACITACION DE LOS TRABAJADORES DEL CONTRATISTA	\$157.56	(0.20%)		
COLEGIOS DE PROFESIONISTAS SEGUN CORRESPONDA	\$78.78	(0.10%)		TOTAL DE RETENCIONES (-) \$787.79
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	\$0.00	(0.00%)		SANCION POR RETRASO (-) \$0.00
FISCALIZACION DEL H. CONGRESO DEL ESTADO	\$157.56	(0.20%)		SUBTOTAL MENOS RETENCIONES \$44,903.91
INSPECCION DE VIGILANCIA PARA LA CONTRALORIA	\$393.89	(0.50%)		RETENCION POR RETRASO(-) \$0.00
SERVICIOS RELATIVOS ALAS CONSTRUCCIONES	\$0.00			REINTEGRO POR RETENCION \$0.00
	\$787.79			OTRAS SANCIONES(-) \$0.00
				TOTAL A PAGAR \$44,903.91

Avance Fisico Real %
 Avance Fisico Programado %
 Fecha Terminación Prog.

CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 91/100 M.N.

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 2022

ESTADO DE CUENTA

Obra.	FISMDF 023/2022 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE VIÑEDOS CALIFORNIA ENTRE LA AVENIDA CONSTITUCIÓN Y CALLE VIÑEDOS SAN MARCOS		Total Contrato	1,480,014.85
Localización	EN EX VIÑEDOS GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES		Total Ampliaciones	44,180.79
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura So		Total Contratado	1,524,195.64
Programa	SF PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES		Anticipo ()%	740,007.42
SubPrograma	01 CONCRETO		Estimado Anterior	1,434,323.15
Contratista	AZAZEL JARIB CORDOVA HUERTA (437)		Esta Estimacion	45,691.70
Contrato	FISMDF 023/2022 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE VIÑEDOS CALIFORNIA ENTRE LA AVENIDA CONSTITUCIÓN Y CALLE VIÑEDOS SAN MARCOS		Total Estimado	1,480,014.85
Estimacion No.	3 Del 25 Sep 2022 al 27 Sep 2022		Total por Estimar	44,180.79

No. Estimac.	Período	Importe Estimacion	Amortizacion de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA (+)	Cargo a la Obra	DEDUCCIONES (-)						Retencion (-)	Reintegro (+)	Sanciones (-)	Importe a Pagar
							CMIG(0)	Calo.Prof.(0)	SFP(0,5)	Cong. Edo.(0,2)	Municipal	ISRuOtro(0)				
Anticipo				637,937.43	102,069.99	740,007.42										740,007.42
1	Del 01 Ago 2022 al 31 Ago	748,056.74	374,028.37	263,909.06	59,844.54	433,872.91	1,496.11	748.06	0.00	1,496.11	3,740.28	0.00	0.00	0.00	0.00	426,392.35
2	Del 01 Sep 2022 al 24 Sep	449,039.34	224,519.67	39,389.39	35,923.15	260,442.82	898.08	449.04	0.00	898.08	2,245.20	0.00	0.00	0.00	0.00	255,952.42
3	Del 25 Sep 2022 al 27 Sep	78,778.79	39,389.39	0.00	6,302.30	45,691.70	157.56	78.78	0.00	157.56	393.89	0.00	0.00	0.00	0.00	44,903.91
TOTALES		1,275,874.87	637,937.43		204,139.98	1,480,014.85	2,551.75	1,275.88	0.00	2,551.75	6,379.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,467,256.10



MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

 2022
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL



RESUMEN DE ESTIMACION

Obra.	FISDMF 023/2022 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE VIÑEDOS CALIFORNIA ENTRE LA AVENIDA CONSTITUCIÓN Y CALLE VIÑEDOS		Total Contrato	\$1,480,014.85
Localización	SAN MARCOS EN EX VIÑEDOS GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES		Total Ampliaciones	\$44,180.79
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal.		Total Contratado	\$1,524,195.64
Programa	SF PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES		Anticipo (50)%	\$740,007.42
SubPrograma	01 CONCRETO		Estimado Anterior	\$1,434,323.15
Supervisor	FERNANDO LUNA MEDINA (LUMF740415)		Esta Estimacion	\$45,691.70
Contratista	AZAEI JARIB CORDOVA HUERTA (437)		Total Estimado	\$1,480,014.85
Contrato	FISDMF 023/2022 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE VIÑEDOS CALIFORNIA ENTRE LA AVENIDA		Saldo por Estimar	\$44,180.79
Estimacion No.	3 CONSTITUCIÓN Y CALLE VIÑEDOS SAN MARCOS			
Recibí de	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	la Cantidad de:	\$45,691.70 CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS 70/100 M.N.	

<u>GRUPO</u>	<u>PARTIDA</u>	
* EXTRAORDINARIOS		\$73,753.78
- EXTRAORDINARIOS		\$73,753.78
* INDIRECTOS NO EJECUTADOS		\$-3,756.64
- INDIRECTOS NO EJECUTADOS		\$-3,756.64
* REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE VIÑEDOS CALIFORNIA ENTRE LA AVENIDA CONSTITUCIÓN Y CALL		\$8,781.65
- TERRACERIAS		\$3,819.86
- PAVIMENTO		\$4,961.79
Fecha Terminación Prog.		SUMA
		\$78,778.79
		AJUSTE DE COSTOS (+)
		\$0.00
		AMORTIZACION DE ANTICIPO (-)
		\$39,389.39
		SUBTOTAL
		\$39,389.40
		IVA (+)
		\$6,302.30
		SUBTOTAL CON IVA
		\$45,691.70

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 2022

AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA (COHA811227BM0)
 Contratista

T.C. FERNANDO LUNA MEDINA (LUMF740415)
 SUPERVISOR

CONCEPTOS DE ESTIMACION

Normal



Obra.	FISMDF 023/2022 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE VIÑEDOS CALIFORNIA ENTRE LA AVENIDA CONSTITUCIÓN Y CALLE VIÑEDOS SAN MARCOS		Total Contrato	\$1,480,014.85
Localizacion	EN EX VIÑEDOS GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES		Total Ampliaciones	\$44,180.79
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal.		Total Contratado	\$1,524,195.64
Programa	SF PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES		Anticipo (50)%	\$740,007.42
SubPrograma	01 CONCRETO		Estimado Anterior	\$1,434,323.15
Supervisor	FERNANDO LUNA MEDINA (LUMF740415)		Esta Estimacion	\$45,691.70
Contratista	AZAEI JARIB CORDOVA HUERTA (437)		Total Estimado	\$1,480,014.85
Contrato	FISMDF 023/2022 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE VIÑEDOS CALIFORNIA ENTRE LA AVENIDA CONSTITUCIÓN Y CALLE VIÑEDOS SAN MARCOS		Saldo por Estimar	\$44,180.79
Estimacion No.	3 Del 25 Sep 2022 al 27 Sep 2022			
Recibí de	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO la Cantidad de:	\$45,691.70	CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS 70/100 M.N.	

No.	Concepto	Unid. Med	Volumen					Precio Contratado	Importe
			Contratado	Acumulado	Anterior	Actual	Excedente		

GRUPO: **REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE VIÑEDOS CALIFORNIA ENTRE LA AVENIDA CONSTITUCIÓN Y CALLE VIÑEDOS SAN MARCOS EN EX VIÑEDOS GUADALUPE EN EL MUN**

PARTIDA: **TERRACERIAS**

1	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO Y/O CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CON MAQUINARIA, INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE ACOPIO PARA SU CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA.	M3	85.49	95.14	85.18	9.96	9.65	\$294.89	\$2,937.10
5	CARGA MECÁNICA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE ESCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO AL 1er. KM, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3	273.57	470.52	460.56	9.96	196.95	\$36.59	\$364.44
6	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES AL TIRADERO OFICIAL AUTORIZADO MÁS CERCAÑO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3/KM	1,094.28	1,421.53	1,381.69	39.84	327.25	\$13.01	\$518.32
								Total Partida	\$3,819.86

PARTIDA: **PAVIMENTO**

8	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE DIAMANTE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=38KG/CM ³ , TMA 1 1/2", RESISTENCIA RÁPIDA A LOS 7 DÍAS, DE 16 CM DE ESPESOR Y 1.50 M POR LADO. INCLUYE: FOAMTECH DE 15CMX1/2", ARMADO CON VARILLA DEL No. 3 A CADA 15 CM ARMEX 1515-4, PELO DE ANG	pieza	1.00	1.00	0.00	1.00	\$4,961.79	\$4,961.79	
								Total Partida	\$4,961.79
								Total Grupo	\$8,781.65

GRUPO: **EXTRAORDINARIOS**

PARTIDA: **EXTRAORDINARIOS**

12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADCRETO DE 10X10X8 CM COLOR GRIS, ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 7 CM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, NIVELACIONES.	M2	0.00	157.81	153.31	4.50	157.81	\$760.33	\$3,421.49
----	---	----	------	--------	--------	------	--------	----------	------------

AZAEI JARIB CORDOVA HUERTA (COHA811227BMO)

Contratista

T.C. FERNANDO LUNA MEDINA (LUMF740415)

SUPERVISOR

OPERADO
OBRA INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 2022

No.	Concepto	Unid. Med	Volumen					Precio Contratado	Importe
			Contratado	Acumulado	Anterior	Actual	Excedente		
18	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO EN OBRA F' C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 10+ CM ACABADO RAYADO FINO CON BROCHA DE PELO, JUNTAS FRÍAS CON DOBLADOR DE 2", SECCIÓN DE LOSAS DE ACUERDO A LA EXISTENTE, INCLUYE: COLADO, CURADO CON MEMBRANA A BASE DE AGUA Y TRABAJO TERMINADO SEGÚN FICHA TÉCNICA FT-200	M2.	0.00	108.00	0.00	108.00	108.00	\$397.28	\$42,906.24
19	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE COLOR AZUL Y LOGOTIPO EN COLOR BLANCO DE TRAFICO, EN RAMPAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES PARA SEÑALAMIENTO EN CALLES. INCLUYE: PREPARADO DE LA SUPERFICIE, MANOS DE PINTURA SUFICIENTES HASTA CUBRIR SATISFACTORIAMENTE LA SUPERFICIE, PINTADO DE SIMBOLOGÍA DE SILLAS DE RUEDAS, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS.	M2.	0.00	12.96	0.00	12.96	12.96	\$400.81	\$5,194.50
20	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO O AMARILLO DE TRAFICO EN PAVIMENTO CON MICROESFERA A RAZÓN DE 0.50 KGS M2 PARA SEÑALAMIENTO EN CALLES. INCLUYE: PREPARADO DE LA SUPERFICIE, MANOS DE PINTURA SUFICIENTES HASTA CUBRIR SATISFACTORIAMENTE LA SUPERFICIE, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS.	M2.	0.00	72.81	0.00	72.81	72.81	\$188.52	\$13,726.14
21	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO O AMARILLO DE TRAFICO, EN GUARNICIONES PARA SEÑALAMIENTO EN CALLES. INCLUYE: PREPARADO DE LA SUPERFICIE, MANOS DE PINTURA SUFICIENTES HASTA CUBRIR SATISFACTORIAMENTE LA SUPERFICIE, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS.	M2.	0.00	19.20	0.00	19.20	19.20	\$121.45	\$2,331.84
22	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO VIAL INFORMATIVO DE LA OBRA DE 0.61 X 0.61 M LÁMINA GALVANIZADA 16 (TIPO SEÑALAMIENTO PREVENTIVO Y/O RESTRICTIVAS) A BASE DE VINIL SEGÚN DISEÑO PROPORCIONADO POR LA SOP. INCLUYE: POSTE PTR GALVANIZADO DE 2"X2" CAL 14 DE 3.60 MTS. DE LONGITUD, ANCLADO CON MUERTO DE CONCRETO DE 0.40X0.40X0.40 MTS., ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS.	PZA	0.00	2.23	0.00	2.23	2.23	\$2,768.45	\$6,173.57
								Total Partida	\$73,753.78
								Total Grupo	\$73,753.78

GRUPO: **INDIRECTOS NO EJECUTADOS**

PARTIDA: **INDIRECTOS NO EJECUTADOS**

23	INDIRECTO POR ADMINISTRACIÓN DE OBRA POR EL CONVENIO DE AMPLIACIÓN EN MONTO POR LA CANTIDAD DE \$44,180.79	IN	0.00	-1.00	0.00	-1.00		\$3,756.64	\$-3,756.64
								Total Partida	\$-3,756.64
								Total Grupo	\$-3,756.64
								Total Presupuestado	\$78,778.79
								Ajuste de Costos	\$0.00
								Total	\$78,778.79

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL
 2022

AZAEI JARIB CORDOVA HUERTA (COHA811227BM0)

Contratista

T.C. FERNANDO LUNA MEDINA (LUMF740415)

SUPERVISOR



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE VIÑEDOS CALIFORNIA ENTRE LA AVENIDA CONSTITUCIÓN Y CALLE VIÑEDOS SAN MARCOS EN EX VIÑEDOS GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 LUGAR: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

TIPO	CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 03	
							CANTIDAD	IMPORTE
Capítulo	AA	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE VIÑEDOS CALIFORNIA ENTRE LA AVENIDA				\$1,275,874.85		\$82,534.80
Subcapítulo	AA001	TERRACERIAS				\$110,321.19		\$3,819.80
Concepto	DEM PAV ASF	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ÁSFALTICO Y/O CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CON MAQUINARIA, INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE ACOPIO PARA SU CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA.	M3	85.49	\$294.89	\$25,210.15	9.96	\$2,937.05
Concepto	ACARO20P	CARGA MECÁNICA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE ESCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO AL 1er. KM, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3	273.57	\$36.59	\$10,009.93	9.96	\$364.44
Concepto	ACARO21P	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE ESCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES AL TIRADERO OFICIAL AUTORIZADO MÁS CERCANO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO	M3/KM	1094.28	\$13.01	\$14,236.58	39.84	\$518.32
Subcapítulo	AA003	PAVIMENTO				\$1,165,553.66		\$4,961.79
Concepto	PAV101	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE DIAMANTE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=38KG/CM2, TMA 1 1/2", RESISTENCIA RÁPIDA A LOS 7 DÍAS, DE 16 CM DE ESPESOR Y 1.50 M POR LADO. INCLUYE: FOAMTECH DE 15CMX1/2", ARMADO CON VARILLA DEL No. 3 A CADA 15 CM, ARMEX 1515-4, PELO DE ANGEL 900 GRAMOS M3, TAPA Y BROCAL DE POLIETILENO PARA TRÁFICO PESADO, CORTE 1/3 DE ESPESOR , A CADA ARISTA HACIA CENTRO DE BROCAL	PIEZA	1	\$4,961.79	\$4,961.79	1.00	\$4,961.79
Subcapítulo	EA004	EXTRAORDINARIOS				\$0.00		\$73,753.21
Concepto	EX001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOCRETO 10 X 10 X 8 COLOR GRIS PARA PAVIMENTO CON CAMA DE ARENA DE 7 CMS	M2		\$760.33	\$0.00	4.50	\$3,421.49
Concepto	EX008	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 10+2 CM ACABADO RAYADO FINO CON BROCHA DE PELO, JUNTAS FRIAS CON DOBLADOR DE 2", SECCION DE LOSAS DE ACUERDO ALA EXISTENTE, INCLUYE: COLADO , CURADO CON MEMBRANA A BASE DE AGUA Y TRABAJO TERMINADO SEGUN FICHA TECNICA FT-200	M2		\$397.28	\$0.00	108.00	\$42,905.41
Concepto	EX009	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE COLOR AZUL Y LOGOTIPO EN COLOR BLANCO DE TRAFICO, EN RAMPAS PARA MINUSVALIDOS	M2		\$400.81	\$0.00	12.96	\$5,194.50
Concepto	EX010	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO O AMARILLO DE TRAFICO EN PAVIMENTO EN TOPES Y MARIMBAS	M2		\$188.52	\$0.00	72.81	\$13,726.14
Concepto	EX011	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO O AMARILLO DE TRAFICO, EN GUARNICIONES TRAPEZOIDAL O PECHO DE PALOMA	M2		\$121.46	\$0.00	19.20	\$2,332.03
Concepto	EX012	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO VIAL INFORMATIVO DE LA OBRA DE 0.61 X 0.61 M LÁMINA GALVANIZADA	PZA		\$2,768.45	\$0.00	2.23	\$6,173.64

OPERADO
 PARA INFRA ESTRUCTURA
 SOCIAL MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 2022

ESTIMACION 03		
SUBTOTAL	\$1,275,874.85	\$82,534.80
IVA	\$204,139.98	\$13,205.57
TOTAL	\$1,480,014.83	\$95,740.37



Ayuntamiento de
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
2021 • 2024

ING. AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA.

NO. DE OBRA: _____
 NO. DE CONTRATO: _____
 DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE PAVIMENTO Y TOMAS HIDRAULICAS EN CALLE VIÑEDOS CALIFORNIA, EXVIÑEDOS DE GUADALUPE, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 UBICACIÓN: CABAERA MUNICIPAL,SFR



NUMEROS GENERADORES

ESTIMACION NO. 3

No.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	TOTAL
			EJE	TRAMO	TIPO						
1	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ÁSFALTICO Y/O CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CON MAQUINARIA, INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE ACOPIO PARA SU CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA.	M3	BANQUETAS			3.00	0.50	0.10	1.00	0.15	0.15
						8.00	1.00	0.10	1.00	0.80	0.80
						9.02	0.97	0.10	1.00	0.87	0.87
						5.95	0.99	0.10	1.00	0.59	0.59
						3.02	1.01	0.10	1.00	0.31	0.31
						2.95	0.99	0.10	1.00	0.29	0.29
						2.90	1.00	0.10	1.00	0.29	0.29
TOTAL =										9.96	

OPERADO
MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 2022

OBSERVACIONES:

SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)
ING. AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA.

RESIDENTE
 Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
ING FERNANDO LUNA MEDINA



Asuntamiento de
**SAN FRANCISCO
DE LOS ROMO**
2021 • 2024



ING. AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA.

NO. DE OBRA: _____
 NO. DE CONTRATO: _____
 DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE PAVIMENTO Y TOMAS HIDRAULICAS EN CALLE VIÑEDOS CALIFORNIA, EXVIÑEDOS DE GUADALUPE, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 UBICACIÓN: CABAERA MUNICIPAL,SFR



NUMEROS GENERADORES


ESTIMACION NO. 3

No.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	TOTAL
			EJE	TRAMO	TIPO						

A REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE VIÑEDOS CALIFORNIA ENTRE LA AVENIDA CONSTITUCIÓN Y CALLE VIÑEDOS SAN MARCOS EN EX VIÑEDOS GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES

AO1 PRELIMINARES

1 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ÁSFALTICO Y/O CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CON MAQUINARIA, INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE ACOPIO PARA SU CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA.

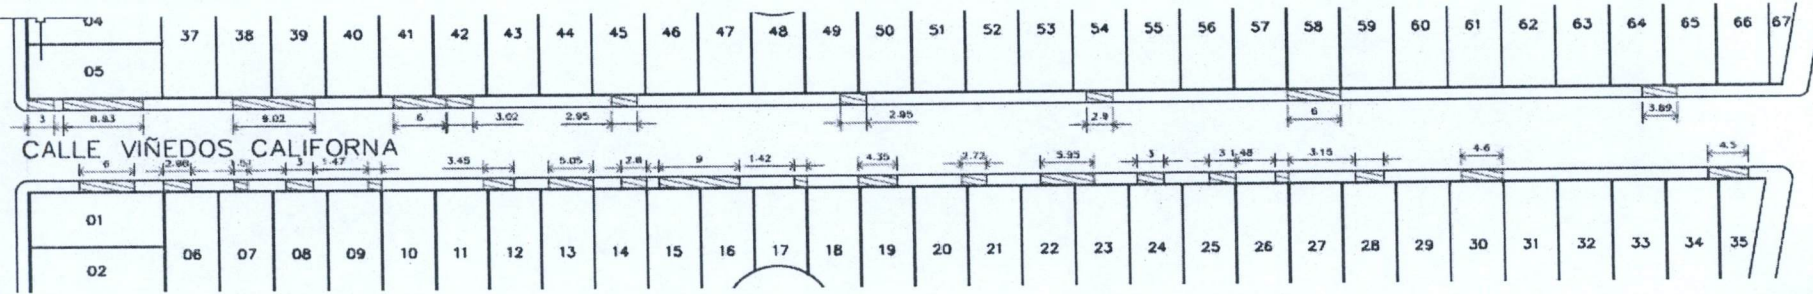

**MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
**OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL**
 2022

OBSERVACIONES

SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)
 ING. AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA.

RESIDENTE
 Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
 ING. FERNANDO LUNA MEDINA



ING. AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA.

NO. DE OBRA:	
NO. DE CONTRATO:	
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE PAVIMENTO Y TOMAS HIDRAULICAS EN CALLE VIÑEDOS CALIFORNIA, EXVIÑEDOS DE GUADALUPE, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
UBICACIÓN:	CABAERA MUNICIPAL,SFR




NUMEROS GENERADORES


ESTIMACION NO. 3

No.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	TOTAL
			EJE	TRAMO	TIPO						
A	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE VIÑEDOS CALIFORNIA ENTRE LA AVENIDA CONSTITUCIÓN Y CALLE VIÑEDOS SAN MARCOS EN EX VIÑEDOS GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES										
AO1	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ÁSFALTICO Y/O CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CON MAQUINARIA, INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE ACOPIO PARA SU CARGA										


1

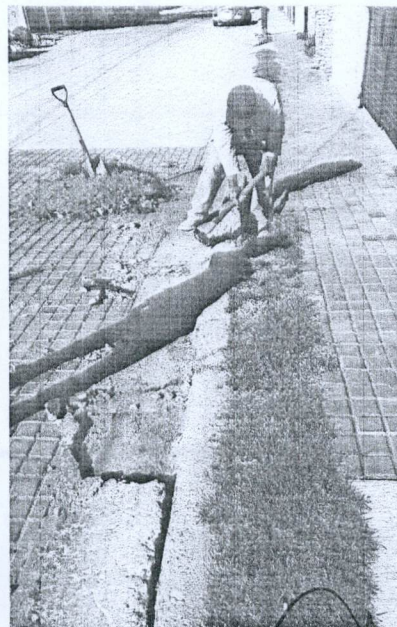


OBSERVACIONES :


 SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)
 ING. AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA.

OPERADO
 OBRA INFRA ESTRUCTURA
 SOCIAL MUNICIPAL
 2022
 MUNICIPIO DE
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO


 RESIDENTE
 Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
 ING FERNANDO LUNA MEDINA



Ayuntamiento de
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
2021 • 2024



ING. AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA.




NUMEROS GENERADORES

NO. DE OBRA:	_____
NO. DE CONTRATO:	_____
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE PAVIMENTO Y TOMAS HIDRAULICAS EN CALLE VIÑEDOS CALIFORNIA, EXVIÑEDOS DE GUADALUPE, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
UBICACIÓN:	CABAERA MUNICIPAL,SFR

E S T I M A C I O N N O 3

No.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	TOTAL
			EJE	TRAMO	TIPO						

5 CARGA MECÁNICA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE ESCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO AL 1er. KM. VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.

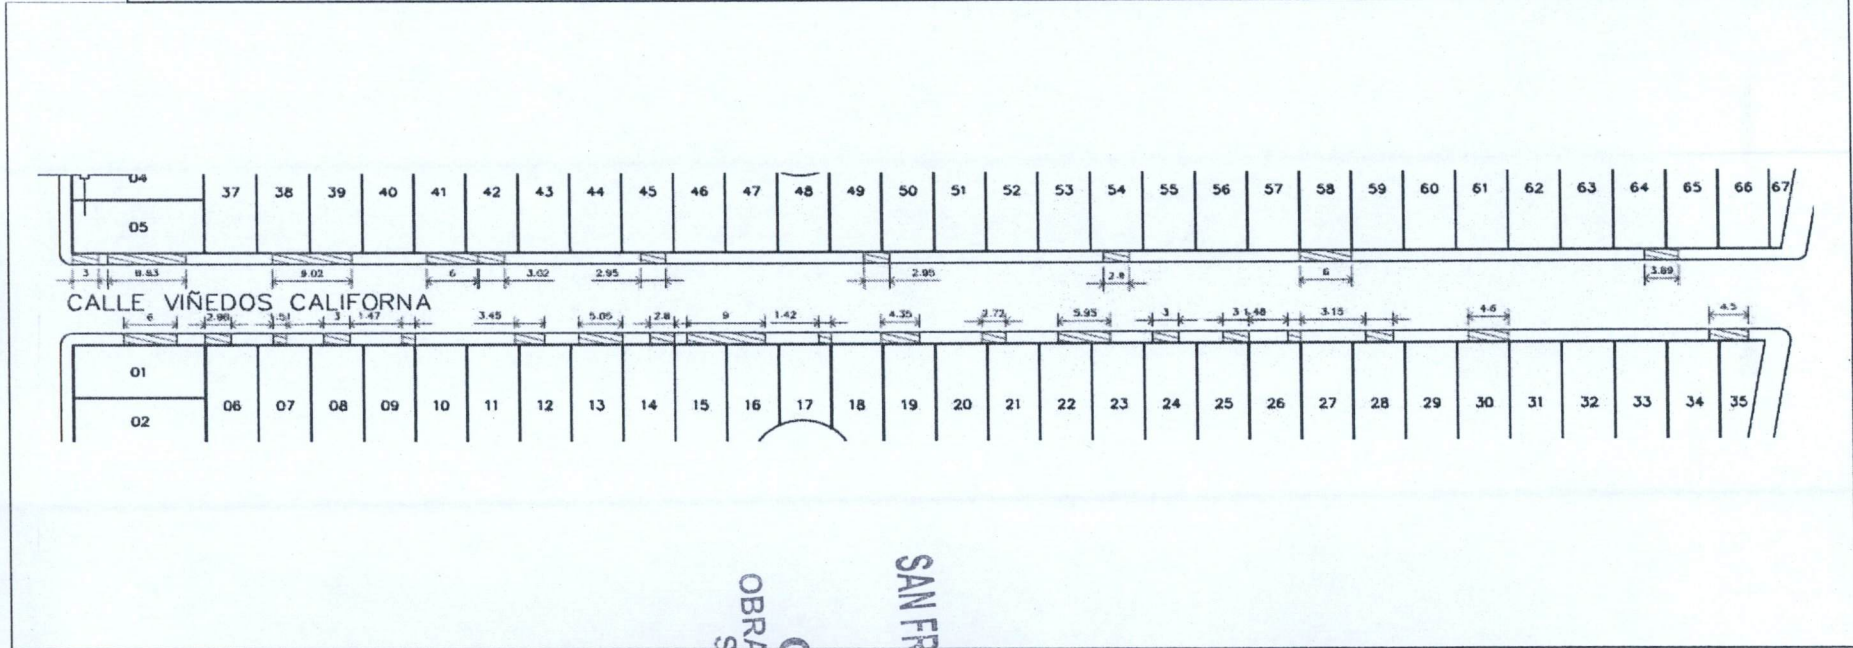

OBSERVACIONES :

SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)

ING. AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA.

OPERADO
MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 OBRA INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 2022

RESIDENTE

Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo



ING. AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA.

NO. DE OBRA: _____
 NO. DE CONTRATO: _____
 DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE PAVIMENTO Y TOMAS HIDRAULICAS EN CALLE VIÑEDOS CALIFORNIA, EXVIÑEDOS DE GUADALUPE, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 UBICACIÓN: CABAERA MUNICIPAL,SFR




NUMEROS GENERADORES

ESTIMACION NO. 3

No.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	TOTAL
			EJE	TRAMO	TIPO						

5	CARGA MECÁNICA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE ESCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO AL 1er. KM, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.										
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

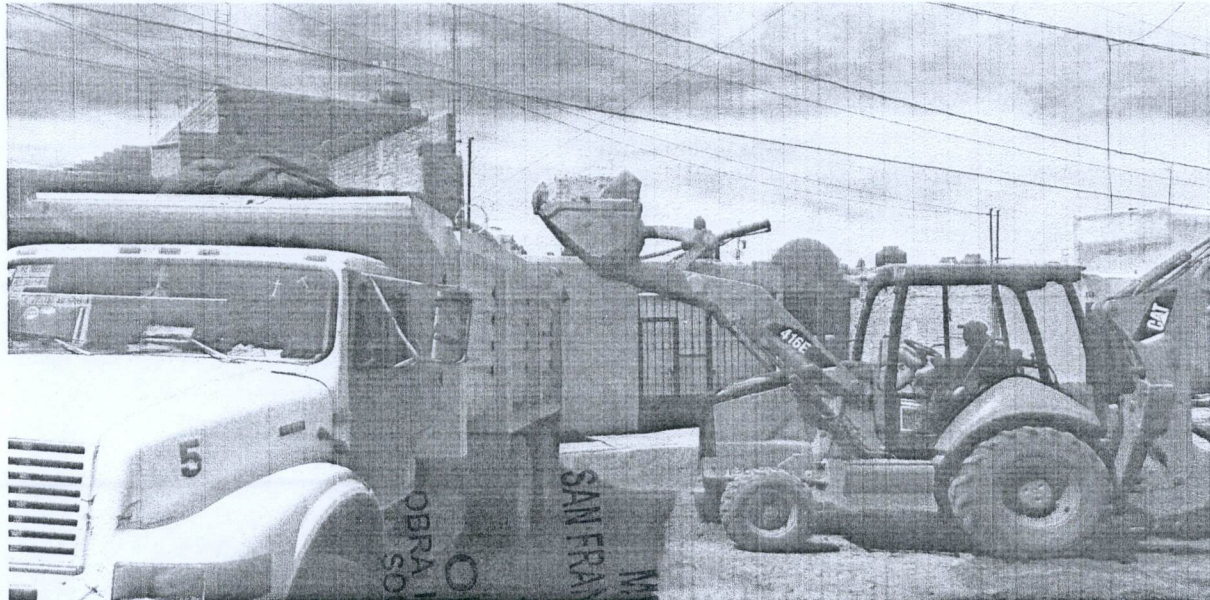

OBSERVACIONES :

SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)
ING. AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA.

OPERADO
 OBRA INFRA ESTRUCTURA
 SOCIAL MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 2022

RESIDENTE
 Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
0



ING. AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA.



NUMEROS GENERADORES

NO. DE OBRA:	_____
NO. DE CONTRATO:	_____
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE PAVIMENTO Y TOMAS HIDRAULICAS EN CALLE VIÑEDOS CALIFORNIA, EXVIÑEDOS DE GUADALUPE, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
UBICACIÓN:	CABAERA MUNICIPAL,SFR

ESTIMACION NO. 3

No.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	TOTAL
			EJE	TRAMO	TIPO						

6 ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES AL TIRADERO OFICIAL AUTORIZADO MÁS CERCANO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.



OBSERVACIONES:

SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)
ING. AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA.

OPERADO
 OBRAS INFRA ESTRUCTURA
 SOCIAL MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 2022

RESIDENTE
 Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
ING FERNANDO LUNA MEDINA



AYUNTAMIENTO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
2021 - 2024

ING. AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA.




NO. DE OBRA:	_____
NO. DE CONTRATO:	_____
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE PAVIMENTO Y TOMAS HIDRAULICAS EN CALLE VIÑEDOS CALIFORNIA, EXVIÑEDOS DE GUADALUPE, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
UBICACIÓN:	CABAERA MUNICIPAL,SFR



NUMEROS GENERADORES

ESTIMACION NO. 3

No.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	TOTAL
			EJE	TRAMO	TIPO						
6	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES AL TIRADERO OFICIAL AUTORIZADO MÁS CERCANO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.										

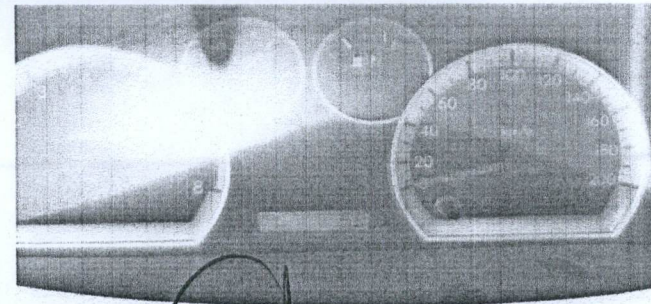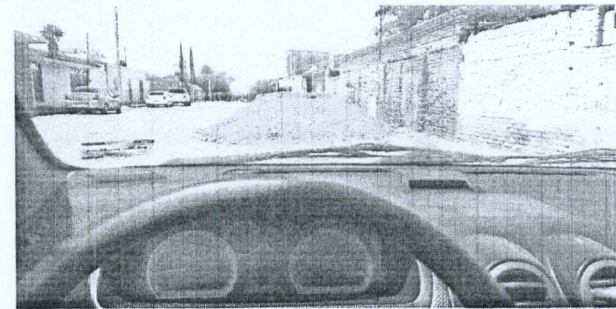

OBSERVACIONES :

SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)

ING. AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA.

OPERADO
MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL
 2022

RÉSIDENTE

Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
ING FERNANDO LUNA MEDINA



ING. AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA.



NUMEROS GENERADORES


NO. DE OBRA: _____
 NO. DE CONTRATO: _____
 DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE PAVIMENTO Y TOMAS HIDRAULICAS EN CALLE VIÑEDOS CALIFORNIA, EXVIÑEDOS DE GUADALUPE, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 UBICACIÓN: CABAERA MUNICIPAL,SFR

ESTIMACION NO. 3

No.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	TOTAL
			EJE	TRAMO	TIPO						

12

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOCRETO 10 X 10 X 8 COLOR GRIS PARA PAVIMENTO CON CAMA DE ARENA DE 7 CMS

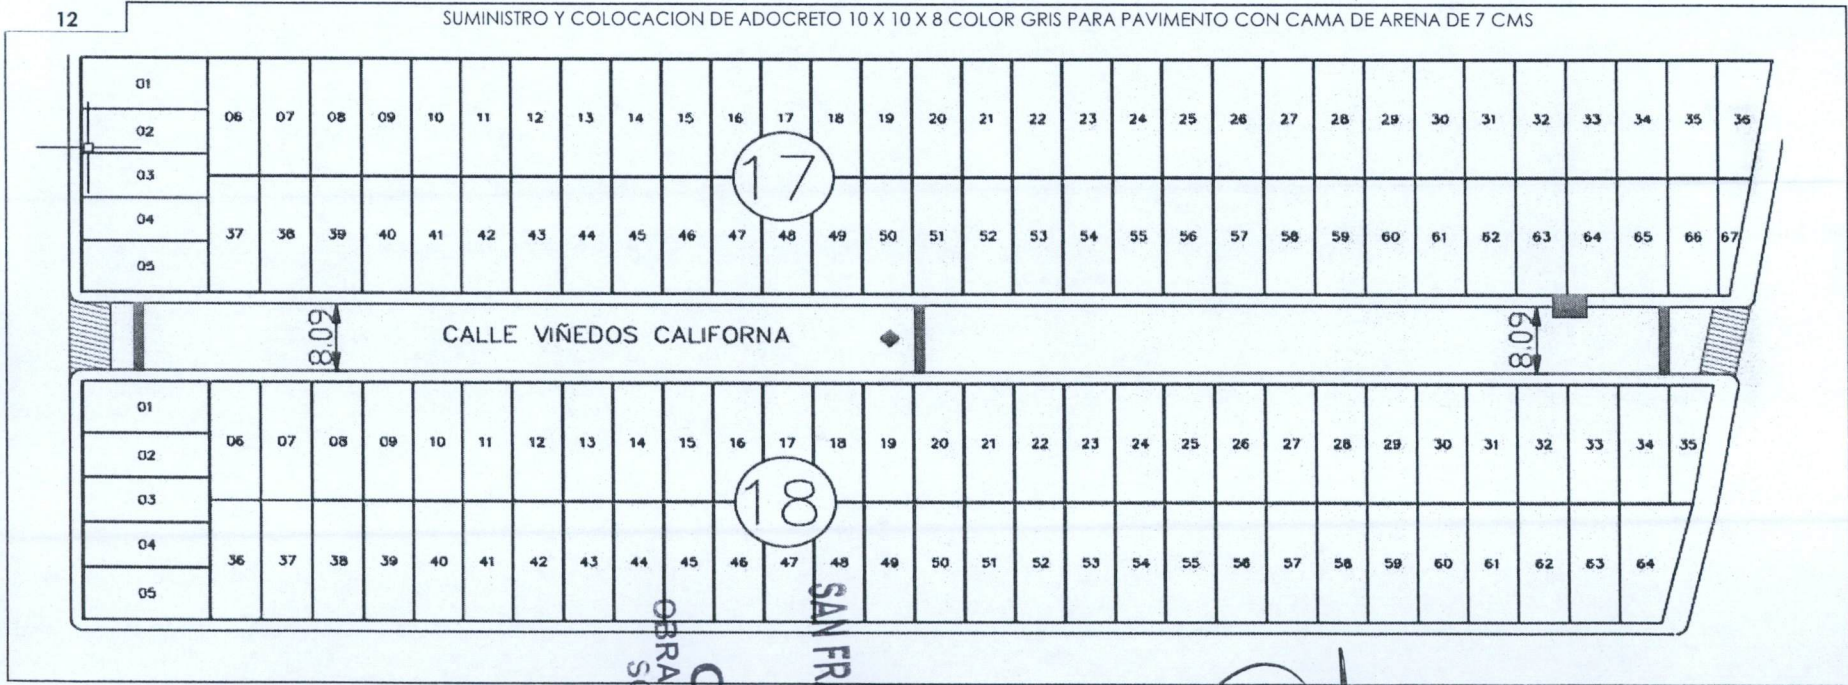

OBSERVACIONES:

SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)
ING. AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA.

OPERADO
 OBRA INFRA ESTRUCTURA
 SOCIAL MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 2022

RESIDENTE
 Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
ING. FERNANDO LUNA MEDINA



ING. AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA.

NO. DE OBRA: _____
 NO. DE CONTRATO: _____
 DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE PAVIMENTO Y TOMAS HIDRAULICAS EN CALLE VIÑEDOS CALIFORNIA, EXVIÑEDOS DE GUADALUPE, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 UBICACIÓN: CABAERA MUNICIPAL,SFR




NUMEROS GENERADORES

ESTIMACION NO. 3

No.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	TOTAL
			EJE	TRAMO	TIPO						

12 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOCRETO 10 X 10 X 8 COLOR GRIS PARA PAVIMENTO CON CAMA DE ARENA DE 7 CMS

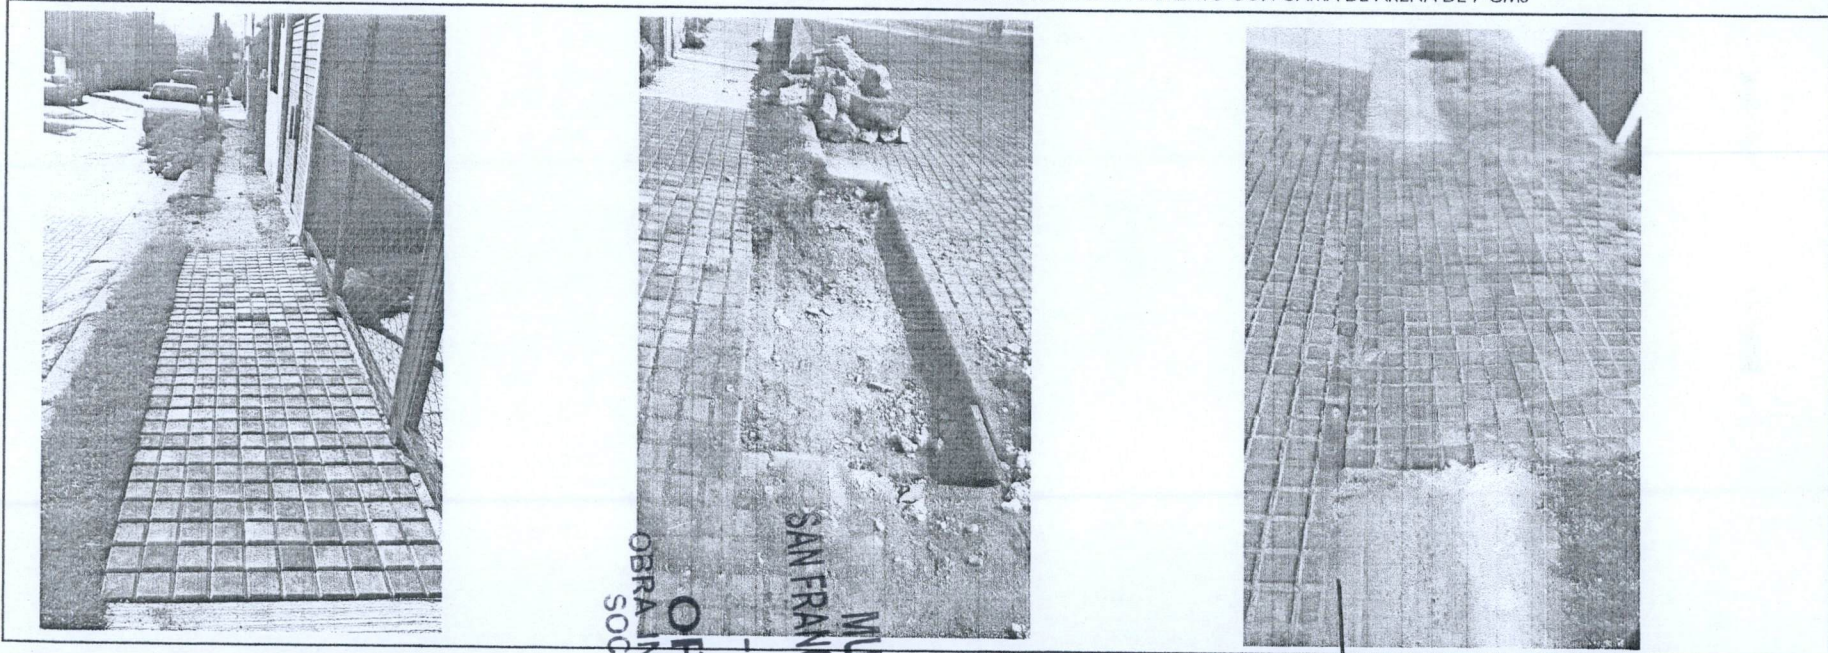


OBSERVACIONES :

SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)
ING. AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA.

RESIDENTE
 Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
ING FERNANDO LUNA MEDINA

OPERADO
 OBRA INFRA ESTRUCTURA
 SOCIAL MUNICIPAL
 11/01/2022
 MUNICIPIO DE
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO



ING. AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA.



NUMEROS GENERADORES

NO. DE OBRA: _____
 NO. DE CONTRATO: _____
 DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE PAVIMENTO Y TOMAS HIDRAULICAS EN CALLE VIÑEDOS CALIFORNIA, EXVIÑEDOS DE GUADALUPE, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 UBICACIÓN: CABAERA MUNICIPAL,SFR

ESTIMACION NO. 3

No.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	TOTAL
			EJE	TRAMO	TIPO						
18	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 10+-2 CM ACABADO RAYADO FINO CON BROCHA DE PELO, JUNTAS FRIAS CON DOBLADOR DE 2". SECCION DE LOSAS DE ACUERDO ALA EXISTENTE, INCLUYE: COLADO , CURADO CON MEMBRANA A BASE DE AGUA Y TRABAJO TERMINADO SEGUN FICHA TECNICA FT-200.	M2	BANQUETAS			4.50	1.00		1.00	4.50	4.50
						4.60	1.00		1.00	4.60	4.60
						3.15	1.60		1.00	5.04	5.04
						1.48	1.00		1.00	1.48	1.48
						3.00	1.02		1.00	3.06	3.06
						3.00	1.00		1.00	3.00	3.00
						5.95	0.35		1.00	2.08	2.08
						2.72	1.02		1.00	2.77	2.77
						4.35	0.97		1.00	4.22	4.22
						1.42	1.00		1.00	1.42	1.42
						0.30	0.60		1.00	0.18	0.18
						9.00	0.99		1.00	8.91	8.91
						2.80	1.01		1.00	2.83	2.83
						5.05	1.00		1.00	5.05	5.05
						3.45	1.50		1.00	5.18	5.18
						1.47	1.01		1.00	1.48	1.48
					3.00	1.60		1.00	4.80	4.80	
					1.51	0.01		1.00	0.02	0.02	
					2.98	1.02		1.00	3.04	3.04	
					6.00	0.98		1.00	5.88	5.88	
					3.00	1.01		1.00	3.03	3.03	
									SUBTOTAL =	72.57	

OBSERVACIONES :

SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)
ING. AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA.

OPERADO
 OBRA INFRA ESTRUCTURA
 SOCIAL MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 2022

RESIDENTE
 Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
ING FERNANDO LUNA MEDINA



Ayuntamiento de
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
2021 • 2024



ING. AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA.

NO. DE OBRA: _____
 NO. DE CONTRATO: _____
 DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE PAVIMENTO Y TOMAS HIDRAULICAS EN CALLE VIÑEDOS CALIFORNIA, EXVIÑEDOS DE GUADALUPE, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 UBICACIÓN: CABAERA MUNICIPAL,SFR




NUMEROS GENERADORES

ESTIMACION NO. 3

No.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	TOTAL
			EJE	TRAMO	TIPO						

18 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 10+2 CM ACABADO RAYADO FINO CON BROCHA DE PELO. JUNTAS FRIAS CON DOBLADOR DE 2", SECCION DE LOSAS DE ACUERDO ALA EXISTENTE, INCLUYE: COLADO , CURADO CON MEMBRANA A BASE DE AGUA Y TRABAJO TERMINADO SEGUN FICHA TECNICA FT-200.

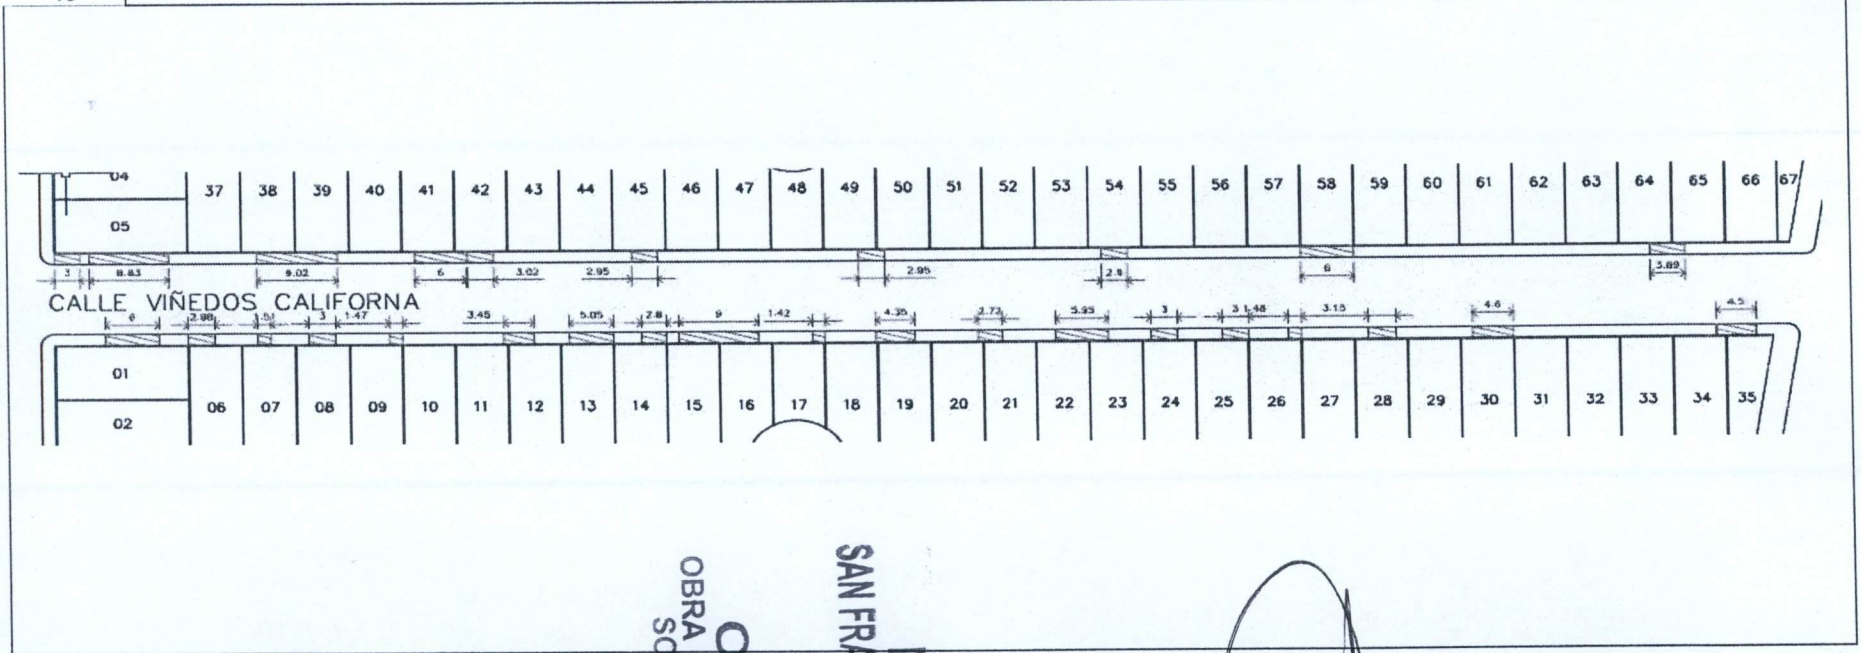

OBSERVACIONES :

SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)
 ING. AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA.

OPERADO
 OBRA INFRA ESTRUCTURA
 SOCIAL MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 2022

PRESIDENTE
 Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
 ING FERNANDO LUNA MEDINA



ING. AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA.




NUMEROS GENERADORES

NO. DE OBRA:	_____
NO. DE CONTRATO:	_____
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE PAVIMENTO Y TOMAS HIDRAULICAS EN CALLE VIÑEDOS CALIFORNIA, EXVIÑEDOS DE GUADALUPE, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
UBICACIÓN:	CABAERA MUNICIPAL,SFR

ESTIMACION NO. 3

No.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	TOTAL
			EJE	TRAMO	TIPO						

18 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 10+2 CM ACABADO RAYADO FINO CON BROCHA DE PELO, JUNTAS FRIAS CON DOBLADOR DE 2", SECCION DE LOSAS DE ACUERDO ALA EXISTENTE, INCLUYE: COLADO , CURADO CON MEMBRANA A BASE DE AGUA Y TRABAJO TERMINADO SEGUN FICHA TECNICA FT-200.

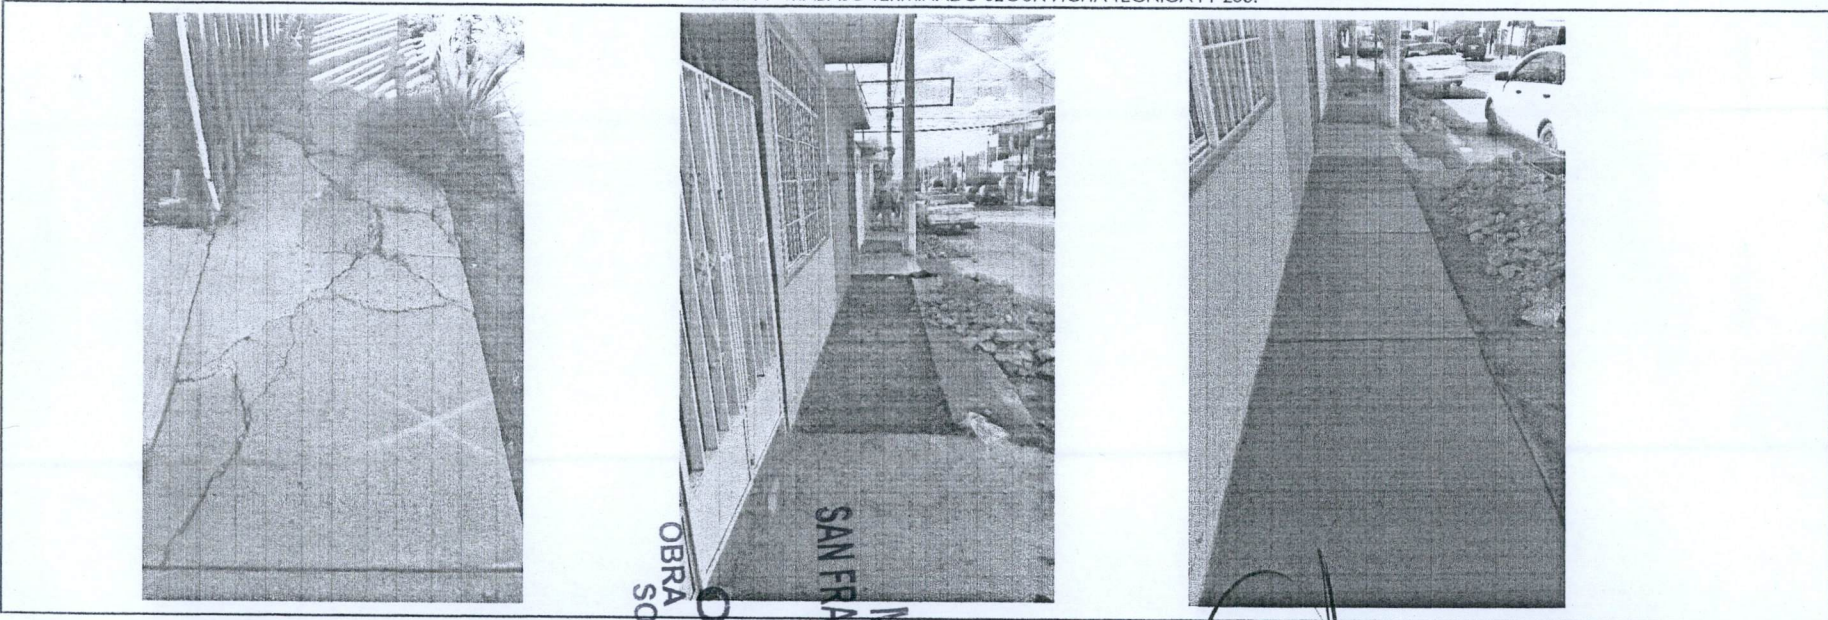

OBSERVACIONES :

SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)
ING. AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA.

OPERADO
 OBRA INFRA ESTRUCTURA
 SOCIAL MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 2022

RESIDENTE
 Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
ING FERNANDO LUNA MEDINA



ayuntamiento de
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
2021 • 2024



ING. AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA.

NO. DE OBRA: _____
 NO. DE CONTRATO: _____
 DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE PAVIMENTO Y TOMAS HIDRAULICAS EN CALLE VIÑEDOS CALIFORNIA, EXVIÑEDOS DE GUADALUPE, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 UBICACIÓN: CABAERA MUNICIPAL,SFR




NUMEROS GENERADORES

ESTIMACION NO. 3

No.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	TOTAL
			EJE	TRAMO	TIPO						

19

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE COLOR AZUL Y LOGOTIPO EN COLOR BLANCO DE TRAFICO, EN RAMPAS PARA MINUSVALIDOS

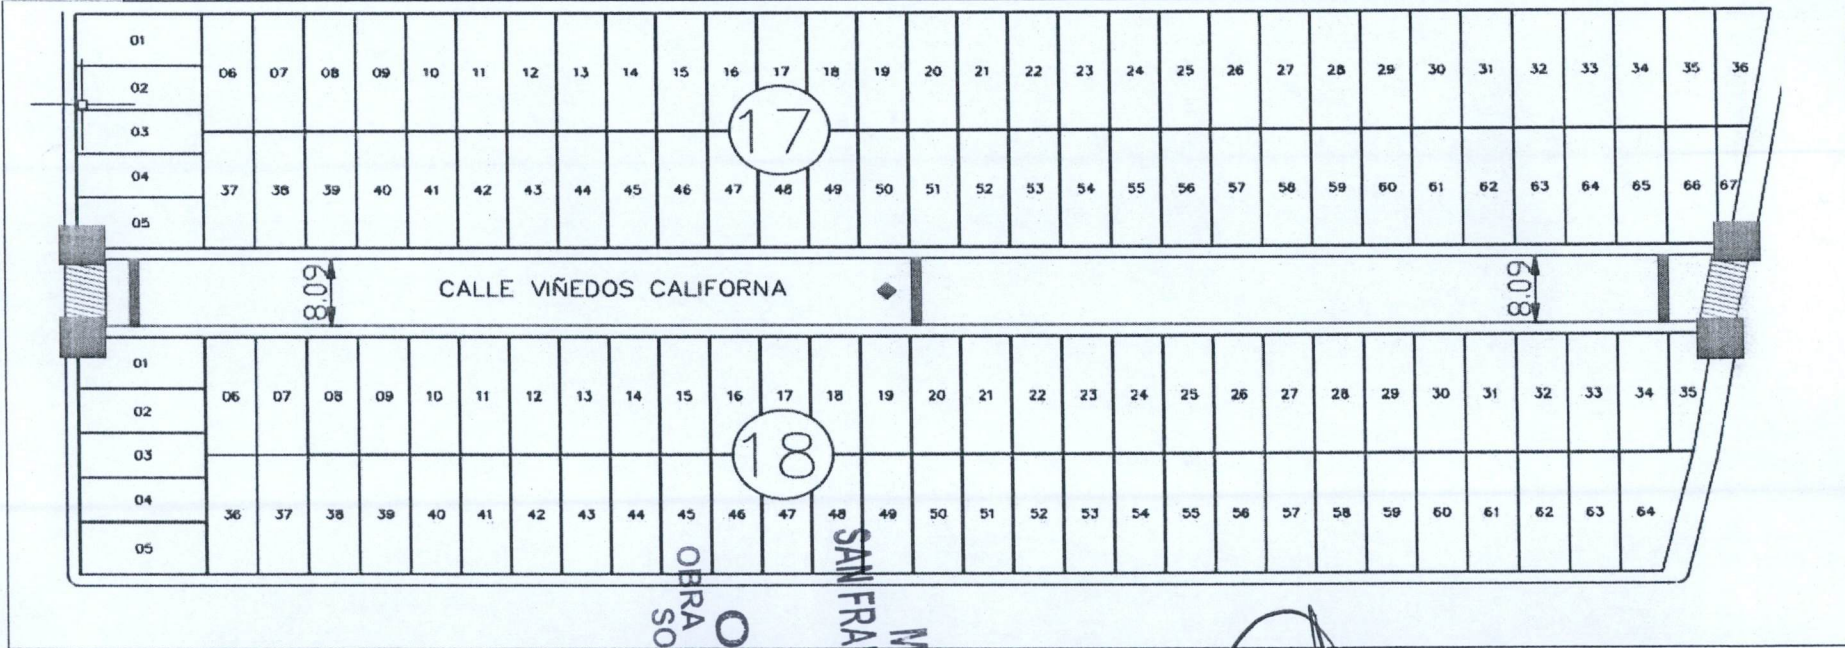

OBSERVACIONES :

SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)
ING. AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA.

OPERADO
 OBRAS INFRA ESTRUCTURA
 SOCIAL MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 2022

RESIDENTE
 Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
ING FERNANDO LUNA MEDINA



ING. AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA.

NO. DE OBRA: _____
 NO. DE CONTRATO: _____
 DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE PAVIMENTO Y TOMAS HIDRAULICAS EN CALLE VIÑEDOS CALIFORNIA, EXVIÑEDOS DE GUADALUPE, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 UBICACIÓN: CABAERA MUNICIPAL,SFR







NUMEROS GENERADORES

ESTIMACION NO. 3

No.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	TOTAL
			EJE	TRAMO	TIPO						

19 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE COLOR AZUL Y LOGOTIPO EN COLOR BLANCO DE TRAFICO, EN RAMPAS PARA MINUSVALIDOS

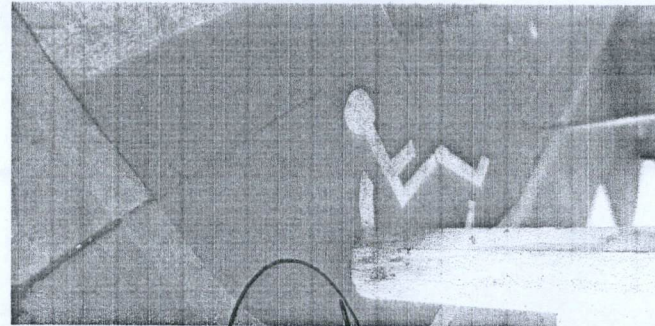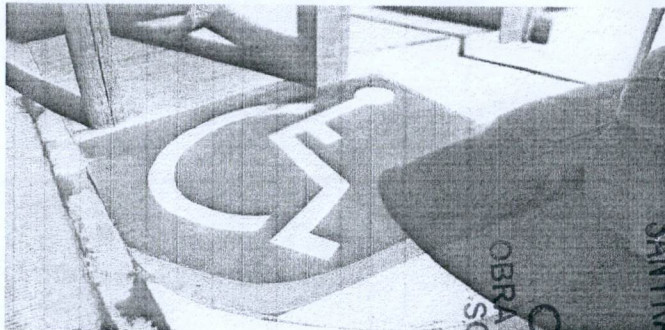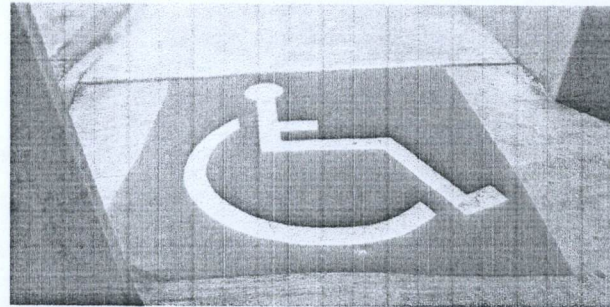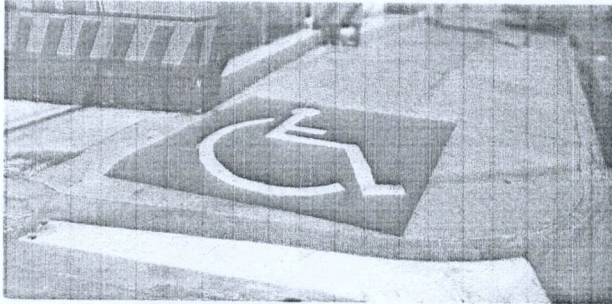

OBSERVACIONES :

SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)
 ING. AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA.

OPERADO
 OBRA INFRA ESTRUCTURA
 SOCIAL MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 2022

RESIDENTE
 Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
 #INEFI



Ayuntamiento de
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
2021 • 2024



ING. AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA.




NUMEROS GENERADORES

NO. DE OBRA: _____
 NO. DE CONTRATO: _____
 DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE PAVIMENTO Y TOMAS HIDRAULICAS EN CALLE VIÑEDOS CALIFORNIA, EXVIÑEDOS DE GUADALUPE, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 UBICACIÓN: CABAERA MUNICIPAL,SFR

E S T I M A C I O N N O 3

No.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	TOTAL
			EJE	TRAMO	TIPO						

20 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO O AMARILLO DE TRAFICO EN PAVIMENTO EN TOPES Y MARIMBAS

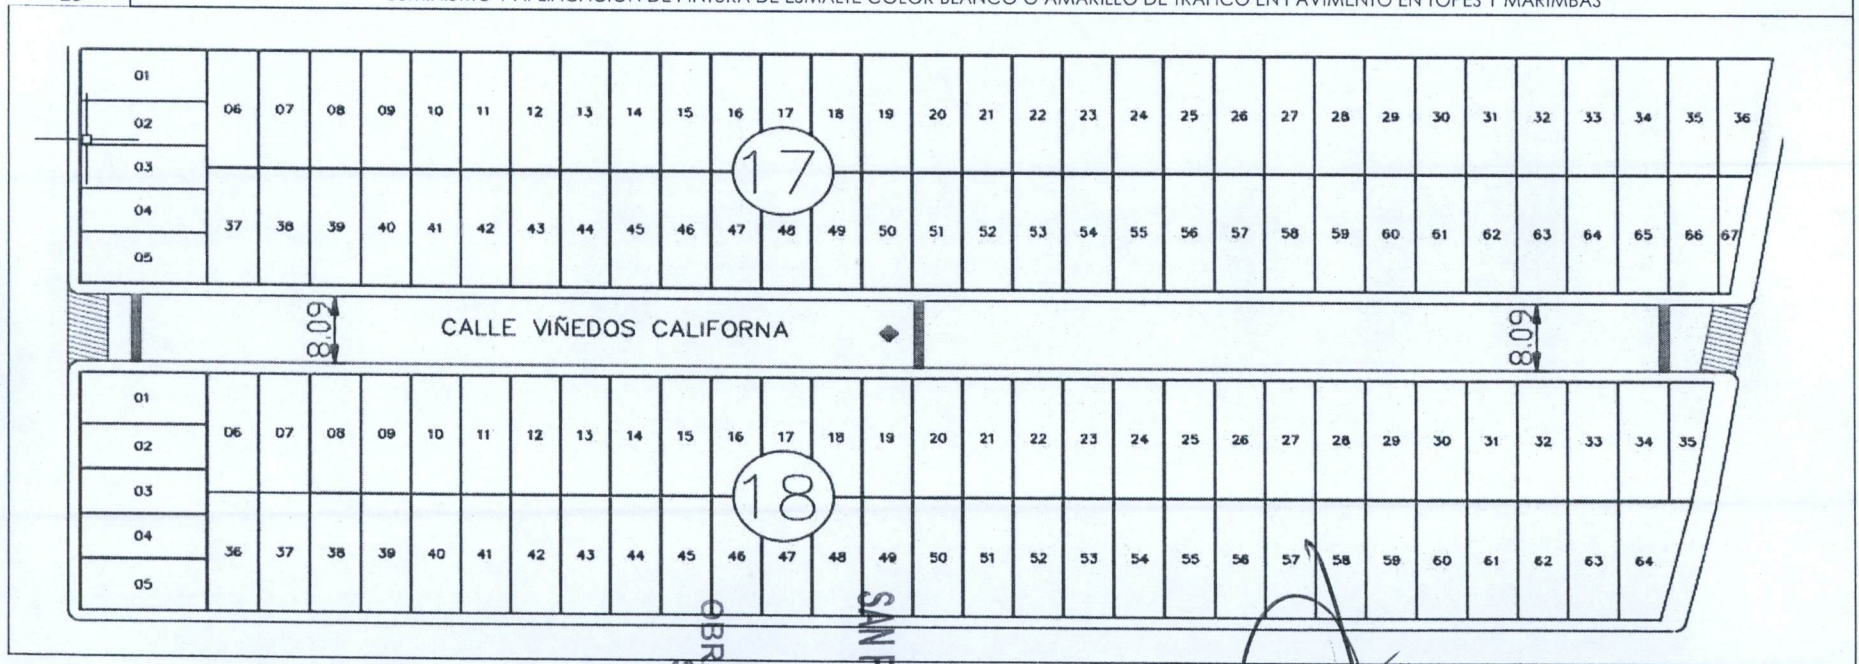

OBSERVACIONES :

SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)
ING. AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA.

OPERADO
 OBRA INFRA ESTRUCTURA
 SOCIAL MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 2022

RESIDENTE
 Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
ING FERNANDO LUNA MEDINA



ING. AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA.

NO. DE OBRA: _____
 NO. DE CONTRATO: _____
 DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE PAVIMENTO Y TOMAS HIDRAULICAS EN CALLE VIÑEDOS CALIFORNIA, EXVIÑEDOS DE GUADALUPE, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 UBICACIÓN: CABAERA MUNICIPAL,SFR




NUMEROS GENERADORES

E S T I M A C I O N N O 3

No.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	TOTAL
			EJE	TRAMO	TIPO						

20

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO O AMARILLO DE TRAFICO EN PAVIMENTO EN TOPES Y MARIMBAS

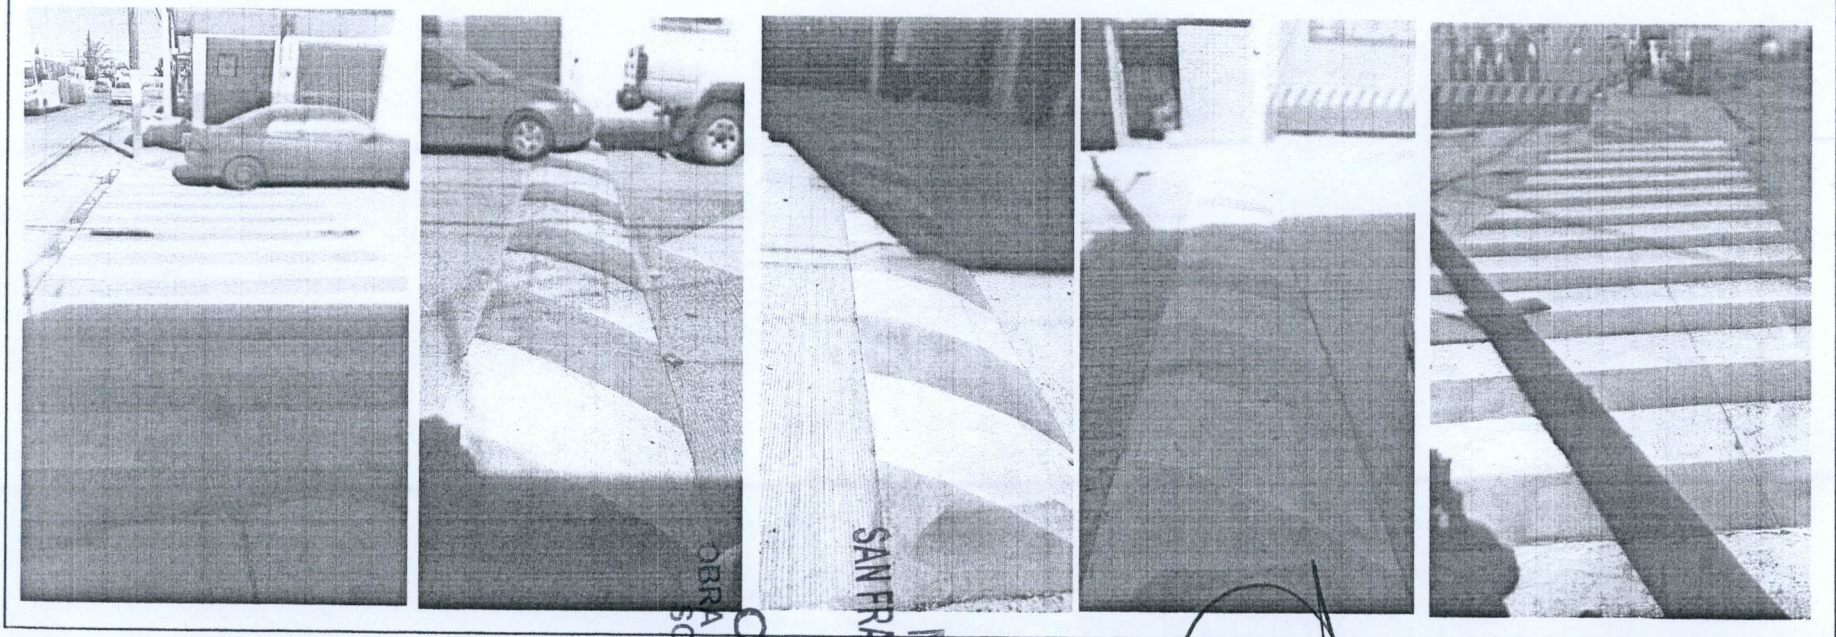

OPERADO
 OBRA INFRA ESTRUCTURA
 SOCIAL MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 2022

OBSERVACIONES :

SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)
ING. AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA.

RESIDENTE
 Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
#REFI



ING. AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA.




NUMEROS GENERADORES

NO. DE OBRA: _____
 NO. DE CONTRATO: _____
 DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE PAVIMENTO Y TOMAS HIDRAULICAS EN CALLE VIÑEDOS CALIFORNIA, EXVIÑEDOS DE GUADALUPE, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 UBICACIÓN: CABAERA MUNICIPAL,SFR


ESTIMACION NO. 3

No.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	TOTAL
			EJE	TRAMO	TIPO						

21 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO O AMARILLO DE TRAFICO, EN GUARNICIONES TRAPEZOIDAL O PECHO DE PALOMA



CALLE VIÑEDOS CALIFORNIA



CALLE VIÑEDOS CARIÑAN

OBSERVACIONES :

SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)

ING. AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA.

OPERADO
 OBRA INFRA ESTRUCTURA
 SOCIAL MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 2022

RESIDENTE

Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo

ING FERNANDO LUNA MEDINA



ING. AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA.

NO. DE OBRA: _____
 NO. DE CONTRATO: _____
 DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE PAVIMENTO Y TOMAS HIDRAULICAS EN CALLE VIÑEDOS CALIFORNIA, EXVIÑEDOS DE GUADALUPE, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 UBICACIÓN: CABAERA MUNICIPAL,SFR







NUMEROS GENERADORES

ESTIMACION NO. 3

No.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	TOTAL
			EJE	TRAMO	TIPO						

21

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO O AMARILLO DE TRAFICO, EN GUARNICIONES TRAPEZOIDAL O PECHO DE PALOMA

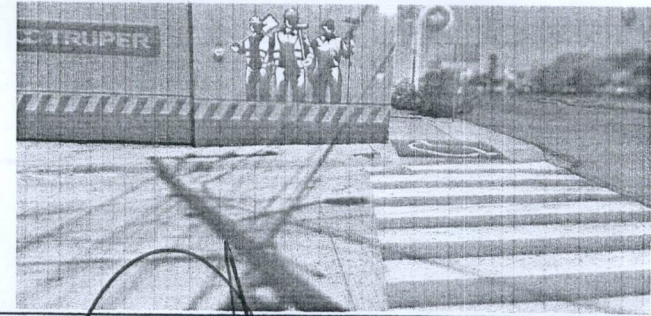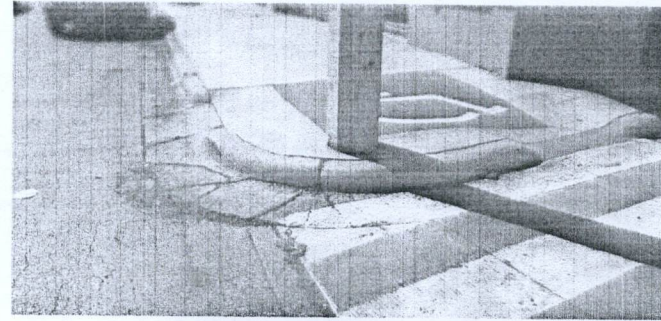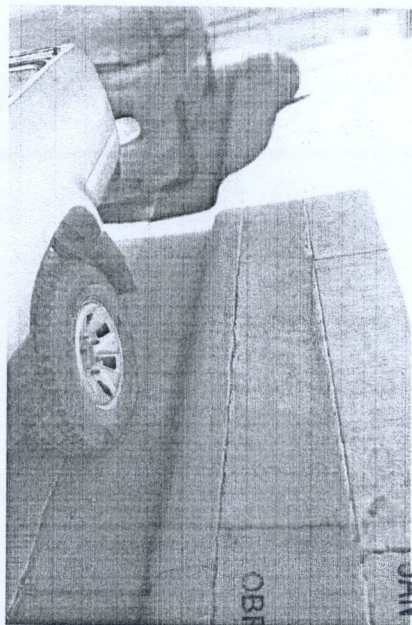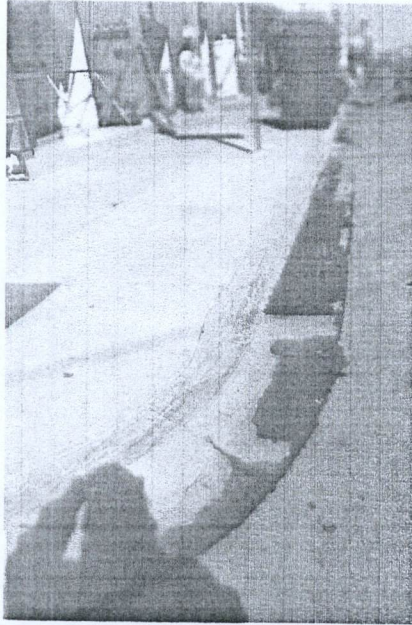

OBSERVACIONES :

SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)
 ING. AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA.

MUNICIPIO DE
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 OPERADO
 OBRAS INFRA ESTRUCTURA
 SOCIAL MUNICIPAL
 2022

RESIDENTE
 Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
 #REF!



Ayuntamiento de
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
2021 • 2024

ING. AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA.

NO. DE OBRA: _____
 NO. DE CONTRATO: _____
 DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE PAVIMENTO Y TOMAS HIDRAULICAS EN CALLE VIÑEDOS CALIFORNIA, EXVIÑEDOS DE GUADALUPE, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 UBICACIÓN: CABAERA MUNICIPAL, SFR




NUMEROS GENERADORES

ESTIMACION NO. 3

No.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	TOTAL
			EJE	TRAMO	TIPO						

22 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO VIAL INFORMATIVO DE LA OBRA DE 0.61 X 0.61 M LÁMINA GALVANIZADA

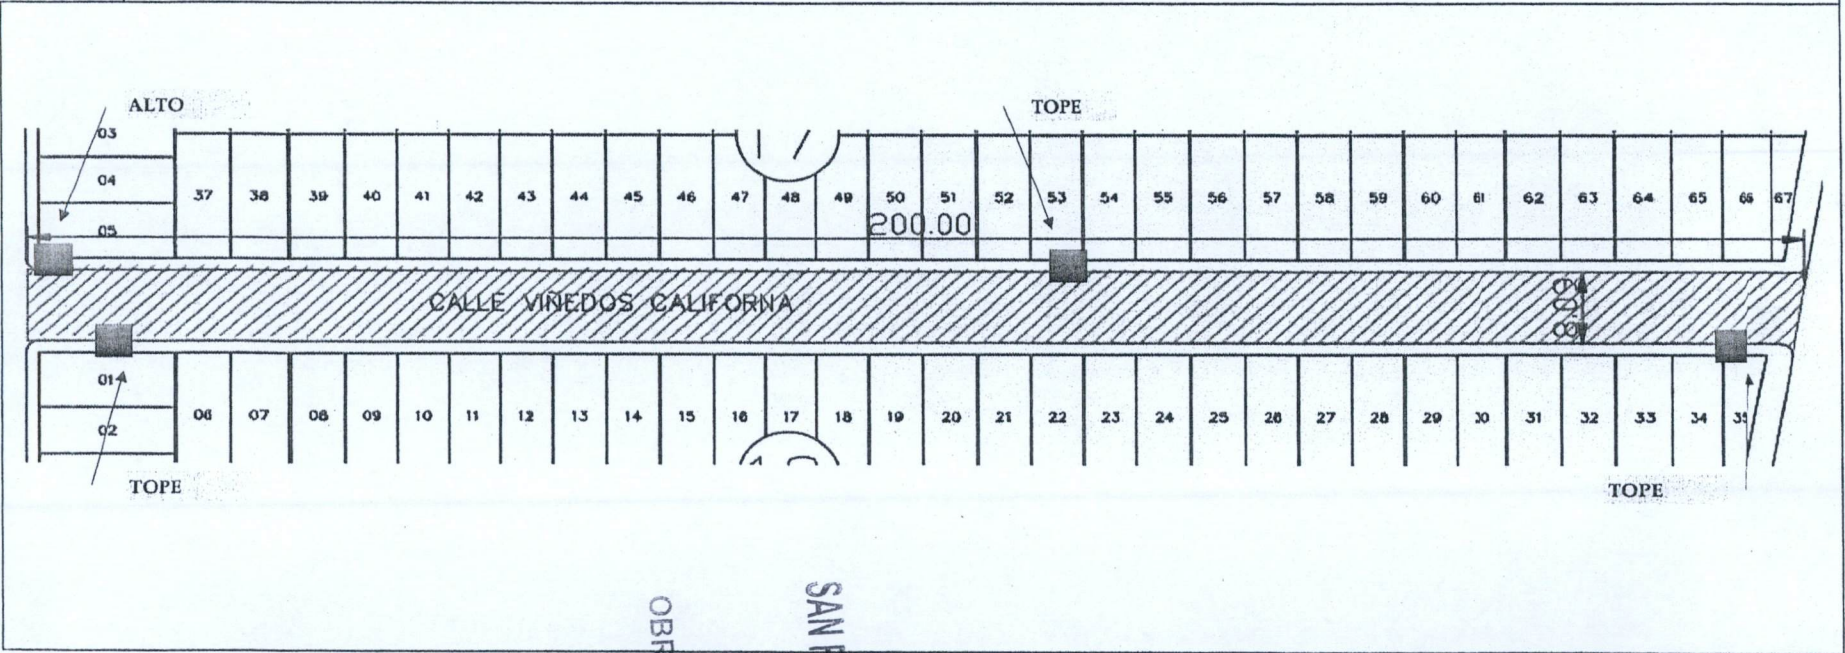


OBSERVACIONES:

SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)
ING. AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA.

OPERADO
 OBRA INFRA ESTRUCTURA
 SOCIAL MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 2022

RESIDENTE
 Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
ING FERNANDO LUNA MEDINA



Presidencia Municipal
 Ayuntamiento de
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 2011 - 2014

ING. AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA.

NO. DE OBRA: _____
 NO. DE CONTRATO: _____
 DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE PAVIMENTO Y TOMAS HIDRAULICAS EN CALLE VIÑEDOS CALIFORNIA, EXVIÑEDOS DE GUADALUPE, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 UBICACIÓN: CABAERA MUNICIPAL,SFR



NUMEROS GENERADORES

ESTIMACION NO. 3

No.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	TOTAL
			EJE	TRAMO	TIPO						

22 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO VIAL INFORMATIVO DE LA OBRA DE 0.61 X 0.61 M LÁMINA GALVANIZADA

OBSERVACIONES :

SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)
ING. AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA.

OPERADO
 MUNICIPIO DE
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 OBRA INFRA ESTRUCTURA
 SOCIAL MUNICIPAL
 2022

RESIDENTE
 Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
#JREFI

BITÁCORA DE OBRA



Ayuntamiento de
SAN FRANCISCO
DE LOS RÍOS
2021 - 2024

HOJA _____

CONTRATO FISMDF 023 / 2022

OBRA FISMDF 023/2022
23 / 11 / 2022

Con fecha de hoy esta supervisión autoriza la estimación numero 3 (Tres) de la obra numero FISMDF 023/2022 de la empresa denominada Azuel Jario Cordova Huerta, dicha estimacion del contrato de esta obra, bajo las siguientes características:

- Periodo del 25 al 27 de Septiembre 2022
- Entrega de generadores 24 de Octubre 2022
- Monto base \$ 78,778.79
- Amortización de Anticipo \$ 39,389.39
- Total de retenciones \$ 787.79
- Total a pagar \$ 44,903.91

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS RÍOS


-- -- 2022

OPERADO
OBRA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

Dirección de
OBRAS PÚBLICAS



Ayuntamiento de
**SAN FRANCISCO
DE LOS ROMO**
2021 • 2024



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN
FRANCISCO DE LOS ROMO
No. Oficio: DOP/642/22
San Francisco de los Romo, Ags., 23 de diciembre de 2022
Asunto: LIBERACIÓN DE PAGO

2388

C.P. MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
PRESENTE

Por medio del presente le remito la documentación de la estimación No. 3, para que se realicen los trámites necesarios para su pago.

No. de Obra: FIS MDF 023/2022

Nombre de la Obra: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE VIÑEDOS CALIFORNIA ENTRE LA AVENIDA CONSTITUCIÓN Y CALLE VIÑEDOS SAN MARCOS

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal

Contratista: AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA (COHA811227BM0)

Contrato: FIS MDF 023/2022 No Factura: 277

Objeto del Contrato: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE VIÑEDOS CALIFORNIA ENTRE LA AVENIDA CONSTITUCIÓN Y CALLE VIÑEDOS SAN MARCOS, EN EX VIÑEDOS GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Monto del Contrato: \$1,524,195.64 (UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 64/100 M.N.)

Monto a Pagar: \$44,903.91 (CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 91/100 M.N.)

Así mismo le solicito que una vez termiando dicho trámite se nos haga llegar el auxiliar contable .

Sin otro particular de momento, me es grato enviarle un cordial saludo agradeciendo de antemano las atenciones al presente.

ATENTAMENTE

ING. JOSE DE JESUS CHAVEZ GARCIA
DIRECTOR DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

2022

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

C.c.p. Archivo

Av. Benito Juárez S/N, Rancho La Trinidad,
San Francisco de los Romo, Ags. Tel: (465) 967 0124 ext. 1654
