



Usr: susana
Rep: rptPoliza

Municipio de San Francisco de los Romo
ESTADO DE AGUASCALIENTES

Póliza: C03877 Del 30/09/2022



Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2022 01:04 p. m.
Página | 1

Concepto: FISM 2022 PAGADO EST 2 OBRA FISMDF 024-2022 REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 12 DE DICIEM. GP Folio: 260

Beneficiario: **PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTES SA DE CV**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-2501-K029-J04-61401-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$780,989.46		GP Folio: 260
0002	8260-2501-K029-J04-61401-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y		\$780,989.46	GP Folio: 260
0003	2113-000387	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	\$780,989.46		GP Folio: 260
0004	1112-003-002	Bancomer Cta. 011793039-9 FISM		\$383,762.07	GP Folio: 260
0005	1134-003-006	Proyectos y Construcciones JE de la		\$390,494.73	FISM 2022 PAGADO EST 2 OBRA FISMDF 024-2022
0006	2117-9-005-001	0.1% COLEGIO DE		\$673.27	FISM 2022 PAGADO EST 2 OBRA FISMDF 024-2022
0007	2117-9-005-002	0.2% ORGANO SUPERIOR DE		\$1,346.53	FISM 2022 PAGADO EST 2 OBRA FISMDF 024-2022
0008	2117-9-005-003	0.2% INST. DE CAPACIT. DE LA		\$1,346.53	FISM 2022 PAGADO EST 2 OBRA FISMDF 024-2022
0009	2117-9-005-004	0.5% CONTRALORIA MUNICIPAL		\$3,366.33	FISM 2022 PAGADO EST 2 OBRA FISMDF 024-2022
Sumas iguales =>			<u>1,561,978.92</u>	<u>1,561,978.92</u>	

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
-- 2022
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

PCJ150422SA7

Folio fiscal

TLATELOLCO 101

7f0b41d1-2845-4632-8e4b-9a7815dd2514

LOMAS DE JESUS MARIA

RFC Certificador

JESUS MARIA, JESUS MARIA.

LSO1306189R5

AGUASCALIENTES, México C.P. 20925

No. certificado del SAT

(626) Régimen Simplificado de Confianza

00001000000509846663

Teléfonos: 449 9189061

Fecha y hora certificación

Tipo Comprobante: (P) Pago

2022-12-01 12:53:46

Lugar Expedición: Aguascalientes, 20925

RFC	MSF920130TQ9	Fecha expedición	01/12/2022 12:53:45
Nombre	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	Uso CFDI	(P01) Por definir
Calle	FRANCISCO ROMO JIMENEZ 102		
Colonia	FRACC. SAN JOSE DE BUENAVISTA C.P. 20300		
Ciudad, Estado	SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.. México		

Clave	ProdServ	Cantidad	Cve. Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
84111506		1	(ACT) Actividad	Pago	0	0
Subtotal						0.00
Total						0.00

CERO XXX 00/100

Ordenante	BBA830831LJ2	0117930399	Beneficiario	BBA830831LJ2	012010001110764938
Forma Pago	(03) Transferencia electrónica de fondos		Número Operación	REFBNTC00796395	
Fecha Pago	2022-09-30T12:00:00				

Documentos Pagados

UUID	Documento	Metodo Pago	Importe	Moneda
03d95403-4329-43b7-b199-461e2ca02340	279	PPD	383,762.07	MXN
<i>Parcialidad : 3</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Insoluto</i>	46,880.31	
			Total	383,762.07 MXN

TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 07/100 M.N.

Número Certificado 00001000000414634971

Sello digital del CFDI

MNT1LuEWeIZfWHenmhNp19EoJj+16W9dXH5Mo0mOIgaqU1qgInrIyWEtFzKQ8x3mxcCLp1DogV10hpmPF1p6H17H4sYwb3vMcSnlnacF+yo7JLYJ2qSz0Na508rN66FpS1rOrOxQHAKafUzH5FCvi8dEJdHGU6d8u7BitLuWYqC+qEaHTrR+MHLciIBXORcoCwxduY7dKaS7Ejz2MG35Xs0CI6qVGBuUglo3qAn+xwDNNXDivs4y2h2xYHwm+RhmjuR5Zbo6U14x9ub1mFFzIELPBH/BX4Z1EKWCOBfvaTvzE5z3kmA3IdZDKI+xvStydz/KLTIar4kVuvUP2EQ==

Sello del SAT

GjcxkqO/B0CyJQGQkdfnLfg8CHFsUOdGhDnFNGdJkum6iQvEulmbTF3vCmD/OeSsM/QXSavZpls/rdATWGGwbOnPm6QIdKOGpOF3It32X3A6JE/sjwhTnJywxhcvAv+kIpIhPT9XM9B6F1RK1pLcvxY6ItmVKxzQq2ILMJ3QHbWEn2CBFObn82tRuFmaMfx07MTjUocfncITZdt2PPwaTje3SA7zqdlFV5m01iuAoByIuyzxfu2QdBdZJ4HpXRMEQ3iYPOOMHhpkcBjenvhcBzYdJKwKQtBCLkLW6Jkz6v0okHR//vLSyiu04SALshYdGVpL2QjrEzAqkika==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7f0b41d1-2845-4632-8e4b-9a7815dd2514|2022-12-01T12:53:46|LSO1306189R5|MNT1LuEWeIZfWHenmhNp19EoJj+16W9dXH5Mo0mOIgaqU1qgInrIyWEtFzKQ8x3mxcCLp1DogV10hpmPF1p6H17H4sYwb3vMcSnlnacF+yo7JLYJ2qSz0Na508rN66FpS1rOrOxQHAKafUzH5FCvi8dEJdHGU6d8u7BitLuWYqC+qEaHTrR+MHLciIBXORcoCwxduY7dKaS7Ejz2MG35Xs0CI6qVGBuUglo3qAn+xwDNNXDivs4y2h2xYHwm+RhmjuR5Zbo6U14x9ub1mFFzIELPBH/BX4Z1EKWCOBfvaTvzE5z3kmA3IdZDKI+xvStydz/KLTIar4kVuvUP2EQ==|00001000000509846663||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3



[Signature]
MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

2022

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PCJ150422SA7	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTES SA DE CV	MSF920130TQ9	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7F0B41D1-2845-4632-8E4B-9A7815DD2514	2022-12-01T12:53:45	2022-12-01T12:53:46	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$0.00	Pago	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir


**MUNICIPIO DE
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
 -- 2022
OPERADO
**OBRA INFRA ESTRUCTURA
 SOCIAL MUNICIPAL**



Fecha y hora de consulta

30/09/2022 3:51:30 PM

Contrato

00796395

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: EST 2 FIS MDF 024

Importe de la operación: 383,762.07 MXP

Cuenta de retiro: 0117930399

Cuenta de depósito: 0111076493

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Titular de la cuenta: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTES SA DE CV

Fecha de creación: 30/09/2022

Fecha de aplicación: 30/09/2022

Hora: 15:51:26

Instrumento de seguridad: ASD 6550927880

Motivo de pago: PAGO EST 2 FIS MDF 11-024

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
2022
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0046948026

Folio único: I323202209301551260046948033

Estado operación


Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	30/09/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	30/09/2022

Dirección de
OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



C.P.MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
PRESENTE

Ayuntamiento de
**SAN FRANCISCO
DE LOS ROMO**
2021 + 2024



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN
FRANCISCO DE LOS ROMO
No. Oficio: DOP/402/22
San Francisco de los Romo, Ags., 30 de septiembre de 2022
Asunto: LIBERACIÓN DE PAGO

Por medio del presente le remito la documentación de la estimación No. 2 para que se realicen los trámites necesarios para su pago.

No. de Obra: FIS MDF 024/2022

Nombre de la Obra: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE 12 DE DICIEMBRE ENTRE LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE

Programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2022

Contratista: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA ERI AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

Contrato: FIS MDF 024/2022 No Factura: 279 -- 2022

Objeto del Contrato: PAVIMENTACION EN LA CALLE 12 DE DICIEMBRE

Monto del Contrato: \$1,125,643.35 (UN MILLÓN CIENTO VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 35/100 M.N.)

Monto a Pagar: \$383,762.07 (TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 07/100 M.N.)

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

Sin otro particular de momento, me es grato enviarle un cordial saludo agradeciendo de antemano las atenciones al presente.

ATENTAMENTE

ING. JOSE DE JESUS CHAVEZ GARCIA
DIRECTOR DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

C.c.p. Archivo

Av. Benito Juárez S/N, Rancho La Trinidad,
San Francisco de los Romo, Ags. Tel: (465) 967 0124 ext. 1654

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
CÉDULA DE SEGUIMIENTO A ESTIMACIONES DE OBRA



DATOS GENERALES																																	
CONTRATISTA: <u>Proyectos y construcciones JE de la Peña en Aqs. SA. de</u>						N° DE CONTRATO: <u>ESMDF 007-020-024/2022</u>																											
SUPERVISOR <u>T.C. Fernando Luna Medina</u>						N° DE OBRA: <u>ESMDF 024/2022</u>																											
OBRA: <u>Rehabilitación de pavimentación en calle 12 de diciembre</u>						N° DE FACTURA: <u>279</u>																											
FECHA DE CORTE: DEL: <u>11</u> AL: <u>24</u> de <u>septiembre</u> de <u>2022</u>						N° DE ESTIMACION: <u>2 (005)</u>																											
IMPORTE LIQUIDO:																																	
FORMATO DE NUMEROS GENERADORES																																	
INGRESO		REVISIÓN		NOTA				CAPTURA EN SISTEMA		ENTREGA DE PRE-FACTURA																							
<u>27/09/2022</u>		<u>27/09/2022</u>		Sr. contratista regrese esta cédula con la estimación original de lo contrario no se le dara tramite				<u>29/09/2022</u>		<u>29/09/2022</u>																							
CONTRATISTA		SUPERVISOR						SUPERVISOR		SUPERVISOR																							
FORMATO DE ESTIMACION																																	
INGRESO		REGISTRO		SUPERVISOR				JEFE DE DEPARTAMENTO																									
<u>30/09/22</u>		<u>30/09/22</u> <u>30/09/22</u>		<u>30/09/22</u> <u>30/09/22</u>				ARQ. ALFREDO FLORES MARMOLEJO <u>30/09/22</u> <u>30/09/22</u>																									
CONTRATISTA		CONTROL DE ESTIMACIONES										RECIBIDO		AUTORIZADO		RECIBIDO		AUTORIZADO															
DEVOLUCION				CONTENIDO				DIRECTOR GENERAL																									
FECHA DE DEVOLUCIÓN:				CÁRATULA				<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width:50%;"></td><td style="width:50%; text-align: center;">✓</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: center;">✓</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: center;">✓</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: center;">✓</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: center;">NA</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: center;">✓</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: center;">✓</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: center;">NA</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: center;">NA</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: center;">NA</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: center;">✓</td></tr> </table>					✓		✓		✓		✓		NA		✓		✓		NA		NA		NA		✓
	✓																																
	✓																																
	✓																																
	✓																																
	NA																																
	✓																																
	✓																																
	NA																																
	NA																																
	NA																																
	✓																																
FECHA DE REINGRESO:				RESUMEN																													
MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN:				CONCEPTOS																													
				ESTADO DE CUENTA																													
				CONCENTRADO DE CONCEPTOS (FIN)																													
				GENERADORES Y RESUMEN																													
				CROQUIS																													
				FOTOGRAFIAS																													
				ANALISIS PRECIO UNITARIO																													
				REPORTE(S) DE LABORATORIO																													
				FIANZA(S) (FIN)																													
				NOTA DE BITACORA DE OBRA																													
								DIRECTOR GENERAL ING. JOSÉ DE JESUS CHÁVEZ GARCÍA <u>30/09/22</u> <u>30/09/22</u> RECIBIDO AUTORIZADO																									
								FINANZAS																									
								RECIBIDO AUTORIZADO																									
TRAMITE DE PAGO																																	
FECHA DE INICIO DE TRAMITE EN DOP-SFR			FIRMA DEL DIRECTOR			OFICIO DE LIBERACION			FECHA DE ENTREGA																								
<u>27</u>	<u>09</u>	<u>22</u>	<u>30</u>	<u>09</u>	<u>22</u>	<u>30</u>	<u>09</u>	<u>22</u>																									
DÍA:	MES:	AÑO:	DÍA:	MES:	AÑO:	DÍA:	MES:	AÑO:	DIRECCIÓN DE EGRESOS.																								

PRE-FACTURA Normal



PRE-FACTURA DEL CONTRATISTA: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. (653)

A NOMBRE DE: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 RFC: MSF920130TQ9
 DIRECCION: FCO ROMO JIMENEZ 102, SAN JOSE DE BUENAVISTA, SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS,
 CIUDAD: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE L ESTADO: AGUASCALIENTES

DESCRIPCION

PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 Del 11 Sep 2022 al 24 Sep 2022		MONTO BASE	\$673,266.78
DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE 12 DE DICIEMBRE ENTRE LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE		AJUSTE DE COSTOS (+)	\$0.00
UBICADA EN: COLONIA 28 DE ABRIL EN CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO		AMORTIZACION DE ANTICIPO (-)	\$336,633.39
CON AMPARO DEL CONTRATO No.: FISMDF007-020-024/2022 24		SUBTOTAL	\$336,633.39
DE FECHA:: 18/07/2022		IVA (+)	\$53,861.34
BAJO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA:		SUBTOTAL CON IVA	\$390,494.73
Inversion	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal 2022		
Programa	SF PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES		
SubPrograma	01 CONCRETO		
Obra.	FISMDF 024/2022 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE 12 DE DICIEMBRE ENTRE LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y		
Localizacion	COLONIA 28 DE ABRIL EN CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO		
	CAPACITACION DE LOS TRABAJADORES DEL CONTRATISTA	\$1,346.53 (0.20%)	
	COLEGIOS DE PROFESIONISTAS SEGUN CORRESPONDA	\$673.27 (0.10%)	
	SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	\$0.00 (0.00%)	
	FISCALIZACION DEL H. CONGRESO DEL ESTADO	\$1,346.53 (0.20%)	
	INSPECCION DE VIGILANCIA PARA LA CONTRALORIA	\$3,366.33 (0.50%)	
	SERVICIOS RELATIVOS A LAS CONSTRUCCIONES	\$0.00	
Avance Físico Real %		\$6,732.66	
Avance Físico Programado %			
Fecha Terminación Prog.			
		TOTAL DE RETENCIONES (-)	\$6,732.66
		SANCION POR RETRASO (-)	\$0.00
		SUBTOTAL MENOS RETENCIONES	\$383,762.07
		RETENCION POR RETRASO(-)	\$0.00
		REINTEGRO POR RETENCION	\$0.00
		OTRAS SANCIONES(-)	\$0.00
		TOTAL A PAGAR	\$383,762.07
TRESIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 7/100 M.N.			

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 2022

ESTADO DE CUENTA

Obra.	FISDMF 024/2022 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE 12 DE DICIEMBRE ENTRE LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	Total Contrato	1,087,369.66
Localizacion	COLONIA 28 DE ABRIL EN CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO	Total Ampliaciones	38,273.69
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura So	Total Contratado	1,125,643.35
Programa	SF PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES	Anticipo (50)%	543,684.83
SubPrograma	01 CONCRETO	Estimado Anterior	649,172.13
Contratista	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE 12 DE DICIEMBRE ENTRE LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	Esta Estimacion	390,494.73
Contrato	FISDMF007-020-024/2022 24	Total Estimado	1,039,666.86
Estimacion No.	2 Del 11 Sep 2022 al 24 Sep 2022	Total por Estimar	85,976.49

No. Estimac.	Período	Importe Estimacion	Amortizacion de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA (+)	Cargo a la Obra	DEDUCCIONES (-)						Retencion (-)	Reintegro (+)	Sanciones (-)	Importe a Pagar
							CMIC(0)	Caio.Prof.(0)	SFP(0.5)	Cong. Edo.(0.2)	Municipal	ISRuOtro(0)				
Anticipo				468,693.82	74,991.01	543,684.83										543,684.83
1	Del 01 Ago 2022 al 10 Sep	181,874.66	90,937.33	377,756.49	14,549.97	105,487.30	363.75	181.87	0.00	363.75	909.37	0.00	0.00	0.00	0.00	103,668.56
2	Del 11 Sep 2022 al 24 Sep 2022	673,266.78	336,633.39	41,123.10	53,861.34	390,494.73	1,346.53	673.27	0.00	1,346.53	3,366.33	0.00	0.00	0.00	0.00	383,762.07
TOTALES		855,141.44	427,570.72		143,402.32	1,039,666.86	1,710.28	855.14	0.00	1,710.28	4,275.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031,115.46

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 2022
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL



RESUMEN DE ESTIMACION

Obra. Localizacion Fuente Financ. Programa SubPrograma Supervisor Contratista Contrato Estimacion No. Recibí de	FIS MDF 024/2022 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE 12 DE DICIEMBRE ENTRE LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA 28 DE ABRIL EN CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal. SF PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES 01 CONCRETO FERNANDO LUNA MEDINA (LUMF740415) PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. (653) FIS MDF 007-020-024/2022 24 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE 12 DE DICIEMBRE ENTRE LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 2 MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO la Cantidad de:	Total Contrato \$1,087,369.66 Total Ampliaciones \$38,273.69 Total Contratado \$1,125,643.35 Anticipo (50)% \$543,684.83 Estimado Anterior \$649,172.13 Esta Estimacion \$390,494.73 Total Estimado \$1,039,666.86 Saldo por Estimar \$85,976.49
Recibí de MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO la Cantidad de:		\$390,494.73 TRESCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N.

GRUPO PARTIDA

* REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE 12 DE DICIEMBRE ENTRE LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE
 - PAVIMENTO

Fecha Terminación Prog.

	SUMA	\$673,266.78
AJUSTE DE COSTOS (+)	\$0.00	
AMORTIZACION DE ANTICIPO (-)	\$336,633.39	
SUBTOTAL	\$336,633.39	
IVA (+)	\$53,861.34	
SUBTOTAL CON IVA	\$390,494.73	

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 2022

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A.
 DE C.V. (PCJ150422SA7)
 Contratista

T.C. FERNANDO LUNA MEDINA (LUMF740415)
 SUPERVISOR

CONCEPTOS DE ESTIMACION

Normal



Obra.	FISMDF 024/2022 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE 12 DE DICIEMBRE ENTRE LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE				Total Contrato	\$1,087,369.66
Localizacion	COLONIA 28 DE ABRIL EN CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO				Total Ampliaciones	\$38,273.69
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal.				Total Contratado	\$1,125,643.35
Programa	SF PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES				Anticipo (50)%	\$543,684.83
SubPrograma	01 CONCRETO				Estimado Anterior	\$649,172.13
Supervisor	FERNANDO LUNA MEDINA (LUMF740415)				Esta Estimacion	\$390,494.73
Contratista	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. (653)				Total Estimado	\$1,039,666.86
Contrato	FISMDF007-020-024/2022 24 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE 12 DE DICIEMBRE ENTRE LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE				Saldo por Estimar	\$85,976.49
Estimacion No.	2 Del 11 Sep 2022 al 24 Sep 2022					
Recibí de	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO la Cantidad de: \$390,494.73 TRESCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N.					

No.	Concepto	Unid. Med.	Volumen					Precio Contratado	Importe
			Contratado	Acumulado	Anterior	Actual	Excedente		

GRUPO: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE 12 DE DICIEMBRE ENTRE LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN COLONIA 28 DE ABRIL EN CABECERA									
PARTIDA: PAVIMENTO									
9	PAVIMENTO HIDRÁULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-38 KG/CM2, T.M.A. 1 1/2" RR 7 DÍAS, GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 6 A 8 CMS. FRAGUADO NORMAL, DE 15 CMS. DE ESPESOR, INC: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, REGLEADO, ACABADO RAYADO CON CEPILLO DE CERDAS DE ALUMINIO, CON DOBLADOR, CORTE CON DISCO, CALAFATEO CON BACK ROAD (COLA DE RATA), SELLADOR ELASTOMERICO, JUNTAS CONSTRUCTIVAS CON CELOTEX DE 1/2", CURADO CON MEMBRANA QUIMICA BASE AGUA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, DE ACUERDO A PROYECTO.	M2	1,062.44	1,147.34	0.00	1,147.34	84.90	\$578.43	\$663,656.98
11	CONSTRUCCION DE DENTELLON DE 15x30 cm DE CONCRETO HECHO EN OBRA Fc=250 Kg/cm2 TMA 38 mm. INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, ALINEADO, NIVELADO, DESCIMBRADO, CURADO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS.	m	44.00	36.51	0.00	36.51	\$263.21	\$9,609.80	
								Total Partida	\$673,266.78
								Total Grupo	\$673,266.78
								Total Presupuestado	\$673,266.78
								Ajuste de Costos	\$0.00
								Total	\$673,266.78

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 2022

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. (PCJ150422SA7)
 CONTRATISTA

T.C. FERNANDO LUNA MEDINA (LUMF740415)
 SUPERVISOR



FECHA 27 de septiembre de 2022

NOMBRE DE LA OBRA : REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION CALLE 12 DE DICIEMBRE LOCALIDAD: COL. 28 DE ABRIL, SAN FRANCISCO DE LOS RC
 No. DE CONTRATO Y OBRA : FISMDF 009-020-024/2022 FISMDF 024/22
 IMPORTE DE CONTRATO : \$1,087,369.66 (UN MILLON OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 66/100 M.N.)
 FECHA DE INICIO REAL : 1 de agosto de 2022
 FECHA DE INICIO VIGENTE (REPROGRAMACION SEGÚN ANTICIPO): 27 de julio de 2022
 PLAZO DEL CONTRATO : 60 (SESENTA) DIAS CALENDARIO
 FECHA DE TERMINO VIGENTE : 25 de septiembre de 2022 FECHA DE TERMINO REAL : 29 de septiembre de 2022

No. DE ESTIMACION : 2 (DOS)
 PERIODO DEL : 11.sep.22 AL 24.sep.22
 AVANCE FISICO 90%
 AVANCE FINANCIERO 96%

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN			PU.	IMPORTE
			CONTRATADO	EXCEDENTE	EJECUTADO		
	PAVIMENTO						
9.-	PAVIMENTO HIDRÁULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-38 KG/CM2, T.M.A. 1 1/2" RR 7 DÍAS, GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 6 A 8 CMS. FRAGUADO NORMAL, DE 15 CMS. DE ESPESOR, INC: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, REGLEADO, ACABADO RAYADO CON CEPILLO DE CERDAS DE ALUMINIO, CON DOBLADOR, CORTE CON DISCO, CALAFATEO CON BACK ROAD (COLA DE RATA), SELLADOR ELASTOMERICO, JUNTAS CONSTRUCTIVAS CON CELOTEX DE 1/2", CURADO CON MEMBRANA QUIMICA BASE AGUA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. DE ACUERDO A PROYECTO.	M2	1,149.80	0.00	1,147.34	\$ 578.43	\$ 663,656.98
11.-	CONSTRUCCION DE DENTELLON DE 15x30 cm DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=250 Kg/cm2 TMA 38 mm. INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, ALINEADO, NIVELADO, DESCIMBRADO, CURADO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS.	M	50.11	0.00	36.51	\$ 263.21	\$ 9,609.80

SUB-TOTAL \$ 673,266.78
 ANTICIPO 50% \$ 336,633.39
 TOTAL \$ 336,633.39

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
2022
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

T.C. FERNANDO LUNA MEDINA
Residente de Obra

Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo

ARO ALFREDO FLORES MARMOLEJO
Jefe Departamento de Supervisión



NO. DE OBRA:	FISMDF 024/22
NO. DE CONTRATO:	FISMDF 009-020-024/2022
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION CALLE 12 DE DICIEMBRE ENTRE LA
UBICACIÓN:	COL. 28 DE ABRIL, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.

NUMEROS GENERADORES


E S T I M A C I O N N o. 1

CROQUIS


DESCRIPCION DE CONCEPTO

PAVIMENTO HIDRÁULICO A BASE DE CONCRETO Premezclado MR-38 KG/CM2, T.M.A. 1 1/2" RR 7 DÍAS, GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 6 A 8 CMS. FRAGUADO NORMAL, DE 15 CMS. DE ESPESOR, INC: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, REGLEADO, ACABADO RAYADO CON CEPILLO DE CERDAS DE ALUMINIO, CON DOBLADOR, CORTE CON DISCO, CALAFATEO CON BACK ROAD (COLA DE

16 DE SEPTIEMBRE

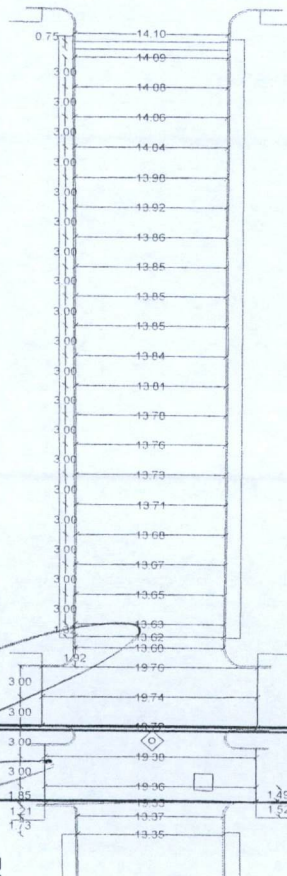

C. 12 DE DICIEMBRE



**MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
2022
**OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL**

C. 15 DE SEPTIEMBRE

OBSERVACIONES :

SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTE
NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA

RESIDENTE DE OBRA
Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
T.C. FERNANDO LUNA MEDINA

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.



2021 • 2024
AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO


NO. DE OBRA:	FISMDF 024/22
NO. DE CONTRATO:	FISMDF 009-020-024/2022
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION CALLE 12 DE DICIEMBRE ENTRE LA
UBICACIÓN:	COL. 28 DE ABRIL. SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.

NUMEROS GENERADORES

ESTIMACION No. 1

FOTOGRAFIA

DESCRIPCION DE CONCEPTO
 PAVIMENTO HIDRÁULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-38 KG/CM2, T.M.A. 1 1/2" RR 7 DÍAS, GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 6 A 8 CMS. FRAGUADO NORMAL, DE 15 CMS. DE ESPESOR, INC: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, REGLEADO, ACABADO RAYADO CON CEPILLO DE CERDAS DE ALUMINIO, CON DOBLADOR, CORTE CON DISCO, CALAFATEO CON BACK ROAD (COLA DE

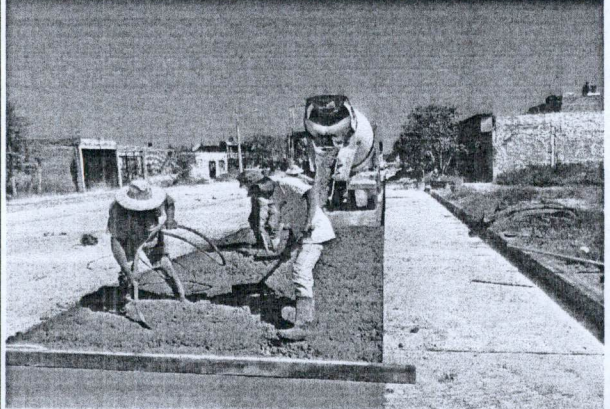

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 2022

OBSERVACIONES :

SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTE
NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA

RESIDENTE DE OBRA
 Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
T.C. FERNANDO LUNA MEDINA

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.



NO. DE OBRA: FIS MDF 024/22
 NO. DE CONTRATO: FIS MDF 009-020-024/2022
 DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION CALLE 12 DE DICIEMBRE ENTRE LA
 UBICACIÓN: COL. 28 DE ABRIL, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.

NUMEROS GENERADORES

E S T I M A C I O N No. 1

No.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	TOTAL	CROQUIS	FOTOGRAFIA
			EJE	TRAMO	TIPO								
11.-	CONSTRUCCION DE DENTELLON DE 15x30 cm DE CONCRETO HECHO EN OBRA Fc=250 Kg/cm2 TMA 38 mm. INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, ALINEADO, NIVELADO, DESCIMBRADO, CURADO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS.	M				5.85				5.85		ANEXO	
						5.95				5.95			
						13.35				13.35			
						5.30				5.30			
						6.06				6.06			
TOTAL											36.51		

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 2022

OBSERVACIONES:

SUPERINTENDENTE DE OBRA
 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN A
 NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA

RESIDENTE DE OBRA
 Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
 T.C. FERNANDO LUNA MEDINA



NO. DE OBRA:	FISMDF 024/22
NO. DE CONTRATO:	FISMDF 009-020-024/2022
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION CALLE 12 DE DICIEMBRE ENTRE LA
UBICACIÓN:	COL. 28 DE ABRIL, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.



NUMEROS GENERADORES

E S T I M A C I O N No. 1

CROQUIS

DESCRIPCION DE CONCEPTO

CONSTRUCCION DE DENTELON DE 15x30 cm DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=250 Kg/cm2 TMA 38 mm. INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, ALINEADO, NIVELADO, DESCIMBRADO, CURADO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS.

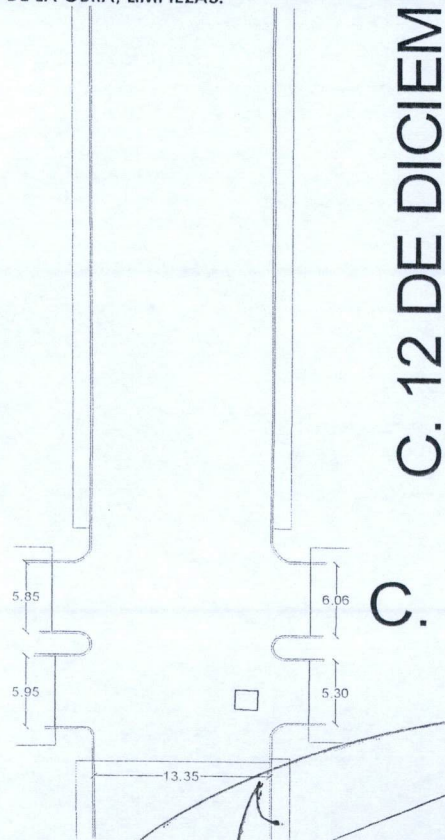

**MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL
2022

OBSERVACIONES :

SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTES
NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA

RESIDENTE DE OBRA
Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
T.C. FERNANDO LUNA MEDINA

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA
PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.



Ayuntamiento de
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
2021 • 2026

NO. DE OBRA:	FISMDF 024/22
NO. DE CONTRATO:	FISMDF 009-020-024/2022
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION CALLE 12 DE DICIEMBRE ENTRE LA
UBICACIÓN:	COL. 28 DE ABRIL, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.

NUMEROS GENERADORES

E S T I M A C I O N N o 1

FOTOGRAFIA

DESCRIPCION DE CONCEPTO

CONSTRUCCION DE DENTELLON DE 15x30 cm DE CONCRETO HECHO EN OBRA F_c=250 Kg/cm² TMA 38 mm. INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, ALINEADO, NIVELADO, DESCIMBRADO, CURADO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS.



OBSERVACIONES :

SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTE
NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA

OPERADO
PARA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL
MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
2022

RESIDENTE DE OBRA
Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo
T.C. FERNANDO LUNA MEDINA

BITÁCORA DE OBRA

HOJA _____

CONTRATO FISMDF 007-020-024/2022

OBRA FISMDF 024/2022

29/SEP/2022

Con fecha de hoy esta supervisión autoriza la estimación número 2 (dos) de la obra FISMDF 024/2022 de la empresa Proyerlos y construcciones JE de la Peña en Aguascalientes, dicha estimación del contrato de esta obra, bajo las siguientes características.

- Periodo del 11 al 24 de septiembre 2022
- Entrega de generadoras 27 de Septiembre 2022
- Monto base \$ 673,266.78
- Amortización de anticipo \$ 336,633.39
- Total retenciones \$ 6,732.66
- Total a pagar \$ 383,762.07

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
2022
OBRA SOCIAL MUNICIPAL

USO DE BITÁCORA
