



Usr: SUSANA
Rep: rptPoliza

Municipio de San Francisco de los Romo
ESTADO DE AGUASCALIENTES

Póliza: C04129 Del 27/10/2022



Fecha y hora de Impresión | 27/oct./2022 02:17 p. m.
Página | 1

Concepto: FISM 2022 PAGADO EST 1 OBRA FIS MDF 025-2022 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE JOSEFA OR. GP Folio: 292

Beneficiario: **HECTOR HUGO MEDRANO LECHUGA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-2501-K033-J04-61401-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$304,133.56		GP Folio: 292
0002	8260-2501-K033-J04-61401-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y		\$304,133.56	GP Folio: 292
0003	1112-003-002	Bancomer Cta. 011793039-9 FISM		\$149,444.94	GP Folio: 292
0004	1134-003-011	HECTOR HUGO MEDRANO		\$152,066.78	FISM 2022 PAGADO EST 1 OBRA FIS MDF 025-2022
0005	2117-9-005-001	0.1% COLEGIO DE		\$262.18	FISM 2022 PAGADO EST 1 OBRA FIS MDF 025-2022
0006	2117-9-005-002	0.2% ORGANO SUPERIOR DE		\$524.37	FISM 2022 PAGADO EST 1 OBRA FIS MDF 025-2022
0007	2117-9-005-003	0.2% INST. DE CAPACIT. DE LA		\$524.37	FISM 2022 PAGADO EST 1 OBRA FIS MDF 025-2022
0008	2117-9-005-004	0.5% CONTRALORIA MUNICIPAL		\$1,310.92	FISM 2022 PAGADO EST 1 OBRA FIS MDF 025-2022
0009	2113-000712	HECTOR HUGO MEDRANO	\$304,133.56		GP Folio: 292
Sumas iguales =>			<u>608,267.12</u>	<u>608,267.12</u>	

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
2022
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

HECTOR HUGO MEDRANO LECHUGA
R.F.C. MELH820523DS8
PRIVADA GEISER 11
CENTRO
98817
LOCALIDAD BIMBALETES LORETO ZACATECAS

RP - 10

CFDI versión 3.3 Complemento de Recepción de Pagos
Tipo de comprobante: P - Pagos
Expedido en el código postal: 98817
Uso de CFDI: P01 - Por definir

Cliente: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
R.F.C.: MSF920130TQ9
Domicilio: Aguascalientes Aguascalientes México C.P. Tel.

#	Cantidad	Unidad	ClaveProdServ	Descripción	Descuento	Precio	Importe
1	1	ACT	84111506	Pago	0.00	0.00	0.00

Complemento de Recepción de Pagos

Fecha de Pago: 2022-10-27 T 12:00:00
Moneda:MXN
Forma de Pago:03 - Transferencia electrónica de fondos
Tipo de Cambio \$:1.0000
Monto Total del Pago \$:149,444.94
Número de Operación:271022

#	UUID	Folio	Moneda	Tipo Cambio	M. de Pago	Parcialidad	Saldo Ant.	Saldo Nuevo	Pago
1	d0544cc7-f5bf-4f54-9e40-d6beccd675d1	A - 236	MXN	1.0000	PPD	2	183553.65	34108.71	149444.94

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
2022
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.
PAGADO
FINANZAS

CANTIDAD CON LETRA:
CERO PESOS 00/100 M.N.

TOTAL \$ 0.00

MONEDA: XXX

TIPO DE CAMBIO: N/A

CERTIFICADO EMISOR: 00001000000505918522

CERTIFICADO S.A.T.: 00001000000509846663

FECHA Y HORA DE TIMBRADO: 2022-11-23 08:21:09

FOLIO FISCAL: b0a230cd-4df5-4667-bb3b-f1a76478539b



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[|1.1|b0a230cd-4df5-4667-bb3b-f1a76478539b|2022-11-23T08:21:09|LSO1306189R5JD9o5AxxOq9NJ73DdKlbfOHMBKeLP8YefwbbYVTLp4QFI+IQuN+Xu2bepC2POxgfm7WzQnznHYRw7Rhra/cUbxqk91xG+rHOQsqMYZr+C6ZvJLWgpLdobPpiyfrTsqPlhaz9K48baSjn32uYtLLCmlHgywW9J7LuMjx/uUv1eUL12IXzmVKhVa8KzyMd+NfoO5y9yx0VKCHdGcv2FxsPO7vSbnnN/NwGhfpOk0eGkthYfOd5hF11RvDCQpXfKkKucFcdDoeAtjAh5Wxnsaj7zYIopnyzsBV6Srm9+xGIQwiyRFEEN3mNkgvlzCuva4DmYoMbym86ejgeRCgO0dA==|00001000000509846663|]

Sello Digital

D9o5AxxOq9NJ73DdKlbfOHMBKeLP8YefwbbYVTLp4QFI+IQuN+Xu2bepC2POxgfm7WzQnznHYRw7Rhra/cUbxqk91xG+rHOQsqMYZr+C6ZvJLWgpLdobPpiyfrTsqPlhaz9K48baSjn32uYtLLCmlHgywW9J7LuMjx/uUv1eUL12IXzmVKhVa8KzyMd+NfoO5y9yx0VKCHdGcv2FxsPO7vSbnnN/NwGhfpOk0eGkthYfOd5hF11RvDCQpXfKkKucFcdDoeAtjAh5Wxnsaj7zYIopnyzsBV6Srm9+xGIQwiyRFEEN3mNkgvlzCuva4DmYoMbym86ejgeRCgO0dA==

Sello Digital del SAT

A9WA17sxqUKbrZzPaK3QYezWzLexe4PpMbVfviJBBnouA6Z6SK+x8o9IveAqeTjdsGdnX5F+TnYPpIFIH/XdST2vkHuri08tQYCRIBu5Y1F+Sjwu9IXfoGruUfYfKcOmJ1BYSxbqEcrwNnCe+BYV2pg5LHKOH7VPQ+bSjh6V+uu7O68zJKCanAAcQe+eKh96YrWJx92QSTOeGJ+xBdo6YUyhbPr8fXjGdFime8CPIN9g2XJKmg9Zj04Y2TEpw2bUv9fADP2gGz8o4smsJdlZ9PAZmdmjF4fPr3OZc97GcdApA65bT3PmlvmXPT1+/1Zpa6f8uokMnYzWQ0ag==



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MELH820523DS8	HECTOR HUGO MEDRANO LECHUGA	MSF920130TQ9	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B0A230CD-4DF5-4667-BB3B-F1A76478539B	2022-11-23T08:21:07	2022-11-23T08:21:09	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$0.00	Pago	Vigente	Cancelable sin aceptación

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

2022

Imprimir

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL



Fecha y hora de consulta

27/10/2022 11:49:22 AM

Contrato

00796395

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO
DE LOS ROMO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: PAGO EST 1 025

Importe de la operación: 149,444.94 MXP

Cuenta de retiro: 0117930399

Cuenta de depósito: 072939008273596280

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE SAN FRA
NCISCO DE LOS ROMOTitular de la cuenta: HECTOR HUGO MEDRANO
LECHUGA

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha de creación: 27/10/2022

Fecha de aplicación: 27/10/2022

Concepto de pago: PAGO ESTIMACION 1 OBRA 11-
025

Referencia numérica: 271022

Instrumento de seguridad: ASD 6550927860

Hora de captura en el canal: 11:49:06

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000131286

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Clave de rastreo: 002601002210270000131286

Folio de firma: 0028797060

--- 2022

Folio único: 1401202210271149060028797066

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	27/10/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	27/10/2022

Dirección de
OBRAS PÚBLICAS



Ayuntamiento de
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

2021 • 2024



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
No. Oficio: DOP/456/22
San Francisco de los Romo, Ags., 26 de octubre de 2022
Asunto: LIBERACIÓN DE PAGO

1916

C.P. MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
PRESENTE

Por medio del presente le remito la documentación de la estimación No. 1 para que se realicen los trámites necesarios para su pago.

No. de Obra: FIS MDF 025/2022

Nombre de la Obra: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y PRIVADA JAIME NUNO

Programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2022

Contratista: ING. HECTOR HUGO MEDRANO LECHUGA

Contrato: FIS MDF 025/2022

Objeto del Contrato: GUARNICIONES Y BANQUETAS

Monto del Contrato: \$383,692.53 (TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 53/100 M.N.)

Monto a Pagar: \$149,444.94 (CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 94/100 M.N.)

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
2022
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

No Factura: A-236

Sin otro particular de momento, me es grato enviarle un cordial saludo agradeciendo de antemano las atenciones al presente.

ATENTAMENTE

ING. JOSE DE JESUS CHAVEZ GARCIA
DIRECTOR DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

C.c.p. Archivo

Av. Benito Juárez S/N, Rancho La Trinidad,
San Francisco de los Romo, Ags. Tel: (465) 967 0124 ext. 1654

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

CÉDULA DE SEGUIMIENTO A ESTIMACIONES DE OBRA

Ayuntamiento de
**SAN FRANCISCO
DE LOS ROMO**
2021 • 2024



DATOS GENERALES

CONTRATISTA: <u>HECTOR HUGO MIEDRANO IECHUGA</u>		Nº DE CONTRATO: <u>FISMDF 025/2022</u>
SUPERVISOR: <u>J. JESUS HERNANDEZ FUENTES</u>		Nº DE OBRA: <u>FISMDF 025/2022</u>
OBRA: <u>CONST. DE GUARDACIONES Y BANQUETAS CARRIL JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRONZA Y PEU. JAIME NUNO.</u>		Nº DE FACTURA: <u>A-236</u>
FECHA DE CORTE: <u>DEL 15 SEPT AL 14 OCT. 2022</u>		Nº DE ESTIMACION: <u>NU 1</u>
		IMPORTE LIQUIDO: <u>149,444.94</u>

FORMATO DE NUMEROS GENERADORES

INGRESO	REVISIÓN	NOTA	CAPTURA EN SISTEMA	ENTREGA DE PRE-FACTURA
<i>[Firma]</i> 31 OCT 2022 CONTRATISTA	<i>[Firma]</i> 24 OCT. 2022 SUPERVISOR	Sr. contratista regrese esta cédula con la estimación original de lo contrario no se le dara tramite	<i>[Firma]</i> 24 OCT. 2022 SUPERVISOR	<i>[Firma]</i> 24 OCT. 2022 SUPERVISOR

FORMATO DE ESTIMACIÓN

INGRESO	REGISTRO	SUPERVISOR	JEFE DE DEPARTAMENTO
<i>[Firma]</i> 26 OCT. 22 CONTRATISTA	<i>[Firma]</i> 26/10/22 26/10/22 CONTROL DE ESTIMACIONES	<i>[Firma]</i> 26 OCT. 2022 26 OCT. 2022 RECIBIDO AUTORIZADO	<i>[Firma]</i> ARQ. ALFREDO FLORES MARMOLEJO 26/10/22 26/10/22 RECIBIDO AUTORIZADO

DEVOLUCION

FECHA DE DEVOLUCIÓN: 24/10/22
 FECHA DE REINGRESO: 26/10/22
 MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN: Finnes

CONTENIDO

CÁRATULA	/
RESUMEN	/
CONCEPTOS	/
ESTADO DE CUENTA	/
CONCENTRADO DE CONCEPTOS (FIN)	/
GENERADORES Y RESUMEN	/
CROQUIS	/
FOTOGRAFIAS	/
ANALISIS PRECIO UNITARIO	/
REPORTE(S) DE LABORATORIO	/
FIANZA(S) (FIN)	/
NOTA DE BITACORA DE OBRA	/

DIRECTOR GENERAL

[Firma]
ING. JOSÉ DE JESUS CHAVEZ GARCÍA
26/10/22 | 26/10/22
RECIBIDO | AUTORIZADO

FINANZAS

RECIBIDO | AUTORIZADO

TRAMITE DE PAGO

FECHA DE INICIO DE TRAMITE EN DOP-SFR			FIRMA DEL DIRECTOR			OFICIO DE LIBERACIÓN			FECHA DE ENTREGA		
17	10	22	26	10	22	26	10	22			
DÍA:	MES:	AÑO:	DÍA:	MES:	AÑO:	DÍA:	MES:	AÑO:	DIRECCIÓN DE EGRESOS.		

CONCEPTOS DE ESTIMACION

Normal



Obra.	FISMDF 025/2022 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE LA CALLE VENUSTIANO			Total Contrato	\$373,547.79
Localizacion	CARRANZA Y PRIVADA JAIME NUNO EJIDO AMAPOLAS DEL RIO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.			Total Ampliaciones	\$10,144.74
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal.			Total Contratado	\$383,692.53
Programa	SE URBANIZACIÓN			Anticipo (50)%	\$186,773.90
SubPrograma	03 GUARNICIONES Y BANQUETAS			Estimado Anterior	\$0.00
Supervisor	J. JESÚS HERNÁNDEZ FUENTES (HEFJ7112011W6)			Esta Estimacion	\$152,066.78
Contratista	HECTOR HUGO MEDRANO LECHUGA (609)			Total Estimado	\$338,840.68
Contrato	FISMDF 025/2022	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE LA		Saldo por Estimar	\$44,851.85
Estimacion No.	1	CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y PRIVADA JAIME NUNO Del 15 Sep 2022 al 14 Oct 2022			
Recibí de	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	la Cantidad de:	\$152,066.78 CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SESENTA Y SEIS PESOS 78/100 M.N.		

No.	Concepto	Unid. Med	Volumen					Precio Contratado	Importe
			Contratado	Acumulado	Anterior	Actual	Excedente		

GRUPO: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y PRIVADA JAIME NUNO EN

EJIDO AMAPOLAS DE


PARTIDA: GUARNICIONES Y BANQUETAS


1	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. INCLUYE: EQUIPO NECESARIO, PUENTE, SEÑALIZACION DEL BANCO Y PUNTOS QUE SE REQUIERAN EN LA NIVELACION CON PINTURA, RENIVELACIONES NECESARIAS, LIMPIEZAS.	M2	342.02	364.91	0.00	364.91	22.89	\$6.58	\$2,401.11
2	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II 0.00 A 2.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUDES, TRASPALOS, ACARREOS A MAQUINA O A MANO HASTA PRIMERA ESTACIÓN 20 MTS, MEDIDO COMPACTO, COMPACTACIÓN DE LA BASE POR MEDIOS MECÁNICOS, TRABAJO TERMINADO.	M3	102.61	17.16	0.00	17.16		\$447.08	\$7,671.89
3	CARGA MECÁNICA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE ESCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO AL 1er. KM, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3	102.61	17.16	0.00	17.16		\$36.07	\$618.96
5	RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% DE SU PVS M CON BAILARINA EN CAPAS DE HASTA 20 cm. DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINISTRO DE TEPETATE, AGUA LE NECESARIA, MEDIDO COMPACTO, SELECCIÓN DEL MATERIAL, TENIDO, PAPEADO DE MATERIAL, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS.	M3	84.48	109.23	0.00	109.23	24.75	\$379.72	\$41,476.82
6	GUARNICIÓN DE 15X20X40 CM DE CONCRETO PREMEZCLADO F' C=150 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA Y DESCIBRADO, TRABAJO TERMINADO	m	287.10	261.90	0.00	261.90		\$300.34	\$78,659.05
7	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO, T.M.A. 3/4", GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 10+2 CM ACABADO RAYADO FINO CON BROCHA DE PELO, JUNTAS FRIAS CON DOBLADOR DE 2", SECCION DE LOSAS DE ACUERDO ALA EXISTENTE, INCLUYE: COLADO, CURADO CON MEMBRANA A BASE DE AGUA Y TRABAJO TERMINADO SEGUN FICHA TECNICA FT-200.	M2	342.02	322.10	0.00	322.10		\$393.90	\$126,875.19
8	LIMPIEZA FINAL INCLUYE: BARRIDO CON AGUA, MATERIALES, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO.	M2	342.02	364.91	0.00	364.91	22.89	\$12.28	\$4,481.09

Total Partida \$262,184.11

Total Grupo \$262,184.11

OPERADO
PARA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL
MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
2022


 HECTOR HUGO MEDRANO LECHUGA (MELH820523DS8)
 CONTRATISTA


 INGENIERO J. JESÚS HERNÁNDEZ FUENTES
 (HEFJ7112011W6)
 SUPERVISOR DE OBRA

No.	Concepto	Unid. Med	Volumen					Precio Contratado	Importe
			Contratado	Acumulado	Anterior	Actual	Excedente		
								Total Presupuestado	\$262,184.11
								Ajuste de Costos	\$0.00
								Total	\$262,184.11

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

OPERADO
2022
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

HECTOR HUGO MEDRANO LECHUGA (MELH820523DS8)

CONTRATISTA


INGENIERO J. JESÚS HERNÁNDEZ FUENTES
 (HEFJ7112011W6)
 SUPERVISOR DE OBRA


RESUMEN DE ESTIMACION

Obra.	FISMDF 025/2022 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE LA CALLE VENUSTIANO	Total Contrato	\$373,547.79
Localizacion	CARRANZA Y PRIVADA JAIME NUNO CARRANZA Y PRIVADA JAIME NUNO EJIDO AMAPOLAS DEL RIO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.	Total Ampliaciones	\$10,144.74
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal.	Total Contratado	\$383,692.53
Programa	SE URBANIZACIÓN	Anticipo (50)%	\$186,773.90
SubPrograma	03 GUARNICIONES Y BANQUETAS	Estimado Anterior	\$0.00
Supervisor	J. JESÚS HERNÁNDEZ FUENTES (HEFJ7112011W6)	Esta Estimacion	\$152,066.78
Contratista	HECTOR HUGO MEDRANO LECHUGA (609)	Total Estimado	\$338,840.68
Contrato	FISMDF 025/2022 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE	Saldo por Estimar	\$44,851.85
Estimacion No.	1 LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y PRIVADA JAIME NUNO		
Recibí de	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	la Cantidad de:	\$152,066.78 CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SESENTA Y SEIS PESOS 78/100 M.N.

<u>GRUPO</u>	<u>PARTIDA</u>		
	* CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE LA CALLE VEN		\$262,184.11
	- GUARNICIONES Y BANQUETAS		\$262,184.11
Fecha Terminación Prog.		SUMA	\$262,184.11
		AJUSTE DE COSTOS (+)	\$0.00
		AMORTIZACION DE ANTICIPO (-)	\$131,092.06
		SUBTOTAL	\$131,092.05
		IVA (+)	\$20,974.73
		SUBTOTAL CON IVA	\$152,066.78

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 2022


 HECTOR HUGO MEDRANO LECHUGA (MELH820523DS8)
 Contratista


 INGENIERO J. JESÚS HERNÁNDEZ FUENTES
 (HEFJ7112011W6)
 SUPERVISOR DE OBRA

ESTADO DE CUENTA

Obra.	FISMDF 025/2022 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y PRIVADA JAIME NUNO		Total Contrato	373,547.79
Localizacion	EJIDO AMAPOLAS DEL RÍO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.		Total Ampliaciones	10,144.74
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura So		Total Contratado	383,692.53
Programa	SE URBANIZACIÓN		Anticipo (50)%	186,773.90
SubPrograma	03 GUARNICIONES Y BANQUETAS		Estimado Anterior	0.00
Contratista	HECTOR HUGO MEDRANO LECHUGA (609)		Esta Estimacion	152,066.78
Contrato	FISMDF 025/2022	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE LA	Total Estimado	338,840.68
Estimacion No.	1	Del 15 Sep 2022 al 14 Oct 2022	Total por Estimar	44,851.85

No. Estimac.	Periodo	Importe Estimacion	Amortizacion de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA (+)	Cargo a la Obra	DEDUCCIONES (-)						Retencion (-)	Reintegro (+)	Sanciones (-)	Importe a Pagar
							CMIC(0)	Cojo.Prof.(0)	SFP(0.5)	Cona. Edo.(0.2)	Municipal	ISRuOtro(0)				
Anticipo				161,011.98	25,761.92	186,773.90										186,773.90
1	Del 15 Sep 2022 al 14 Oct	262,184.11	131,092.06	29,919.92	20,974.73	152,066.78	524.37	262.18	0.00	524.37	1,310.92	0.00	0.00	0.00	0.00	149,444.94
TOTALES		262,184.11	131,092.06		46,736.65	338,840.68	524.37	262.18	0.00	524.37	1,310.92	0.00	0.00	0.00	0.00	336,218.84

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 2022
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL



FECHA: _____

NOMBRE DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y PRIVADA JAIME NUNO EN EJIDO AMAPOLAS DEL RIO

No. DE CONTRATO Y OBRA : FISMDF 025/2022

IMPORTE DE CONTRATO : \$373,547.79

FECHA DE INICIO REAL : _____

FECHA DE INICIO VIGENTE (REPROGRAMACION SEGÚN ANTICIPO) : 15 DE SEPTIEMBRE 2022

PLAZO DEL CONTRATO : 30 (TREINTA) DÍAS CALENDARIO

FECHA DE TERMINO VIGENTE : _____ FECHA DE TERMINO REAL : _____

No. DE ESTIMACION : 01 (UNO)

PERIODO DEL : 15 SEPT. 2022 AL 14 OCTUBRE 2022

AVANCE FISICO : _____

AVANCE FINANCIERO : _____

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN				PU.	IMPORTE	
			CONTRATADO	ANTERIOR	ACTUAL	EXCEDENTE			ACUMULADO
1	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. INCLUYE: EQUIPO NECESARIO, PUENTE, SEÑALIZACION DEL BANCO Y PUNTOS QUE SE REQUIERAN EN LA NIVELACION CON PINTURA, RENOVACIONES	M2	342.02	0.00	364.91	22.89	364.91	\$ 6.58	\$ 2,401.08
2	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO II 0.00 A 2.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUDES, TRASPALOS, ACARREOS A MAQUINA O A MANO HASTA	M3	102.61	0.00	17.16	0.00	17.16	\$ 447.08	\$ 7,674.06
3	CARGA MECÁNICA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE ESCAVACION Y DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO AL 1er. KM, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3	102.61	0.00	17.16	0.00	17.16	\$ 36.07	\$ 619.14
4	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES AL TIRADERO OFICIAL AUTORIZADO MÁS	M3/KM	1,026.06	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 12.64	\$ -
5	RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM CON BAILARINA EN CAPAS DE HASTA 20 cm. DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINISTRO DE TEPETATE, AGUA LE NECESARIA, MEDIDO COMPACTO,	M3	84.48	0.00	109.23	24.75	109.23	\$ 379.72	\$ 41,477.19
6	GUARNICION DE 15X20X40 CM DE CONCRETO PREMEZCLADO F' C=150 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA Y DESCRIBADO, TRABAJO TERMINADO	M	287.10	0.00	261.90	0.00	261.90	\$ 300.34	\$ 78,659.05
7	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO, T.M.A. 3/4", GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 10+2 CM ACABADO RAYADO FINO CON BROCHA DE PELO, JUNTAS FRIAS CON DOBLADOR DE 2", SECCION DE LOSAS DE ACUERDO ALA EXISTENTE, INCLUYE: COLADO, CURADO CON MEMBRANA A BASE DE AGUA Y TRABAJO TERMINADO SEGUN FICHA TECNICA	M2	342.02	0.00	322.10	0.00	322.10	\$ 393.90	\$126,876.92
8	LIMPIEZA FINAL, INCLUYE: BARRIDO CON AGUA, MATERIALES, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO.	M2	342.02	0.00	364.91	22.89	364.91	\$ 12.28	\$ 4,481.05

SUB-TOTAL \$262,188.40
16% IVA \$ 41,950.16
TOTAL \$304,138.64

OBSERVACIONES:

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

2022

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

Contratista
FIRMA

ARG. ALFREDO FLORES MARMOLEJO
Jefe Departamento de Supervisión
FIRMA

Residente
Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo



NO. DE OBRA:	FISDMF 025/2022
NO. DE CONTRATO:	FISDMF 025/2022
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE JOSEFA ORTIZ E
UBICACIÓN:	AMAPOLAS DEL RIO

NUMEROS GENERADORES


ANEXO

E S T I M A C I O N N O. 1

CROQUIS

No.

1 DESCRIPCION CONCEPTO.
 LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. INCLUYE: EQUIPO NECESARIO, PUENTE, SEÑALIZACION DEL BANCO Y PUNTOS QUE SE REQUIERAN EN LA NIVELACION CON PINTURA, RENIVELACIONES NECESARIAS, LIMPIEZAS.

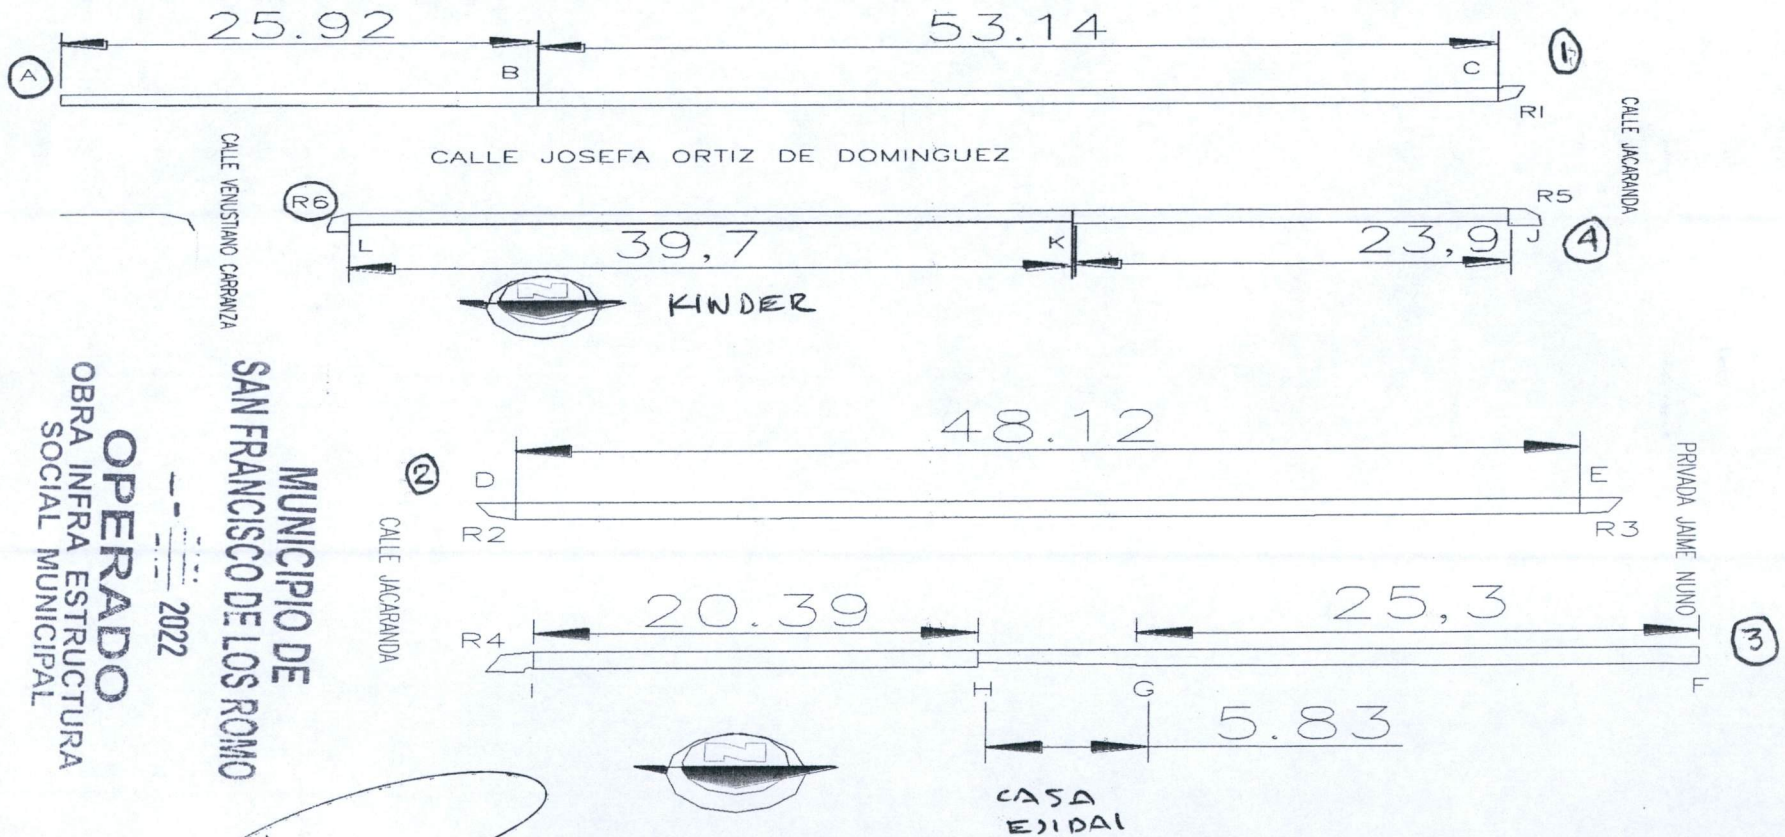

**MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
 OPERADO
 OBRA INFRA ESTRUCTURA
 SOCIAL MUNICIPAL
 2022

OBSERVACIONES:

SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)

RESIDENTE *[Signature]*
 Secretaria de Obras Públicas del Municipio de Aguascalientes
 I.C. J JESUS HERNANDEZ FUENTES

NO. DE OBRA:	FISMDF 025/2022
NO. DE CONTRATO:	FISMDF 025/2022
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE JOSEFA ORTIZ D
UBICACIÓN:	AMAPOLAS DEL RIO

NUMEROS GENERADORES



ANEXO

ESTIMACION NO. 1

FOTOGRAFIAS

No.

1 DESCRIPCION CONCEPTO.
LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. INCLUYE: EQUIPO NECESARIO, PUENTE, SEÑALIZACION DEL BANCO Y PUNTOS QUE SE REQUIERAN EN LA NIVELACION CON PINTURA, RENIVELACIONES NECESARIAS, LIMPIEZAS.

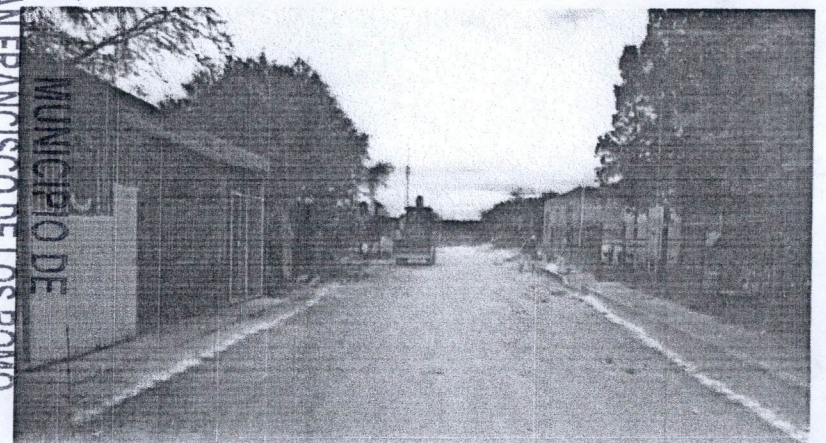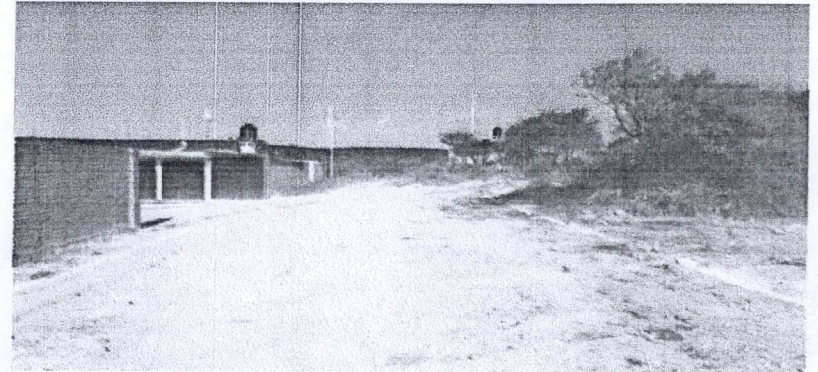

OBRA OPERADA
 INFRA ESTRUCTURA
 SOCIAL MUNICIPAL

MUNICIPIO DE
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

2022

OBSERVACIONES :

SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)

RESIDENTE
 Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Aguascalientes
 I.C. J JESUS HERNANDEZ FUENTES


NO. DE OBRA:	FISDMF 025/2022
NO. DE CONTRATO:	FISDMF 025/2022
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE JOSEFA ORTIZ C
UBICACIÓN:	AMAPOLAS DEL RIO

NUMEROS GENERADORES

ANEXO

ESTIMACION NO. 1

CROQUIS

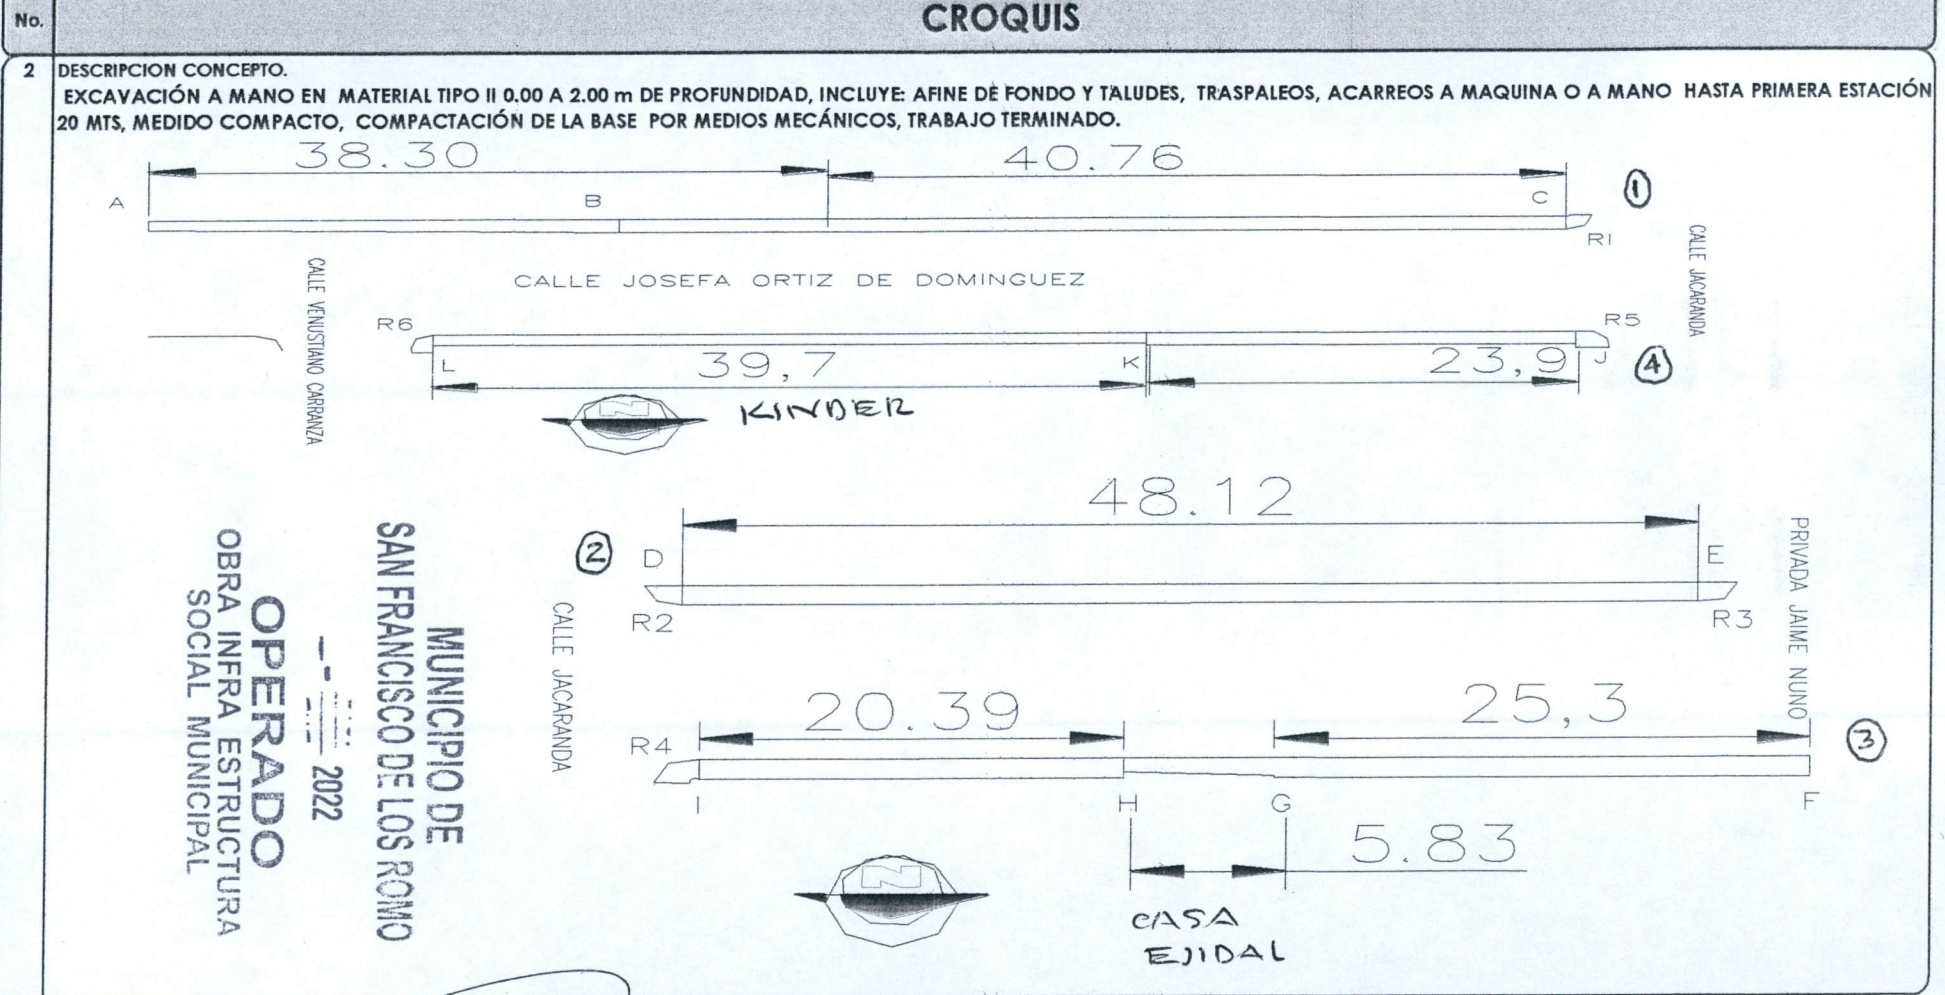

OBSERVACIONES:

SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)

RESIDENTE
Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Aguascalientes
I.C. J JESUS HERNANDEZ FUENTES

NO. DE OBRA:	FISMDF 025/2022
NO. DE CONTRATO:	FISMDF 025/2022
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE JOSEFA ORTIZ D
UBICACIÓN:	AMAPOLAS DEL RIO

NUMEROS GENERADORES

ANEXO

ESTIMACION NO. 1

FOTOGRAFIAS


No.	DESCRIPCION CONCEPTO.
2	<p>EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II 0.00 A 2.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUDES, TRASPALEOS, ACARREOS A MAQUINA O A MANO HASTA PRIMERA ESTACIÓN 20 MTS, MEDIDO COMPACTO, COMPACTACIÓN DE LA BASE POR MEDIOS MECÁNICOS, TRABAJO TERMINADO.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>

CIUDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÙBLICAS
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
2022

OBSERVACIONES :

SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)

RESIDENTE


Secretaria de Obras Pùblicas del Municipio de Aguascalientes
I.C. J JESUS HERNANDEZ FUENTES


NO. DE OBRA:	FISDMDF 025/2022
NO. DE CONTRATO:	FISDMDF 025/2022
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE JOSEFA ORTIZ C
UBICACIÓN:	AMAPOLAS DEL RIO

NUMEROS GENERADORES

ANEXO

ESTIMACION NO. 1

CROQUIS

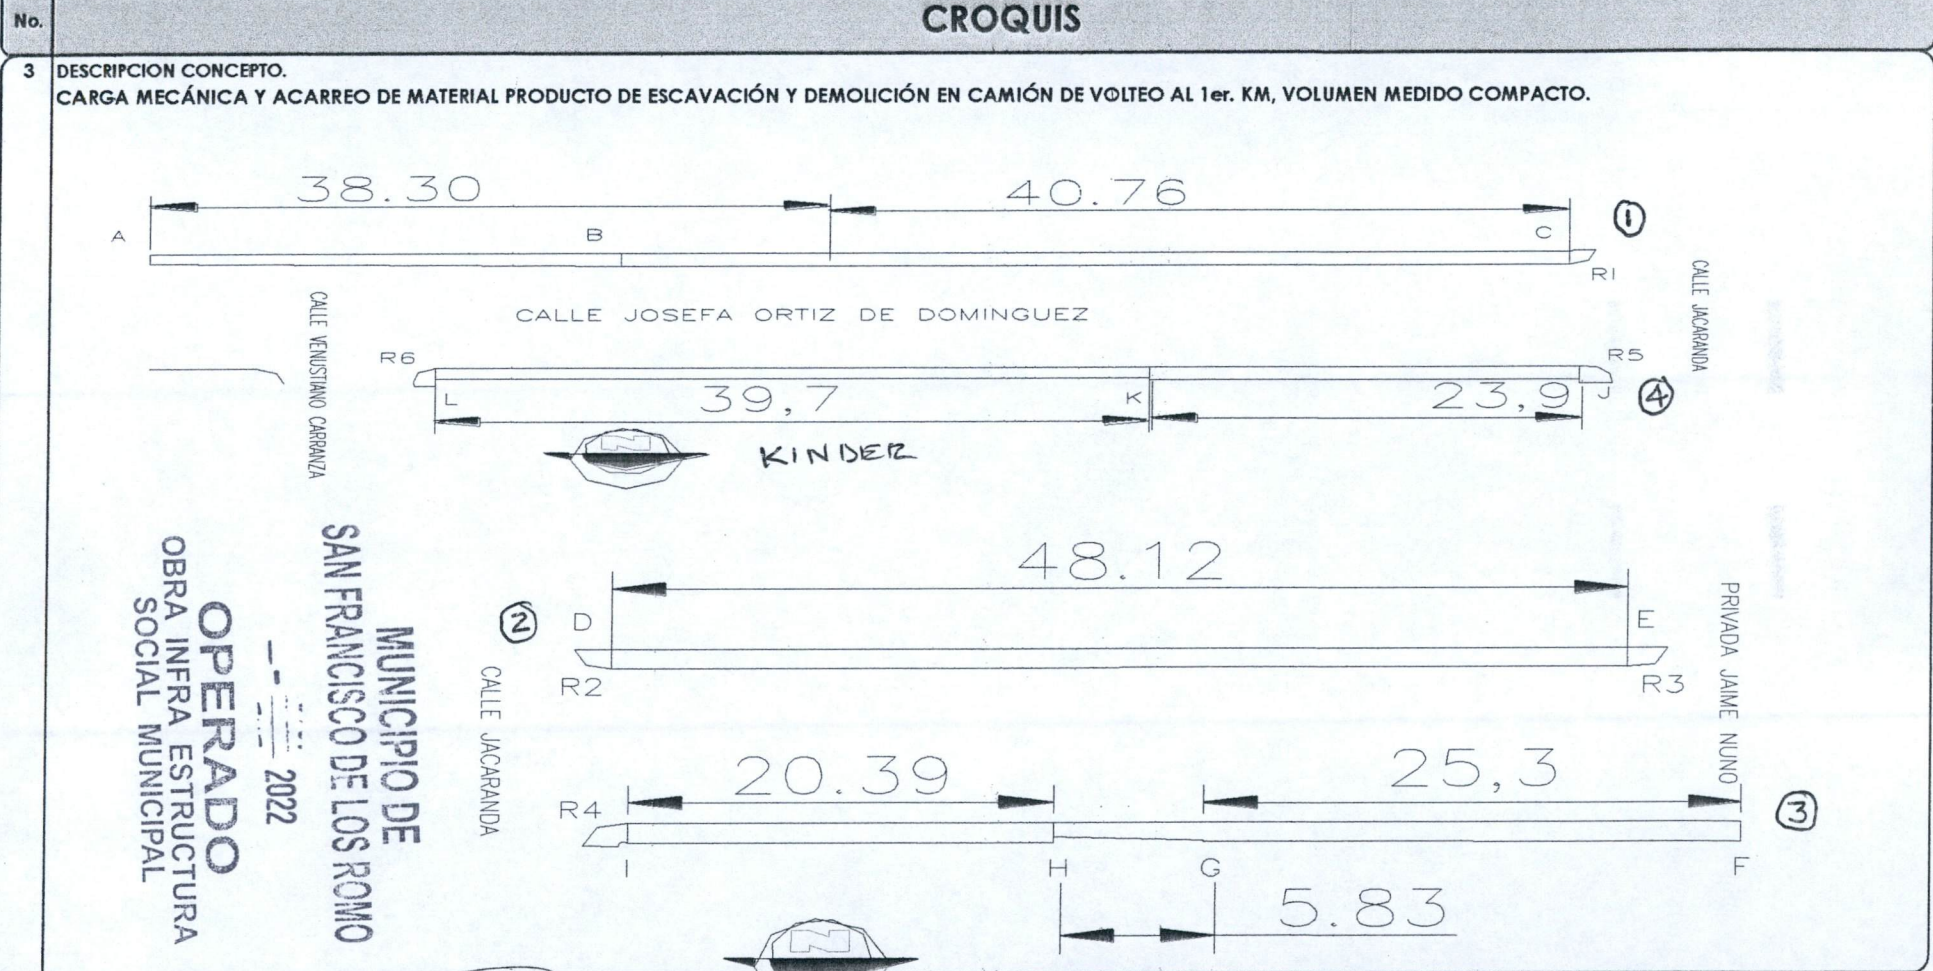

OBSERVACIONES:

SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)

RESIDENTE
Secretaría de Obras Publicas del Municipio de Aguascalientes
L.C. J JESUS HERNANDEZ FUENTES

NO. DE OBRA:	FISDMF 025/2022
NO. DE CONTRATO:	FISDMF 025/2022
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE JOSEFA ORTIZ D
UBICACIÓN:	AMAPOLAS DEL RIO

NUMEROS GENERADORES

ANEXO

E S T I M A C I O N N O . 1

FOTOGRAFIAS

No.

3 DESCRIPCION CONCEPTO.
CARGA MECÁNICA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE ESCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO AL 1er. KM, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.



OBSERVACIONES :

SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)

RESIDENTE

Jesus Hernandez Fuentes
Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Aguascalientes
I.C. J JESUS HERNANDEZ FUENTES


NUMEROS GENERADORES

ANEXO

NO. DE OBRA:	FISDMF 025/2022
NO. DE CONTRATO:	FISDMF 025/2022
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE JOSEFA ORTIZ C
UBICACIÓN:	AMAPOLAS DEL RIO

ESTIMACION NO. 1

CROQUIS

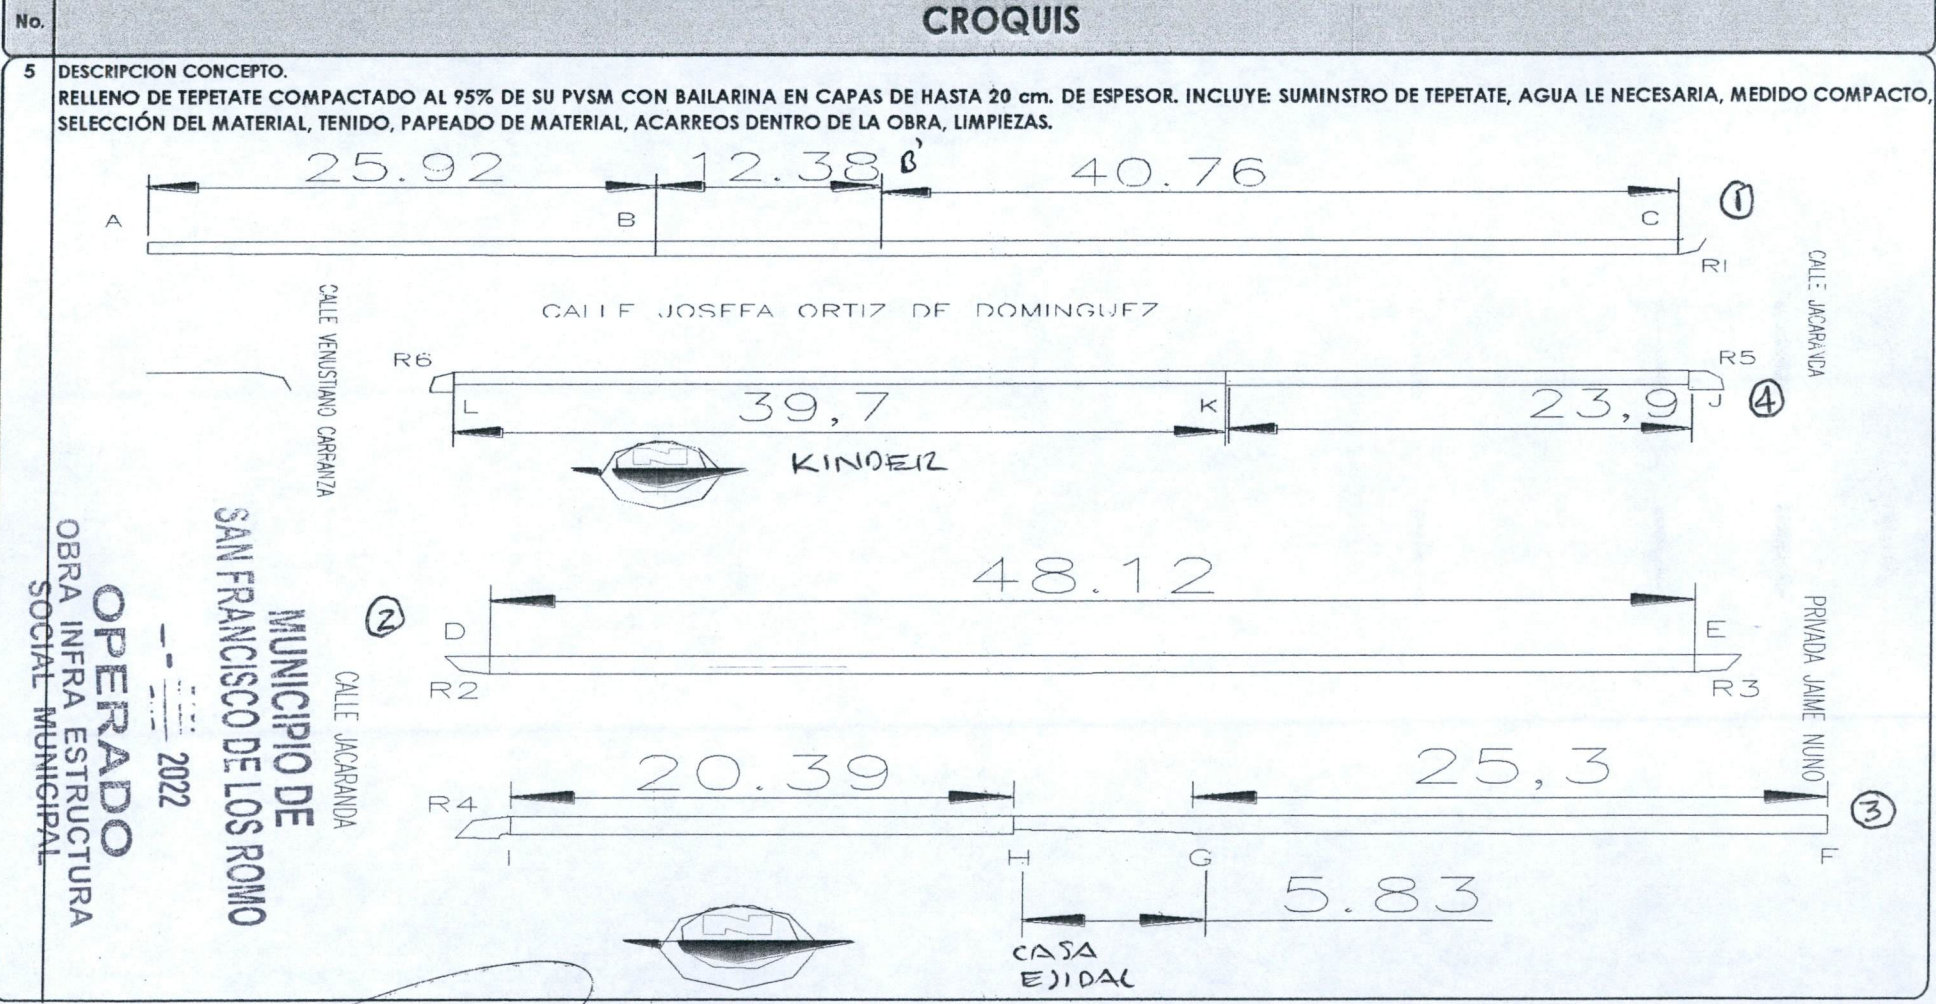

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

CALLE JACARANDA

2022

OBSERVACIONES:

SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)

RESIDENTE *Jesús Hernández*
Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Aguascalientes
I.C. J JESUS HERNANDEZ FUENTES



NUMEROS GENERADORES

NO. DE OBRA:	FISMDF 025/2022
NO. DE CONTRATO:	FISMDF 025/2022
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE JOSEFA ORTIZ E
UBICACIÓN:	AMAPOLAS DEL RIO



ANEXO

E S T I M A C I O N N O . 1

No. CROQUIS

5 DESCRIPCION CONCEPTO.
RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% DE SU PVS M CON BAILARINA EN CAPAS DE HASTA 20 cm. DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINSTRO DE TEPETATE, AGUA LE NECESARIA, MEDIDO COMPACTO, SELECCIÓN DEL MATERIAL, TENIDO, PAPEADO DE MATERIAL, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS.

R1

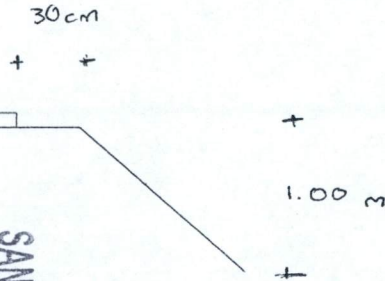

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL
 2022

OBSERVACIONES :

SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)

RESIDENTE
 Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Aguascalientes
 I.C. J JESUS HERNANDEZ FUENTES

NO. DE OBRA: FIS MDF 025/2022
NO. DE CONTRATO: FIS MDF 025/2022
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE JOSEFA ORTIZ C
UBICACIÓN: AMAPOLAS DEL RIO

NUMEROS GENERADORES




ANEXO

ESTIMACION NO. 1

FOTOGRAFIAS


No.

5 DESCRIPCION CONCEPTO.
RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM CON BAILARINA EN CAPAS DE HASTA 20 cm. DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINISTRO DE TEPETATE, AGUA LE NECESARIA, MEDIDO COMPACTO, SELECCIÓN DEL MATERIAL, TENIDO, PAPEADO DE MATERIAL, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS.

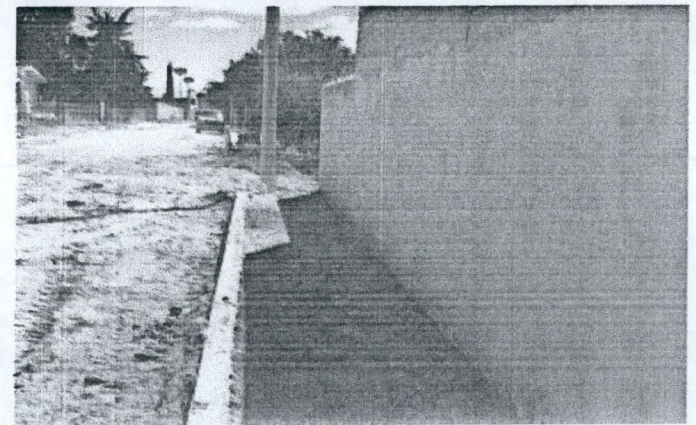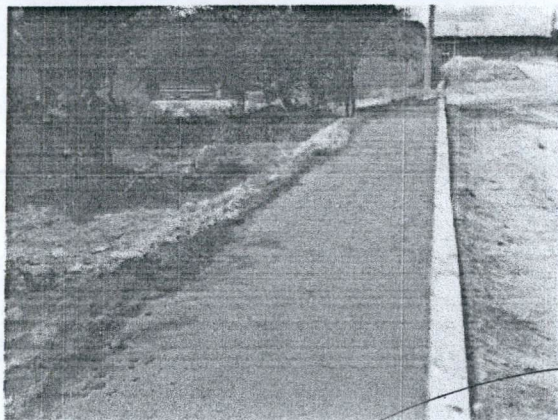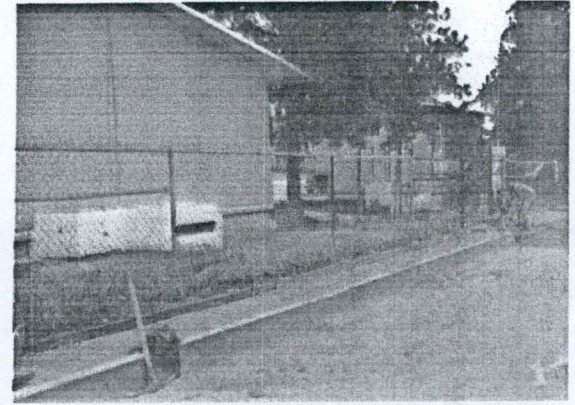

OBSERVACIONES :

SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)

RESIDENTE 
Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Aguascalientes
L.C. J JESUS HERNANDEZ FUENTES

NO. DE OBRA: FISDMF 025/2022
 NO. DE CONTRATO: FISDMF 025/2022
 DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE JOSEFA ORTIZ C
 UBICACIÓN: AMAPOLAS DEL RIO


NUMEROS GENERADORES

ANEXO

ESTIMACION NO. 1

CROQUIS

No. 6 DESCRIPCIÓN CONCEPTO.
 GUARNICIÓN DE 15X20X40 CM DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=150 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA Y DESCIBRADO, TRABAJO TERMINADO

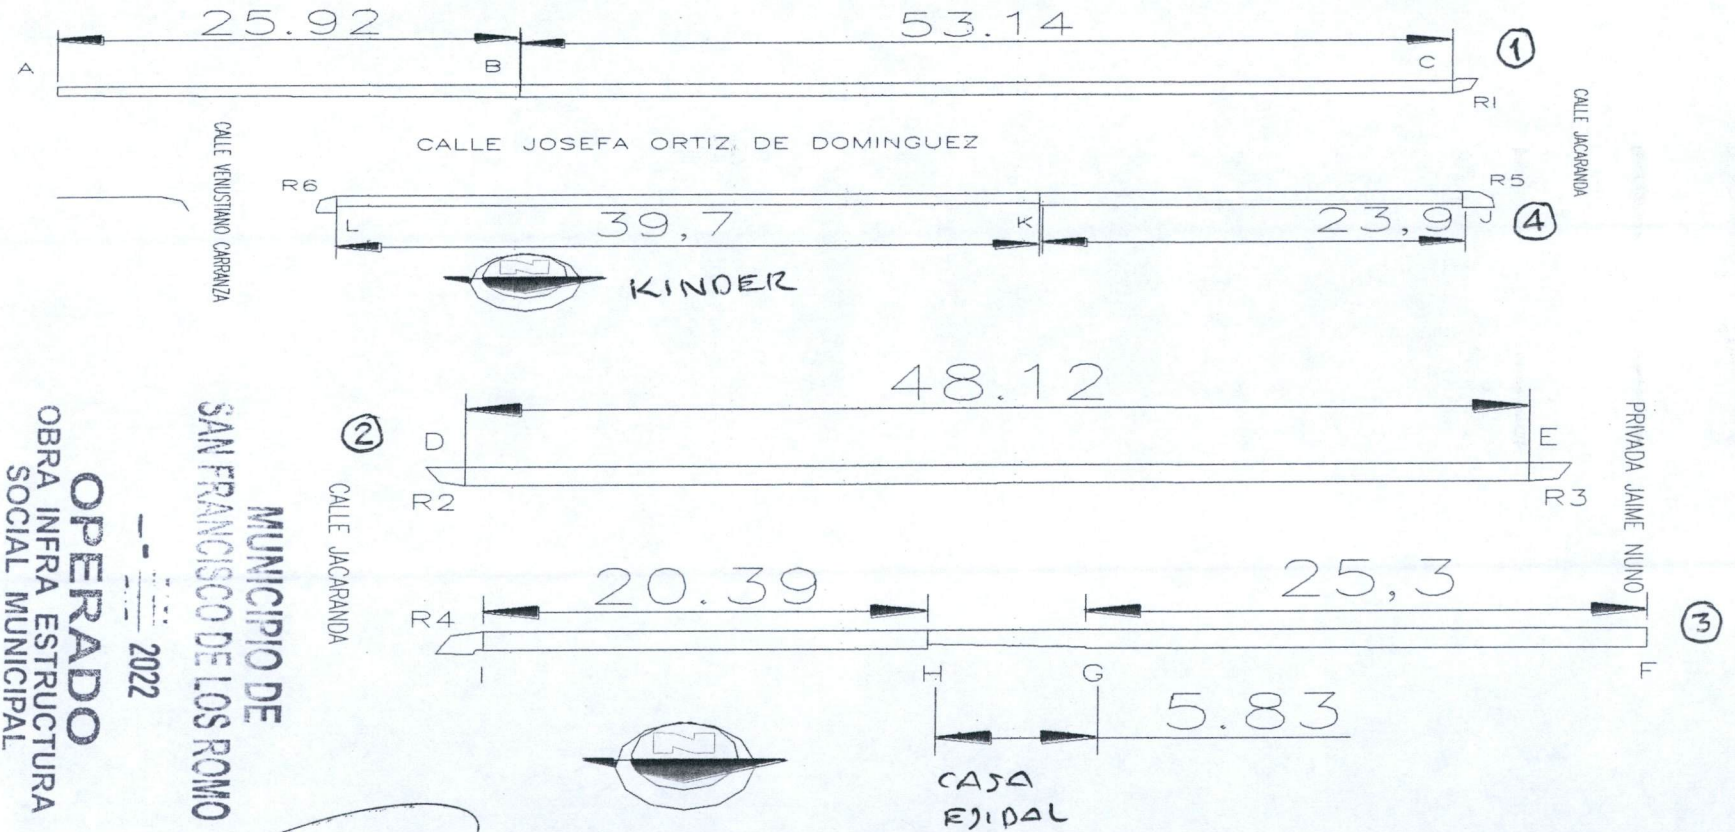

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
OPERA DO
OBRA INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 2022

OBSERVACIONES :

SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)

RESIDENTE *[Signature]*
 Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Aguascalientes
I.C. J JESUS HERNANDEZ FUENTES


NO. DE OBRA:	FISMDF 025/2022
NO. DE CONTRATO:	FISMDF 025/2022
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE JOSEFA ORTIZ C
UBICACIÓN:	AMAPOLAS DEL RIO

NUMEROS GENERADORES

ANEXO

E S T I M A C I O N N O . 1


FOTOGRAFÍAS

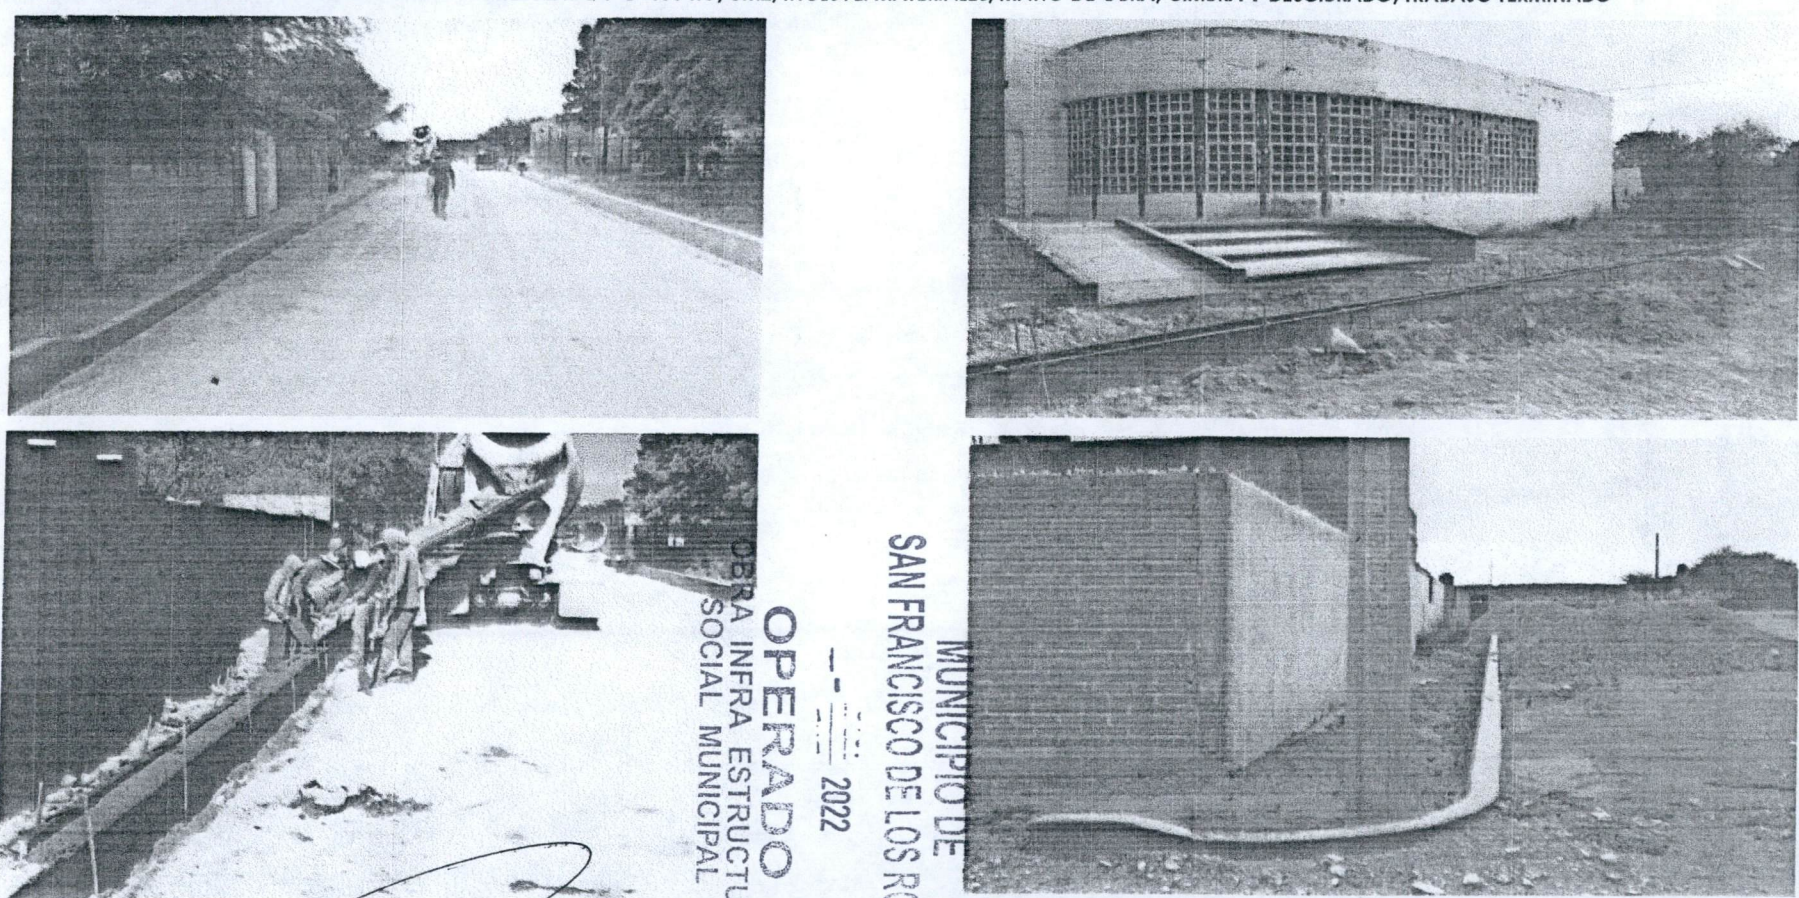No.	DESCRIPCIÓN CONCEPTO.
6	<p>GUARNICIÓN DE 15X20X40 CM DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=150 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA Y DESCIBRADO, TRABAJO TERMINADO</p> 


OPERADO
 OBRA INFRA ESTRUCTURA
 SOCIAL MUNICIPAL
 2022
 MUNICIPIO DE
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

OBSERVACIONES :

SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)



RESIDENTE


 Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Aguascalientes
 I.C. J JESUS HERNANDEZ FUENTES



NO. DE OBRA: FIS MDF 025/2022
 NO. DE CONTRATO: FIS MDF 025/2022
 DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE JOSEFA ORTIZ C
 UBICACIÓN: AMAPOLAS DEL RIO

NUMEROS GENERADORES

ESTIMACION NO. 1

No.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	TOTAL	CROQUIS	FOTOGRAFIA
			EJE	TRAMO	TIPO								
7	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO, T.M.A. 3/4", GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 10+2 CM ACABADO RAYADO FINO CON BROCHA DE PELO, JUNTAS FRIAS CON DOBLADOR DE 2", SECCION DE LOSAS DE ACUERDO ALA EXISTENTE, INCLUYE: COLADO, CURADO CON MEMBRANA A BASE DE AGUA Y TRABAJO TERMINADO SEGUN FICHA TECNICA FT-200.	M2										ANEXO	
				A-B	SUR	25.92	1.19		1.00	30.84	30.84		ENTRE CALLE
				B-C		53.14	1.33		1.00	70.68	70.68		VENUSTIANO CARRANZA
		RAMPA		R 1		2.30	1.46		1.00	3.36	3.36		Y JACARANDAS
				R 2	SUR	1.69	1.23		1.00	2.08	2.08		ENTRE CALLE
				D-E		48.12	1.39		1.00	66.89	66.89		JACARANDAS Y
				R 3		1.40	1.36		1.00	1.90	1.90		PRIV. NUNO
				F-G	NORTE	25.30	1.34		1.00	33.90	33.90		ENTRE CALLE
				G-H		5.83	1.09		1.00	6.35	6.35		PRIV. NUNO
				H-I		20.39	1.33		1.00	27.12	27.12		Y JACARANDAS
				R 4		1.65	1.45		1.00	2.39	2.39		
				R 5	NORTE	2.12	1.37		1.00	2.90	2.90		ENTRE CALLE
				J-K		23.90	1.27		1.00	30.35	30.35		JACARANDA Y
				K-L		39.70	1.10		1.00	43.67	43.67		VENUSTIANO CARRANZA
				R 6		1.35	1.20		1.00	1.62	1.62		
					1.34	1.09		1.00	1.46	1.46			
			COLUMNA, MURO DE ACOMETIDA Y REGISTROS SANITARIOS								-3.42		
			TOTAL =								322.10		

OPERADO
 OBRA INFRA ESTRUCTURA
 SOCIAL MUNICIPAL
 2022
 MUNICIPIO DE
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

OBSERVACIONES:

SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)

RESIDENTE

Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo

I.C. J JESUS HERNANDEZ FUENTES


NUMEROS GENERADORES

ANEXO

NO. DE OBRA:	FISMDF 025/2022
NO. DE CONTRATO:	FISMDF 025/2022
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE JOSEFA ORTIZ C
UBICACIÓN:	AMAPOLAS DEL RIO

ESTIMACION NO. 1

CROQUIS

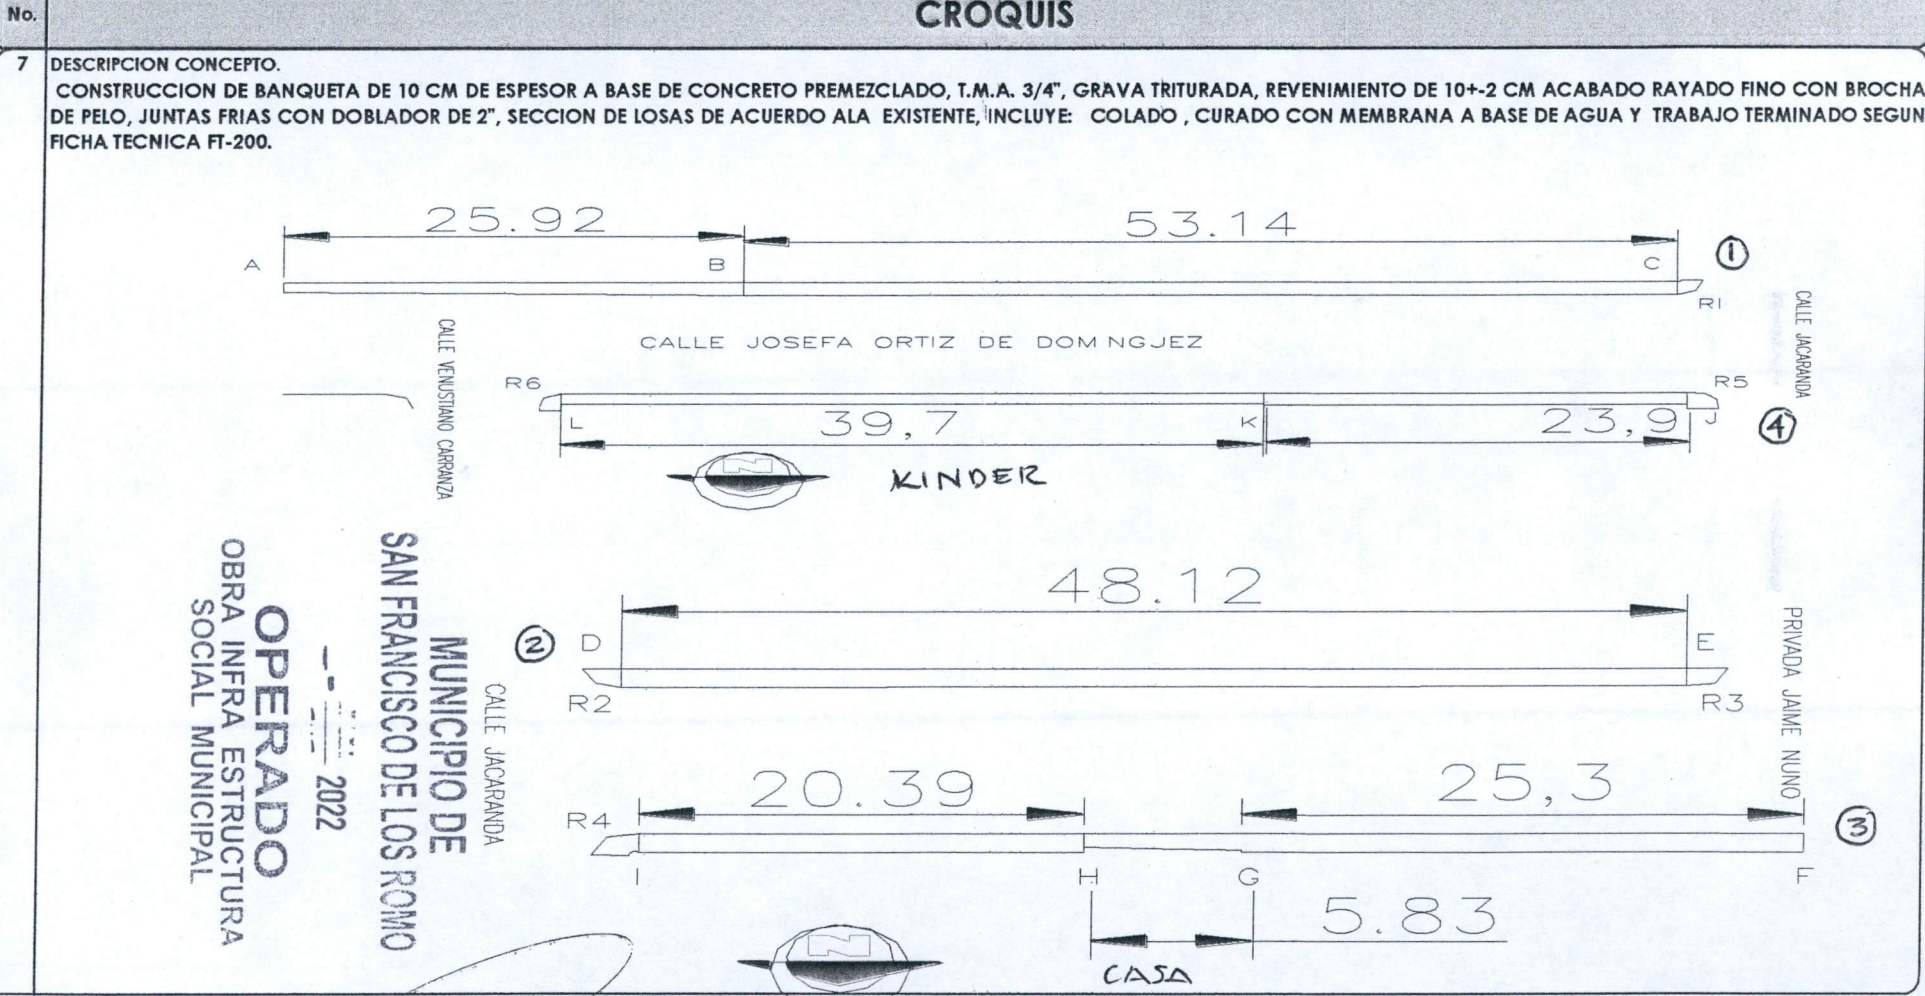

OBSERVACIONES:

SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)

RESIDENTE
Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Aguascalientes
I.C. J JESUS HERNANDEZ FUENTES

NO. DE OBRA:	FISDMDF 025/2022
NO. DE CONTRATO:	FISDMDF 025/2022
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE JOSEFA ORTIZ C
UBICACIÓN:	AMAPOLAS DEL RIO

NUMEROS GENERADORES

ANEXO


ESTIMACION NO. 1

FOTOGRAFIAS

No.	DESCRIPCION CONCEPTO.
7	<p>CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO, T.M.A. 3/4", GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 10+2 CM ACABADO RAYADO FINO CON BROCHA DE PELO, JUNTAS FRIAS CON DOBLADOR DE 2", SECCION DE LOSAS DE ACUERDO ALA EXISTENTE, INCLUYE: COLADO, CURADO CON MEMBRANA A BASE DE AGUA Y TRABAJO TERMINADO SEGUN FICHA TECNICA FT-200.</p>      

OBSERVACIONES :

SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)

RESIDENTE 
Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Aguascalientes
I.C. J JESUS HERNANDEZ FUENTES



NO. DE OBRA:	FISDMF 025/2022
NO. DE CONTRATO:	FISDMF 025/2022
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE JOSEFA ORTIZ D
UBICACIÓN:	AMAPOLAS DEL RIO

NUMEROS GENERADORES


ANEXO

ESTIMACION NO. 1

CROQUIS

No.

8 DESCRIPCION CONCEPTO.
LIMPIEZA FINAL , INCLUYE: BARRIDO CON AGUA , MATERIALES, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO.

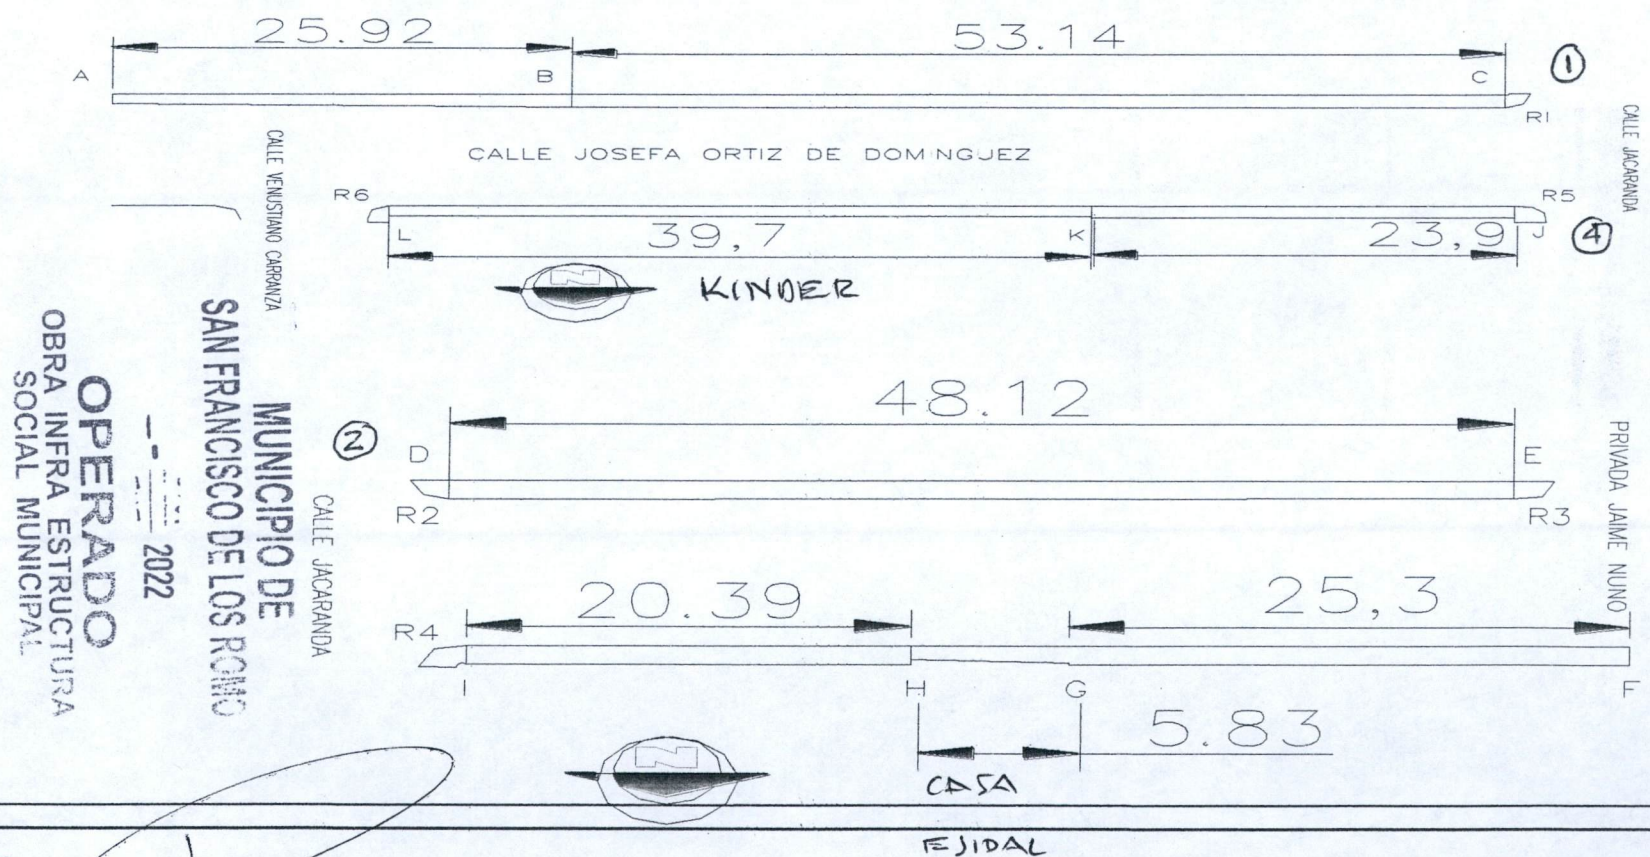

OPERADO
 OBRA INFRA ESTRUCTURA
 SOCIAL MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 2022

OBSERVACIONES:

SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)

RESIDENTE

Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Aguascalientes
I.C. J JESUS HERNANDEZ FUENTES



NUMEROS GENERADORES

ANEXO





NO. DE OBRA:	FISDMF 025/2022
NO. DE CONTRATO:	FISDMF 025/2022
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE JOSEFA ORTIZ C
UBICACIÓN:	AMAPOLAS DEL RIO

ESTIMACION NO. 1

FOTOGRAFIAS

No.

8 DESCRIPCION CONCEPTO.
LIMPIEZA FINAL , INCLUYE: BARRIDO CON AGUA , MATERIALES, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO.

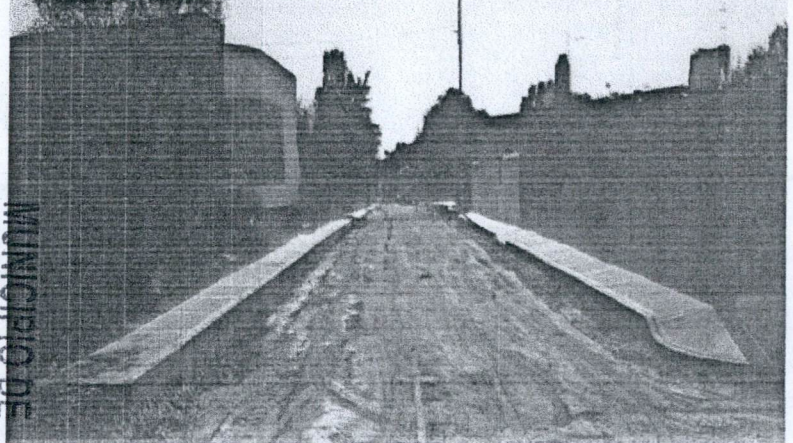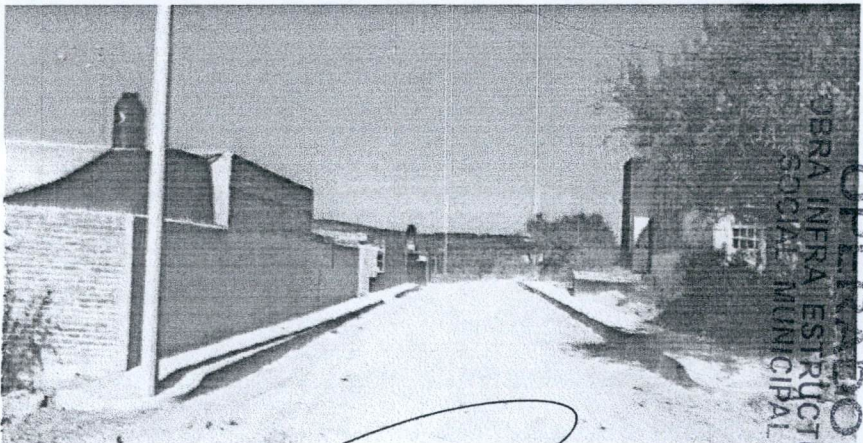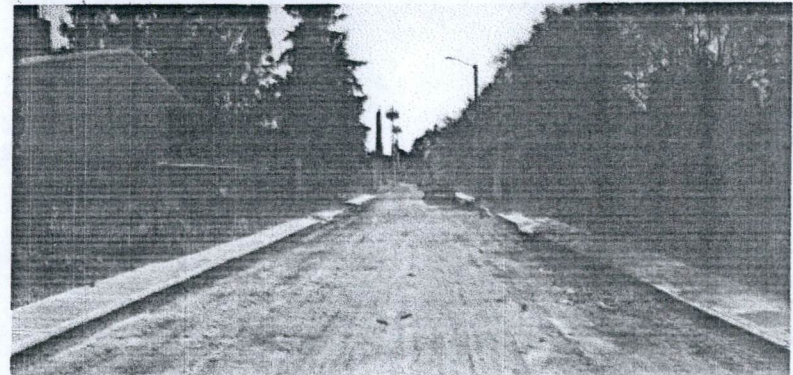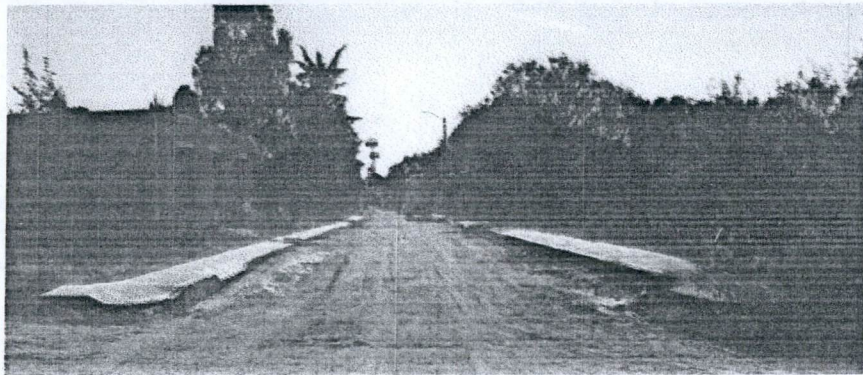

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL
MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
2022

OBSERVACIONES :

SUPERINTENDENTE (CONTRATISTA)

RESIDENTE *[Signature]*
Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Aguascalientes
I.C. J JESUS HERNANDEZ FUENTES

BITÁCORA DE OBRA

HOJA _____

CONTRATO FISMDF 025/2022


OBRA FISMDF 025/2022

NOTA

24 OCTUBRE 2022

ESTA SUPERVISION HACE LA OBSERVACION DE LA ESTIMACION NO 1 RECIBIDO EL 17 OCT. 2022 LOS MONTOS ESTAN CORRECTOS. SE AUTORIZA ESTIMACION NO 1 PARA SU PAGO. SE ENTREGA PREFACTURA Y SE SOLICITA AL CONTRATISTA REINGRESO PREFACTURA CON CUERPO DE ESTIMACION EN LA SIGUIENTE ESTRUCTURA:

MUNTO BASE	262,184.11
ANTICIPO	131,092.06
SUBTOTAL YIVA	152,086.78
RETENCION	2,621.84
TOTAL A PAGAR	149,444.94



MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

2022

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL
