



Usr: susana
Rep: rptPoliza

Municipio de San Francisco de los Romo
ESTADO DE AGUASCALIENTES

Póliza: C05343 Del 02/12/2022



Fecha y hora de Impresión | 13/dic./2022 11:42 a. m.
Página | 1

Concepto: FISM 2022 PAGADO EST 1 OBRA FISMDF 028-2022 REHABILITACIÓN DE CALLE A BASE DE PAVIMENTACIÓN, GUARNI. GP Folio: 362

Beneficiario: EQUIPOS AK, S.A. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-2501-K018-J04-61401-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$147,447.30		GP Folio: 362
0002	8260-2501-K018-J04-61401-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y		\$147,447.30	GP Folio: 362
0003	1112-003-002	Bancomer Cta. 011793039-9 FISM		\$72,452.55	GP Folio: 362
0004	1134-003-047	CORPORATIVO NEOENERGIA S.		\$73,723.65	FISM 2022 PAGADO EST 1 OBRA FISMDF 028-2022
0005	2117-9-005-001	0.1% COLEGIO DE		\$127.11	FISM 2022 PAGADO EST 1 OBRA FISMDF 028-2022
0006	2117-9-005-002	0.2% ORGANO SUPERIOR DE		\$254.22	FISM 2022 PAGADO EST 1 OBRA FISMDF 028-2022
0007	2117-9-005-003	0.2% INST. DE CAPACIT. DE LA		\$254.22	FISM 2022 PAGADO EST 1 OBRA FISMDF 028-2022
0008	2117-9-005-004	0.5% CONTRALORIA MUNICIPAL		\$635.55	FISM 2022 PAGADO EST 1 OBRA FISMDF 028-2022
0009	2113-000659	EQUIPOS AK, S.A. DE C.V.	\$147,447.30		GP Folio: 362
Sumas iguales =>			294,894.60	294,894.60	

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

2022

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Emisor
EAK160829184 EQUIPOS AK SA DE CV

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor
MSF920130TQ9 MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS

FCO ROMO JIMENEZ, 102, COL. SAN JOSE BUENA VISTA, C.P. 20300, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES, MEXICO
Uso CFDI: P01 Por definir

Folio Fiscal: DOA996EC-4A89-44CB-B854-6305124AC98F
Certificado SAT: 00001000000505619865
Fecha y Hora de Certificación: 2022-12-05T09:23:41

Tipo de Comprobante: RECIBO DE PAGOS
Folio/Serie: 000025RP
Fecha y Hora de Emisión: 2022-12-05T09:23:41
Lugar de Expedición: 20130
Certificado del Emisor: 00001000000505619865

Clave Producto/Servicio	Clave unidad	Unidad	No Identificación	Cantidad	Descripción del producto	Descuento	Valor unitario	Importe	
84111506	ACT	ACT		1	Pago		\$0	\$0	
Importe con Letra *** CERO ***									
								Subtotal	\$0

Pagos 1.0

Fecha Pago	02/12/2022 09:21:19	Número de Operación	-
Nombre de Banco Ordenante Ext		Forma de Pago	03 Transferencia electrónica de fondos
Cuenta Ordenante		Moneda de Pago	MXN
RFC Emisor Cuenta Ordenante		Tipo de Cambio	-
Cuenta Beneficiario		Monto	\$72,452.55
RFC Emisor Cuenta Beneficiario			

Documentos Relacionados

Id Documento	Serie	Folio	Moneda	Tipo Cambio	Método de Pago	Número de Parcialidad	Saldo Anterior	Importe Pagado	Saldo Insoluto
45F80970-DCF9-4044-9C55-5E2395F643A1		207	MXN	-	PPD - Pago en parcialidades o diferido	2	\$414,476.35	\$72,452.55	\$342,023.80

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 [1.1]DOA996EC-4A89-44CB-B854-6305124AC98F|2022-12-05T09:23:41|SFE0807172W8|SyPnwdK2YIEIQ1yFjb2oMZUjL7OZbPwgjScCno7n5v643qzUNLBS/rR9PCUA08sdvqqv18DxbNnaeLWgJxgYLaSc0aSa05t3kwa+Rcicm8gnoYMxdwZIAWfBIE9CO/KoXcYAzFV9O+2hGjbbZpHpRmISnVnsHRWAGQ3Jjgk+cfuMgeeuJ42al7yovrMrgPjxfDtkOlsc5SpQJF63+Xh8sBvjO/VxaVcjf60lqsCdtufyfijoeiEGb23hfX3dRjV3K7cSomQJW8cGlibP2D5xrMgyxAhAMWKA0vTKm+7I9I3/cOW38snnR9+U2F5GQnsefDvCx55QUUIE0BQ==[00001000000505619865]
 Sello digital del contribuyente que lo expide
 SyPnwdK2YIEIQ1yFjb2oMZUjL7OZbPwgjScCno7n5v643qzUNLBS/rR9PCUA08sdvqqv18DxbNnaeLWgJxgYLaSc0aSa05t3kwa+Rcicm8gnoYMxdwZIAWfBIE9CO/KoXcYAzFV9O+2hGjbbZpHpRmISnVnsHRWAGQ3Jjgk+cfuMgeeuJ42al7yovrMrgPjxfDtkOlsc5SpQJF63+Xh8sBvjO/VxaVcjf60lqsCdtufyfijoeiEGb23hfX3dRjV3K7cSomQJW8cGlibP2D5xrMgyxAhAMWKA0vTKm+7I9I3/cOW38snnR9+U2F5GQnsefDvCx55QUUIE0BQ==
 Sello Digital del SAT
 pzuCABaeH8QLAPAHF5YDSQCralzCAmI93yuX7MEyC1Q/tjh1cAYgZmpxGIQFMel+BXfph6UdtWMEvRGIEIvzPrAYMbMHIB6wYDmhsTjpc3fa7WsY3Qg7r0FFwlqezX8HLR1KlyignhojmmWABTWryPSNAMfSafo70rYQMmo+J4+Wo4MRcXEA8ppqw1mG/gr+h4qUoVbHh/xwN+/78y5aVdw4xTCyxLrUr2PeVNFtm5+enj3Vdvv3ZFnbgPg77PV/DtASaeu4uPxR9OKPs/MoMXrzKzpj3bCRrmnyHPghPrddCSYRvrK5zjtWgw9W93pWmUiLxSEccFmOILsw==



MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.

PAGADO

FINANZAS

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

2022

OPERADO

OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
EAK160829184	EQUIPOS AK SA DE CV	MSF920130TQ9	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D0A996EC-4A89-44CB-B854-6305124AC9BF	2022-12-05T09:23:41	2022-12-05T09:23:41	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$0.00	Pago	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir
**MUNICIPIO DE
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
 - - 2022
OPERADO
 OBRA INFRA ESTRUCTURA
 SOCIAL MUNICIPAL



Fecha y hora de consulta

02/12/2022 4:20:26 PM

Contrato

00796395

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO
DE LOS ROMO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: EST1 FIS MDF 028

Importe de la operación: 72,452.55 MXP

Cuenta de retiro: 0117930399

Cuenta de depósito: 0109045198

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE SAN FRA
NCISCO DE LOS ROMO

Titular de la cuenta: EQUIPOS AK SA DE CV

Fecha de creación: 02/12/2022

Fecha de aplicación: 02/12/2022

Hora: 16:20:19

Instrumento de seguridad: ASD 6550927880

Motivo de pago: PAGO EST 1 FIS MDF 11-028

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0014687113

Folio único: I323202212021620190014687120

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	02/12/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	02/12/2022


BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx

Dirección de
OBRAS PÚBLICAS



Ayuntamiento de
**SAN FRANCISCO
DE LOS ROMO**
2021 ♦ 2024



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
No. Oficio: DOP/521/22
San Francisco de los Romo, Ags., 2 de diciembre de 2022
Asunto: LIBERACIÓN DE PAGO

C.P. MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
PRESENTE

Por medio del presente le remito la documentación de la estimación No. 1, para que se realicen los trámites necesarios para su pago.

No. de Obra: FIS MDF 028/2022

Nombre de la Obra: REHABILITACIÓN DE CALLE A BASE DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE LA CARRETERA AGUASCALIENTES LORETO Y CALLE LÁZARO CARDENAS

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal

Contratista: EQUIPOS AK, S.A. DE C.V. (EAK160829184)

Contrato: FIS MDF 028/2022 No Factura: 000207

Objeto del Contrato: REHABILITACIÓN DE CALLE A BASE DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE LA CARRETERA AGUASCALIENTES LORETO Y CALLE LÁZARO CARDENAS, COLONIA MACARIO J. GÓMEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Monto del Contrato: \$869,229.03 (OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 03/100 M.N.)

Monto a Pagar: \$72,452.55 (SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 55/100 M.N.)

Sin otro particular de momento, me es grato enviarle un cordial saludo agradeciendo de antemano las atenciones al presente.

ATENTAMENTE

ING. JOSE DE JESUS CHAVEZ GARCIA
DIRECTOR DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

2022

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

C.c.p. Archivo

Av. Benito Juárez S/N, Rancho La Trinidad,
San Francisco de los Romo, Ags. Tel: (465) 967 0124 ext. 1654

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

CÉDULA DE SEGUIMIENTO A ESTIMACIONES DE OBRA

Ayuntamiento de
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
2021 • 2024



DATOS GENERALES

CONTRATISTA: EQUIPOS AK, S.A. DE C.V.	N° DE CONTRATO: FISMDF 028/2022
SUPERVISOR: Carlos Armando Chavez Garcia	N° DE OBRA: FISMDF 028/2022
OBRA: Rehabilitacion de Calle a base de Pavimentacion, Guarniciones y Banquetas Calle Guadalupe Victoria entre la Carretera Aguascalientes Loreto y Calle Lazaro Cardenas	N° DE FACTURA: 000207
FECHA DE CORTE: DEL: 02/09/2022 AL: 16/09/2022	N° DE ESTIMACION: 1 (uno)
	IMPORTE LIQUIDO: \$ 72,452.55

FORMATO DE NUMEROS GENERADORES

INGRESO 20/09/2022 CONTRATISTA	REVISIÓN 04/10/2022 SUPERVISOR	NOTA Sr. contratista regrese esta cédula con la estimación original de lo contrario no se le dara tramite	CAPTURA EN SISTEMA 04/10/2022 SUPERVISOR	ENTREGA DE PRE-FACTURA 04/10/2022 SUPERVISOR
---	---	---	---	---

FORMATO DE ESTIMACIONES

INGRESO 02/12/2022 CONTRATISTA	REGISTRO 02/12/22 CONTROL DE ESTIMACIONES	SUPERVISOR 02/12/2022 RECIBIDO	SUPERVISOR 02/12/2022 AUTORIZADO	JEFE DE DEPARTAMENTO ARQ. ALFREDO FLORES MARMOLEJO 02/12/22 RECIBIDO	RECIBIDO	AUTORIZADO 02/12/22
---	--	---	---	--	-----------------	-------------------------------

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 2022

DEVOLUCIÓN

FECHA DE DEVOLUCIÓN: 04/10/2022
FECHA DE REINGRESO: 02/12/2022
MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN: falta soporte en generadores

CONTENIDO

CÁRATULA	
RESUMEN	
CONCEPTOS	
ESTADO DE CUENTA	
CONCENTRADO DE CONCEPTOS (FIN)	
GENERADORES Y RESUMEN	
CROQUIS	
FOTOGRAFIAS	
ANÁLISIS PRECIO UNITARIO	
REPORTE(S) DE LABORATORIO	
FIANZA(S) (FIN)	
NOTA DE BITACORA DE OBRA	

DIRECTOR GENERAL

ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA
 02/12/22
 RECIBIDO AUTORIZADO

FINANZAS

RECIBIDO AUTORIZADO

TRÁMITE DE PAGO

FECHA DE INICIO DE TRÁMITE EN DOP-SFR 20 09 22 DÍA: MES: AÑO:	FIRMA DEL DIRECTOR 02 20 22 DÍA: MES: AÑO:	OFICIO DE LIBERACIÓN 02 12 22 DÍA: MES: AÑO:	FECHA DE ENTREGA DIRECCIÓN DE EGRESOS.
--	---	---	--

PRE-FACTURA Normal



PRE-FACTURA DEL CONTRATISTA: EQUIPOS AK, S.A. DE C.V. (248)

A NOMBRE DE: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 RFC: MSF920130TQ9
 DIRECCION: FCO ROMO JIMENEZ 102, SAN JOSE DE BUENAVISTA, SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS,
 CIUDAD: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE L ESTADO: AGUASCALIENTES
 DESCRIPCION

PAGO DE LA ESTIMACION No.	1 Del 02 Sep 2022 al 16 Sep 2022		
DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN DE CALLE A BASE DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE LA CARRETERA AGUASCALIENTES LORETO Y CALLE LÁZARO CARDENAS	MONTO BASE	\$127,109.75
		AJUSTE DE COSTOS (+)	\$0.00
		AMORTIZACION DE ANTICIPO (-)	\$63,554.88
UBICADA EN:	COLONIA MACARIO J. GÓMEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTE	SUBTOTAL	\$63,554.87
CON AMPARO DEL CONTRATO No.:	FISMDF 028/2022	IVA (+)	\$10,168.78
DE FECHA::	26/08/2022	SUBTOTAL CON IVA	\$73,723.65
BAJO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA:			
Inversion	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal 2022		
Programa	SF PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES		
SubPrograma	01 CONCRETO		
Obra.	FISMDF 028/2022 REHABILITACIÓN DE CALLE A BASE DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE GUADALU		
Localizacion	COLONIA MACARIO J. GÓMEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES		
	CAPACITACION DE LOS TRABAJADORES DEL CONTRATISTA	\$254.22 (0.20%)	
	COLEGIOS DE PROFESIONISTAS SEGUN CORRESPONDA	\$127.11 (0.10%)	TOTAL DE RETENCIONES (-)
	SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	\$0.00 (0.00%)	\$1,271.10
	FISCALIZACION DEL H. CONGRESO DEL ESTADO	\$254.22 (0.20%)	SANCION POR RETRASO (-)
			\$0.00
			SUBTOTAL MENOS RETENCIONES
			\$72,452.55
Avance Fisico Real %	INSPECCION DE VIGILANCIA PARA LA CONTRALORIA	\$635.55 (0.50%)	RETENCION POR RETRASO(-)
Avance Fisico Proaramado %	SERVICIOS RELATIVOS ALAS CONSTRUCCIONES	\$0.00	\$0.00
Fecha Terminación Prog.	25/10/2022	\$1,271.10	REINTEGRO POR RETENCION
			\$0.00
			OTRAS SANCIONES(-)
			\$0.00
			TOTAL A PAGAR
			\$72,452.55

SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 55/100 M.N.

**MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
**OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL**
 2022

ESTADO DE CUENTA

Obra.	FISDMF 028/2022 REHABILITACIÓN DE CALLE A BASE DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE LA CARRETERA AGUASCALIENTES LORETO Y CALLE LAZARO CARDENAS		Total Contrato	843,495.72
Localizacion	COLONIA MACARIO J. GÓMEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES		Total Ampliaciones	25,733.31
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura So		Total Contratado	869,229.03
Programa	SF PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES		Anticipo (%)	421,747.86
SubPrograma	01 CONCRETO		Estimado Anterior	0.00
Contratista	EQUIPOS AK, S.A. DE C.V. (248)		Esta Estimacion	73,723.65
Contrato	FISDMF 028/2022	REHABILITACIÓN DE CALLE A BASE DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE LA CARRETERA AGUASCALIENTES LORETO Y CALLE LAZARO	Total Estimado	495,471.51
Estimacion No.	1	Del 02 Sep 2022 al 16 Sep 2022	Total por Estimar	373,757.52

No. Estimac.	Periodo	Importe Estimacion	Amortizacion de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA (+)	Cargo a la Obra	DEDUCCIONES (-)						Retencion (-)	Reintegro (+)	Sanciones (-)	Importe a Pagar
							CMIC(0)	Calc.Prof.(0)	SEP(0.5)	Cong. Edo.(0.2)	Municipal	ISRuQtro(0)				
Anticipo				363,575.74	58,172.12	421,747.86										421,747.86
1	Del 02 Sep 2022 al 16 Sep	127,109.75	63,554.88	300,020.86	10,168.78	73,723.65	254.22	127.11	0.00	254.22	635.55	0.00	0.00	0.00	0.00	72,452.55
TOTALES		127,109.75	63,554.88		68,340.90	495,471.51	254.22	127.11	0.00	254.22	635.55	0.00	0.00	0.00	0.00	494,200.41

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

2022
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL


RESUMEN DE ESTIMACION

Obra.	FISMDF 028/2022 REHABILITACIÓN DE CALLE A BASE DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE GUADALUPE VICTORIA	Total Contrato	\$843,495.72
Localización	ENTRE LA CARRETERA AGUASCALIENTES LORETO Y CALLE LÁZARO GARDENAS COLONIA MACARIO J. GOMEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES	Total Ampliaciones	\$25,733.31
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal.	Total Contratado	\$869,229.03
Programa	SF PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES	Anticipo (50)%	\$421,747.86
SubPrograma	01 CONCRETO	Estimado Anterior	\$0.00
Supervisor	CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA (CAGC9207139Q5)	Esta Estimacion	\$73,723.65
Contratista	EQUIPOS AK, S.A. DE C.V. (248)	Total Estimado	\$495,471.51
Contrato	FISMDF 028/2022	Saldo por Estimar	\$373,757.52
Estimacion No.	1		
Recibí de	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	la Cantidad de:	\$73,723.65 SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 65/100 M.N.

<u>GRUPO</u>	<u>PARTIDA</u>		
	* REHABILITACIÓN DE CALLE A BASE DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE GUADALUPE VICTORIA		\$127,109.75
	- TERRACERIAS		\$127,109.75
Fecha Terminación Prog.		SUMA	\$127,109.75
		AJUSTE DE COSTOS (+)	\$0.00
		AMORTIZACION DE ANTICIPO (-)	\$63,554.88
		SUBTOTAL	\$63,554.87
		IVA (+)	\$10,168.78
		SUBTOTAL CON IVA	\$73,723.65

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 2022
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

EQUIPOS AK, S.A. DE C.V. (EAK160829184)
 Contratista


 INGENIERO CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA
 (CAGC9207139Q5)
 SUPERVISOR

CONCEPTOS DE ESTIMACION



Normal


Obra.	FISMDF 028/2022 REHABILITACIÓN DE CALLE A BASE DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE LA CARRETERA AGUASCALIENTES LORETO Y CALLE LÁZARO CARDENAS COLONIA MACARIO J. GÓMEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES						Total Contrato	\$843,495.72
Localización	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal.						Total Ampliaciones	\$25,733.31
Fuente Financ.	SF PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES						Total Contratado	\$869,229.03
Programa	01 CONCRETO						Anticipo (50)%	\$421,747.86
SubPrograma	CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA (CAGC9207139Q5)						Estimado Anterior	\$0.00
Supervisor	EQUIPOS AK, S.A. DE C.V. (248)						Esta Estimacion	\$73,723.65
Contratista	FISMDF 028/2022 REHABILITACIÓN DE CALLE A BASE DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE LA CARRETERA AGUASCALIENTES LORETO Y CALLE LÁZARO						Total Estimado	\$495,471.51
Contrato	Del 02 Sep 2022 al 16 Sep 2022						Saldo por Estimar	\$373,757.52
Estimacion No.	1							
Recibí de	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO la Cantidad de: \$73,723.65 SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 65/100 M.N.							


No.	Concepto	Unid. Med	Volumen					Precio Contratado	Importe
			Contratado	Acumulado	Anterior	Actual	Excedente		

GRUPO: REHABILITACIÓN DE CALLE A BASE DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE LA CARRETERA AGUASCALIENTES LORETO Y CALLE L

PARTIDA: TERRACERIAS									
2	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. INCLUYE: EQUIPO NECESARIO, PUENTE, SEÑALIZACION DEL BANCO Y PUNTOS QUE SE REQUIERAN EN LA NIVELACION CON PINTURA, RENIVELACIONES NECESARIAS, LIMPIEZAS.	M2	692.00	657.90	0.00	657.90	\$6.62	\$4,355.30	
3	CORTE DE MATERIAL EXISTENTE POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO I Y II EN CAJONES A CIELO ABIERTO RESPETANDO NIVELES DE PROYECTO, DEPOSITANDO EL MATERIAL DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISIÓN, MEDIDO EN TERRENO NATURAL (COMPACTO).	M3	276.80	263.16	0.00	263.16	\$47.08	\$12,389.57	
4	CONFORMACION DE PLANTILLA POR MEDIOS MECANICOS DEL TERRENO NATURAL AL 95% DE SU PVSM. INCLUYE: ESCARIFICACION, MANIOBRAS, HUMEDECIDO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO, LIMPIEZAS.	M2	692.00	657.90	0.00	657.90	\$15.46	\$10,171.13	
5	CONSTRUCCIÓN DE SUB RASANTE A BASE DE TEPETATE, COMPACTADA AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR, EN PROPORCION, VRS DEL MATERIAL 50%. INCLUYE: MANIOBRAS, AGUA NECESARIA, EXTENDIDO DE MATERIAL, CONFORMACION, NIVELADO, SELECCION DE MATERIAL, AGUA LA NECESARIA, LIMPIEZAS.	M3	138.40	131.58	0.00	131.58	\$333.57	\$43,891.14	
6	CONSTRUCCIÓN DE SUB-BASE CON TEPETATE, COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR, VRS 50%. INCLUYE: MANIOBRAS, AGUA NECESARIA, EXTENDIDO DE MATERIAL, CONFORMACION, NIVELADO, SELECCION DE MATERIAL, AGUA LA NECESARIA, LIMPIEZAS.	M3	138.40	131.58	0.00	131.58	\$339.28	\$44,642.46	
7	CARGA MECÁNICA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE ESCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO AL 1er. KM, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3	386.45	263.16	0.00	263.16	\$36.61	\$9,634.29	
8	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES AL TIRADERO OFICIAL AUTORIZADO MÁS CERCANO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3/KM	1,159.35	157.90	0.00	157.90	\$12.83	\$2,025.86	

Total Partida **\$127,109.75**
Total Grupo **\$127,109.75**


EQUIPOS AK, S.A. DE C.V. (EAK161823184)
 CONTRATISTA


INGENIERO CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA
 (CAGC9207139Q5)
 SUPERVISOR

2022

OPERADO


MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

OBRA INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

No.	Concepto	Unid. Med	Volumen				Precio Contratado	Importe
			Contratado	Acumulado	Anterior	Actual		
							Total Presupuestado	\$127,109.75
							Ajuste de Costos	\$0.00
							Total	\$127,109.75

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS RÍOS

 2022
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL
 EQUIPOS AK... DE C.V. (EAK160829184)
 CONTRATISTA


 INGENIERO CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA
 (CAGC9207139Q5)
 SUPERVISOR

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

RESUMEN DE ESTIMACIÓN

FECHA : 20-Sep-2022

04-oct-2022

NOMBRE DE LA OBRA :
 No. DE CONTRATO Y OBRA : FISMDF 028/2022, FISMDF 028/2022
 IMPORTE DE CONTRATO : \$843,495.72
 FECHA DE INICIO VIGENTE (CONTRATO) : 27 de septiembre de 2022
 FECHA DE INICIO REAL (REPROGRAMACIÓN SEGÚN ANTICIPO) : 02 de Septiembre de 2022
 PLAZO DEL CONTRATO : 60 días
 FECHA DE TERMINO VIGENTE : 31 de Octubre de 2022 FECHA DE TERMINO REAL :
 No. DE ESTIMACIÓN : ESTIMACIÓN #1
 PERIODO DEL : 02-Sep-2022 AL 16-Sep-2022
 AVANCE FÍSICO
 AVANCE FINANCIERO

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN				PU.	IMPORTE
			CONTRATADO	ESTA ESTIM.	EST. ANTERIOR	ACUMULADO		
2	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS	M2	692.00	657.90			\$ 6.62	\$ 4,355.298
3	CORTE DE MATERIAL EXISTENTE POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO I Y II E	M3	276.80	296.06	263.16		\$ 47.08	\$ 13,938.505
4	CONFORMACION DE PLANTILLA POR MEDIOS MECANICOS DEL TERRENO NATURAL	M2	692.00	657.90			\$ 15.46	\$ 10,171.134
5	CONSTRUCCIÓN DE SUB RASANTE A BASE DE TEPETATE, COMPACTADA AL 90% DE	M3	138.40	148.03	131.58		\$ 333.57	\$ 49,378.367
6	CONSTRUCCIÓN DE SUB-BASE CON TEPETATE, COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEB	M3	138.40	148.03	131.58		\$ 339.28	\$ 50,223.618
7	CARGA MECÁNICA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE ESCAVACIÓN Y DEM	M3	386.45	296.06	263.16		\$ 36.61	\$ 10,838.757
8	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMI	M3/KM	1,159.35	177.64	157.90		\$ 12.83	\$ 2,277.121

\$4,355.30
 \$12,389.57
 \$10,171.13
 \$43,891.14
 \$44,642.46
 \$9,634.29
 \$2,025.86
 SUB-TOTAL \$141,184.80 \$127,109.75
 16% IVA ~~\$22,589.57~~ \$20,337.56
 TOTAL \$163,774.37 \$147,447.31

OBSERVACIONES:

OPERA DO
 OBRA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 2022
 MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 CONTRATISTA
 FIRMA

Residente de Supervisión
 Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo

Jefe de Departamento de Supervisión
 Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo



T. (449) 9137737

Pabellón de Arteaga 104 col San José del Arenal
Cp 20130 Aguascalientes Ags

NUMEROS GENERADORES

NO. DE OBRA:

FISMDF 028/2022

NO. DE CONTRATO:

FISMDF 028/2022

DESCRIPCIÓN:

REHABILITACIÓN DE CALLE A BASE DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQL


UBICACIÓN:

CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE LA CARRETERA AGUASCALIENTES LORETO Y C

E S T I M A C I O N N O . 1

No CROQUIS

2 DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO
LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. INCLUYE: EQUIPO NECESARIO, PUNTEO, SEÑALIZACION DEL BANCO Y PUNTOS QUE SE REQUIERAN EN LA NIVELACION CON PINTURA, RENIVELACIONES NECESARIAS, LIMPIEZAS.

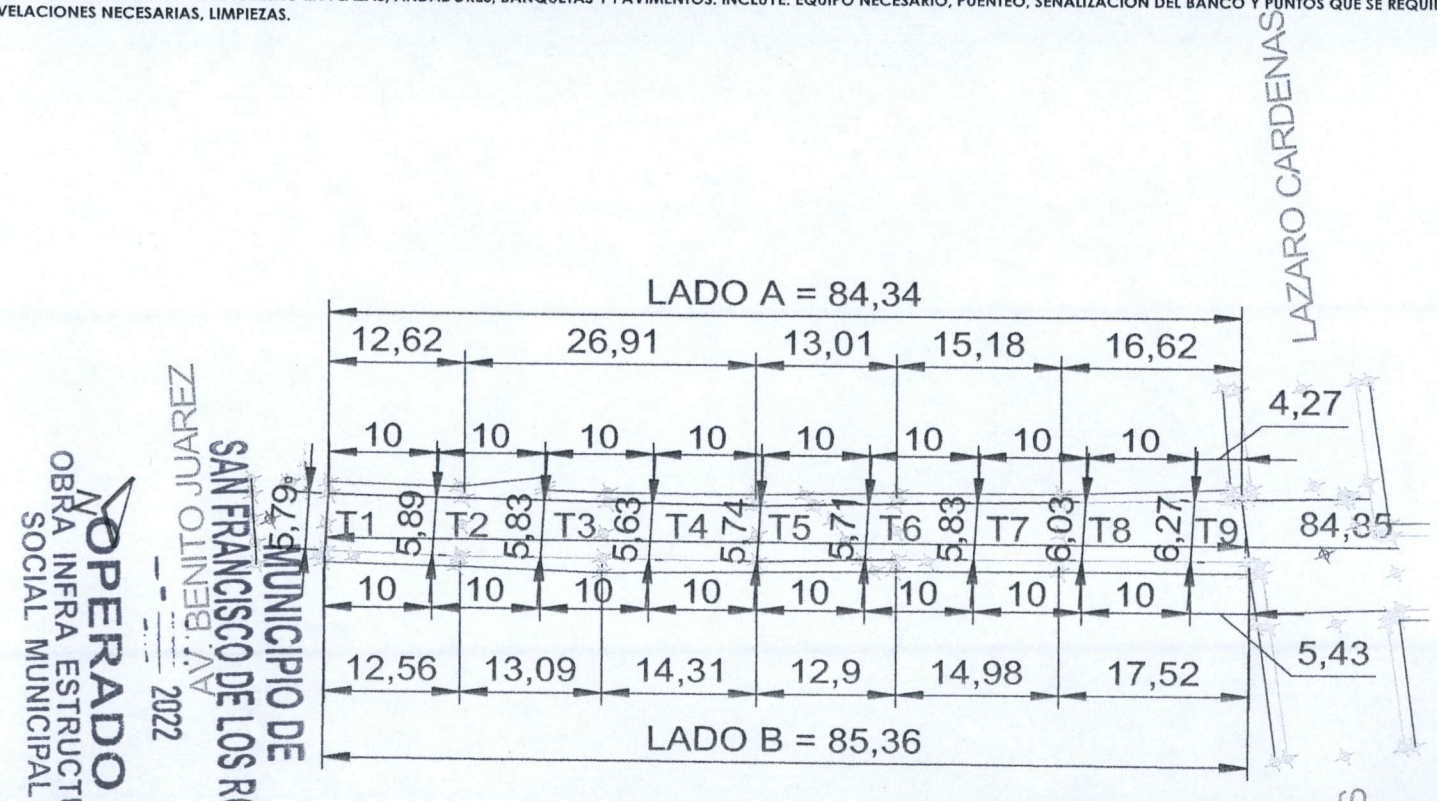

OBSERVACIONES:

SUPERVISOR DE OBRA
I.C. CARLOS ARMANDO CHAVEZ GARCIA
OBRAS PUBLICAS SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

RESIDENTE DE OBRA



T. (449) 9137737
 Pabellón de Arteaga 104 col San José del Arenal
 Cp 20130 Aguascalientes Ags


NUMEROS GENERADORES

NO. DE OBRA:	FISMDF 028/2022
NO. DE CONTRATO:	FISMDF 028/2022
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE CALLE A BASE DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS
UBICACIÓN:	CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE LA CARRETERA AGUASCALIENTES LORETO Y C

ESTIMACION NO. 1

No. **CROQUIS**

2 DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO
 LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. INCLUYE: EQUIPO NECESARIO, PUENTE, SEÑALIZACION DEL BANCO Y PUNTOS QUE SE REQUIERAN EN LA NIVELACION CON PINTURA, RENOVACIONES NECESARIAS, LIMPIEZAS.

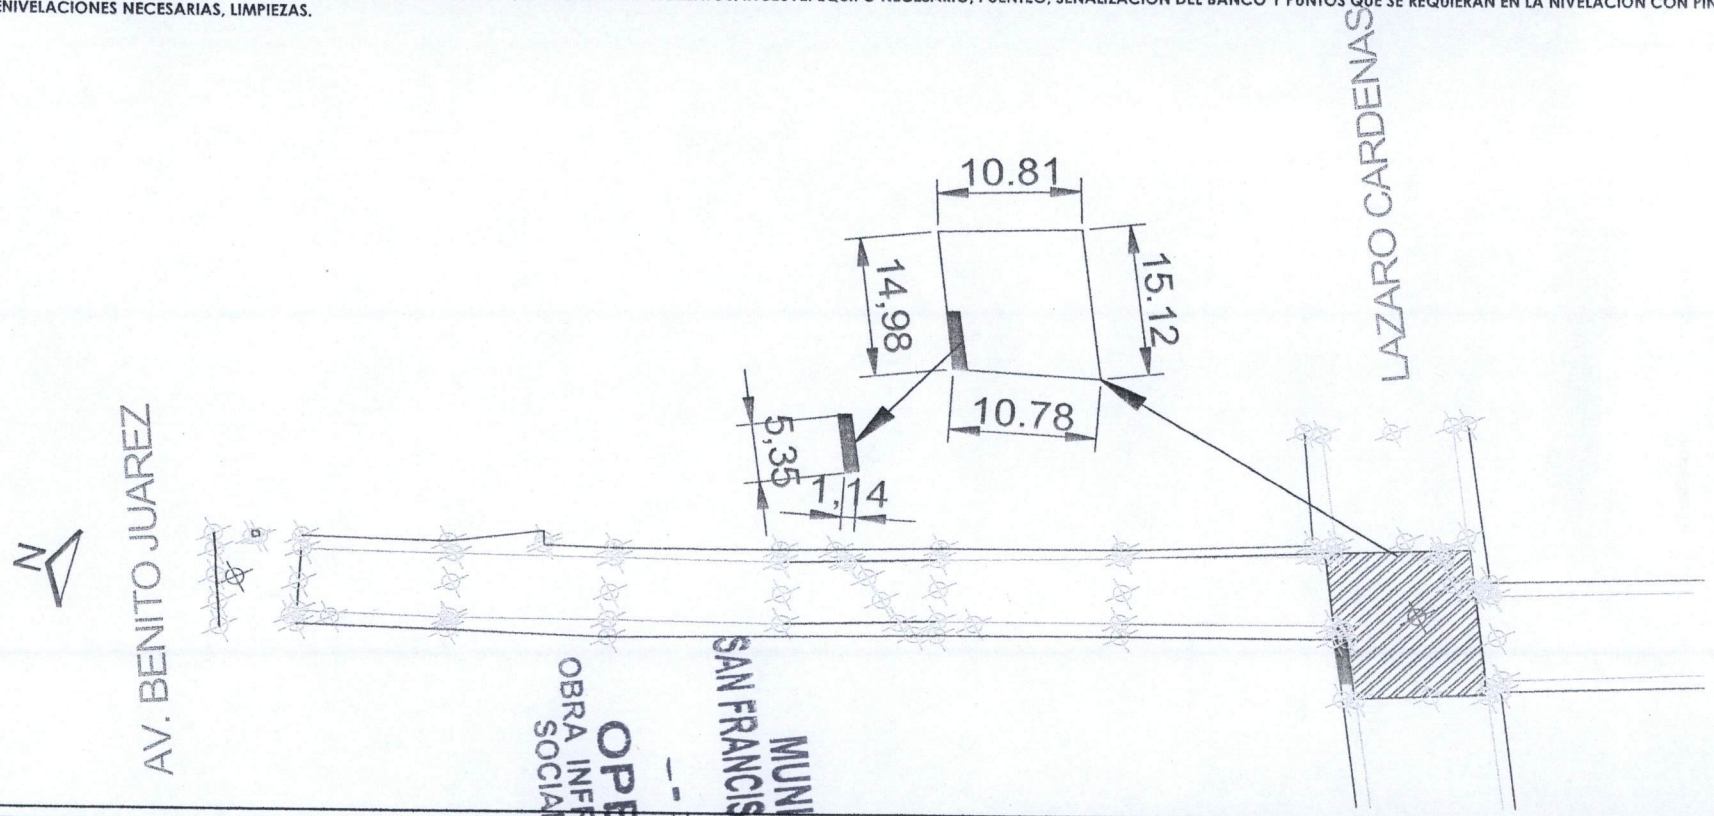

OBSERVACIONES :

SUPERVISOR DE OBRA
 I.C. CARLOS ARMANDO CHAVEZ GARCIA
 OBRAS PUBLICAS SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

RESIDENTE DE OBRA

OPERADO
 OBRA INFRA ESTRUCTURA
 SOCIAL MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 2022

NUMEROS GENERADORES

NO. DE OBRA:	FISMDF 028/2022
NO. DE CONTRATO:	FISMDF 028/2022
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE CALLE A BASE DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUILLO
UBICACIÓN:	CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE LA CARRETERA AGUASCALIENTES LORETO Y C

E S T I M A C I O N N O . 1


No.

FOTOGRAFIAS

2

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. INCLUYE: EQUIPO NECESARIO, PUENTE, SEÑALIZACION DEL BANCO Y PUNTOS QUE SE REQUIERAN EN LA NIVELACION CON PINTURA, RENIVELACIONES NECESARIAS, LIMPIEZAS.

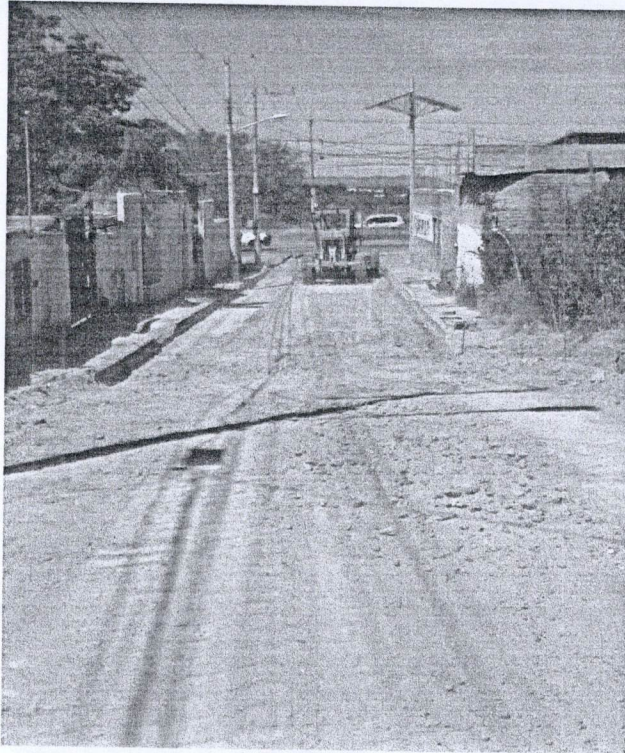

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
OPERADO
OPERA INFERA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL
2022

OBSERVACIONES :

SUPERVISOR DE OBRA
I.C. CARLOS ARMANDO CHAVEZ GARCIA
OBRAS PUBLICAS SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

RESIDENTE DE OBRA



T. (449) 9137737

Pabellón de Arteaga 104 col San José del Arenal
Cp 20130 Aguascalientes Ags

NUMEROS GENERADORES

NO. DE OBRA: FISMDF 028/2022
 NO. DE CONTRATO: FISMDF 028/2022
 DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE CALLE A BASE DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUILLO
 UBICACIÓN: CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE LA CARRETERA AGUASCALIENTES LORETO Y CALLE

E S T I M A C I O N N O 1

No.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	AVANCE	TOTAL	CROQUIS	FOTOGRAFIA				
			EJE	TRAMO	TIPO												
3	CORTE DE MATERIAL EXISTENTE POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO I Y II EN CAJONES A CIELO ABIERTO RESPECTANDO NIVELES DE PROYECTO. DEPOSITANDO EL MATERIAL DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISIÓN, MEDIDO EN TERRENO NATURAL (COMPACTO). MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO OPERADO OBRA INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2022	M3															
LARGO						84.85	5.91	0.45	1.0	225.66	ANEXO $A = 657.90 m^2$ $657.90 m^2 + 0.40 m$ $Vol = 263.16 m^3$						
		LADO A	84.34														
		LADO B	85.36					0.40									
		PROMEDIO A Y B	84.85														
ANCHO																	
ANCHO A CADA 10 MTS																	
		P1	5.79	PROMEDIO ANCHOS													
		P2	5.89	T1	5.84												
		P3	5.83	T2	5.86												
		P4	5.75	T3	5.79												
		P5	5.74	T4	5.745												
		P6	5.71	T5	5.725												
		P7	5.83	T6	5.77												
		P8	6.03	T7	5.93												
		P9	6.27	T8	6.15												
		P10	6.49	T9	6.38												
		PROMEDIO TOTAL =			5.91												
CRUCERO						10.80	15.05	0.45	1.0	73.14							
LARGO						5.35	1.14	0.45	-1.0	-2.74							
		LADO A	10.78														
		LADO B	10.81														
		PROMEDIO A Y B	10.80														
ANCHO																	
		LADO C	14.98														
	LADO D	15.12															
	PROMEDIO A Y B	15.05															
TOTAL =											296.06						

OBSERVACIONES :

SUPERVISOR DE OBRA
 I.C. CARLOS ARMANDO CHAVEZ GARCIA
 OBRAS PUBLICAS SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

RESIDENTE DE OBRA



T. (449) 9137737

Pabellón de Arteaga 104 col San José del Arenal
Cp 20130 Aguascalientes Ags

NUMEROS GENERADORES

NO. DE OBRA:	FISMDF 028/2022
NO. DE CONTRATO:	FISMDF 028/2022
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE CALLE A BASE DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS
UBICACIÓN:	CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE LA CARRETERA AGUASCALIENTES LORETO Y CALLE

ESTIMACIÓN NO. 1


No.

CROQUIS

3

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO

CORTE DE MATERIAL EXISTENTE POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO I Y II EN CAJONES A CIELO ABIERTO RESPECTANDO NIVELES DE PROYECTO, DEPOSITANDO EL MATERIAL DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISIÓN, MEDIDO EN TERRENO NATURAL (COMPACTO).

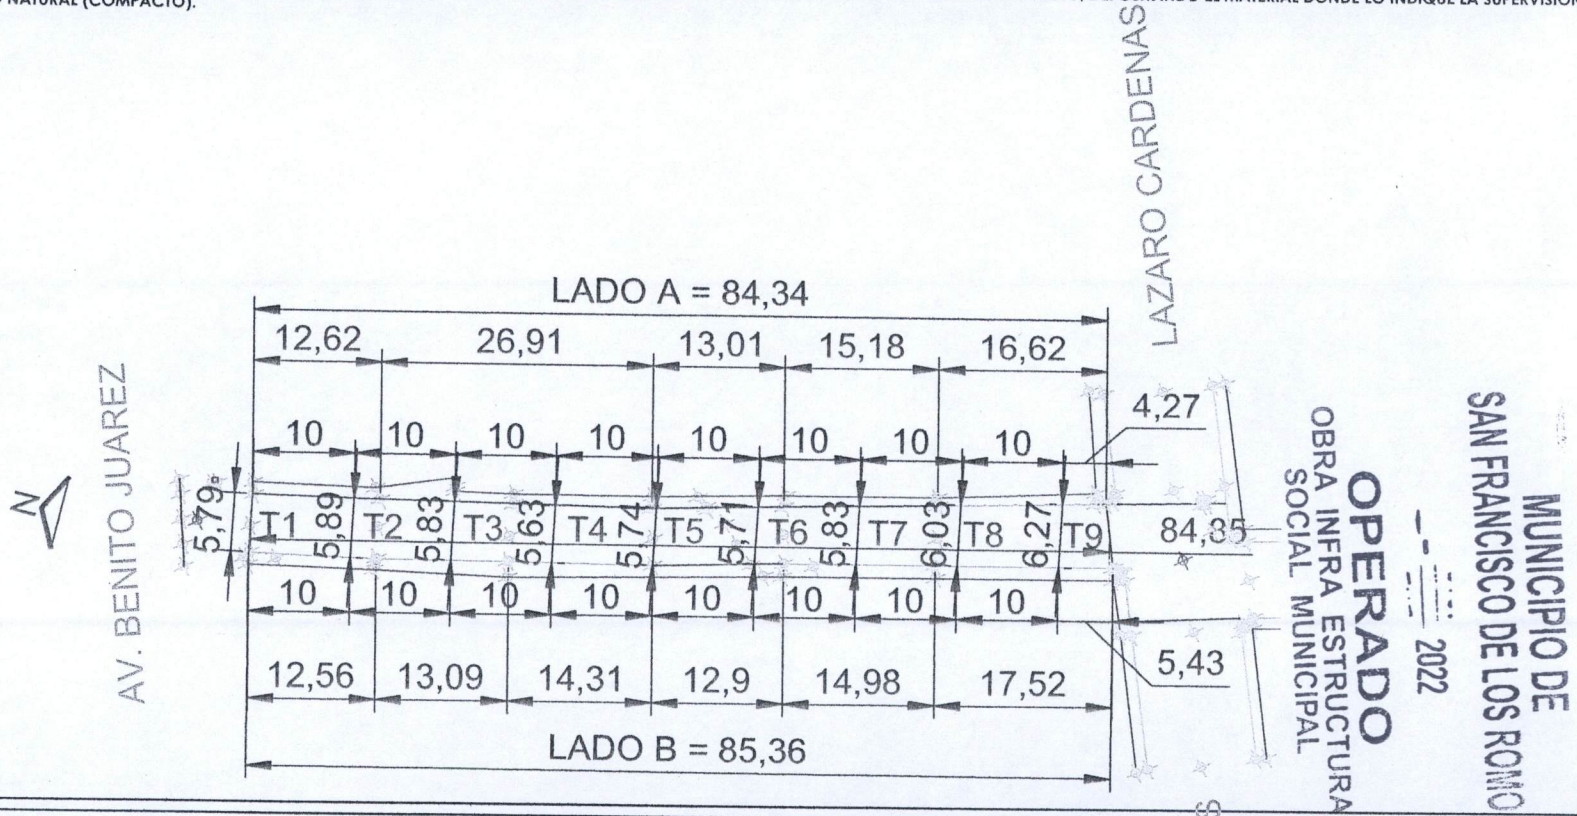

OBSERVACIONES :

SUPERVISOR DE OBRA

I.C. CARLOS ARMANDO CHAVEZ GARCIA
OBRAS PUBLICAS SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

RESIDENTE DE OBRA



T. (449) 9137737

Pabellón de Arteaga 104 col San José del Arenal
Cp 20130 Aguascalientes Ags


NUMEROS GENERADORES

NO. DE OBRA:	FISMDF 028/2022
NO. DE CONTRATO:	FISMDF 028/2022
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE CALLE A BASE DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUILLOS
UBICACIÓN:	CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE LA CARRETERA AGUASCALIENTES LORETO Y CALLE

E S T I M A C I O N N O 1

No. **CROQUIS**

3 DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO
CORTE DE MATERIAL EXISTENTE POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO I Y II EN CAJONES A CIELO ABIERTO RESPETANDO NIVELES DE PROYECTO, DEPOSITANDO EL MATERIAL DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISIÓN, MEDIDO EN TERRENO NATURAL (COMPACTO).

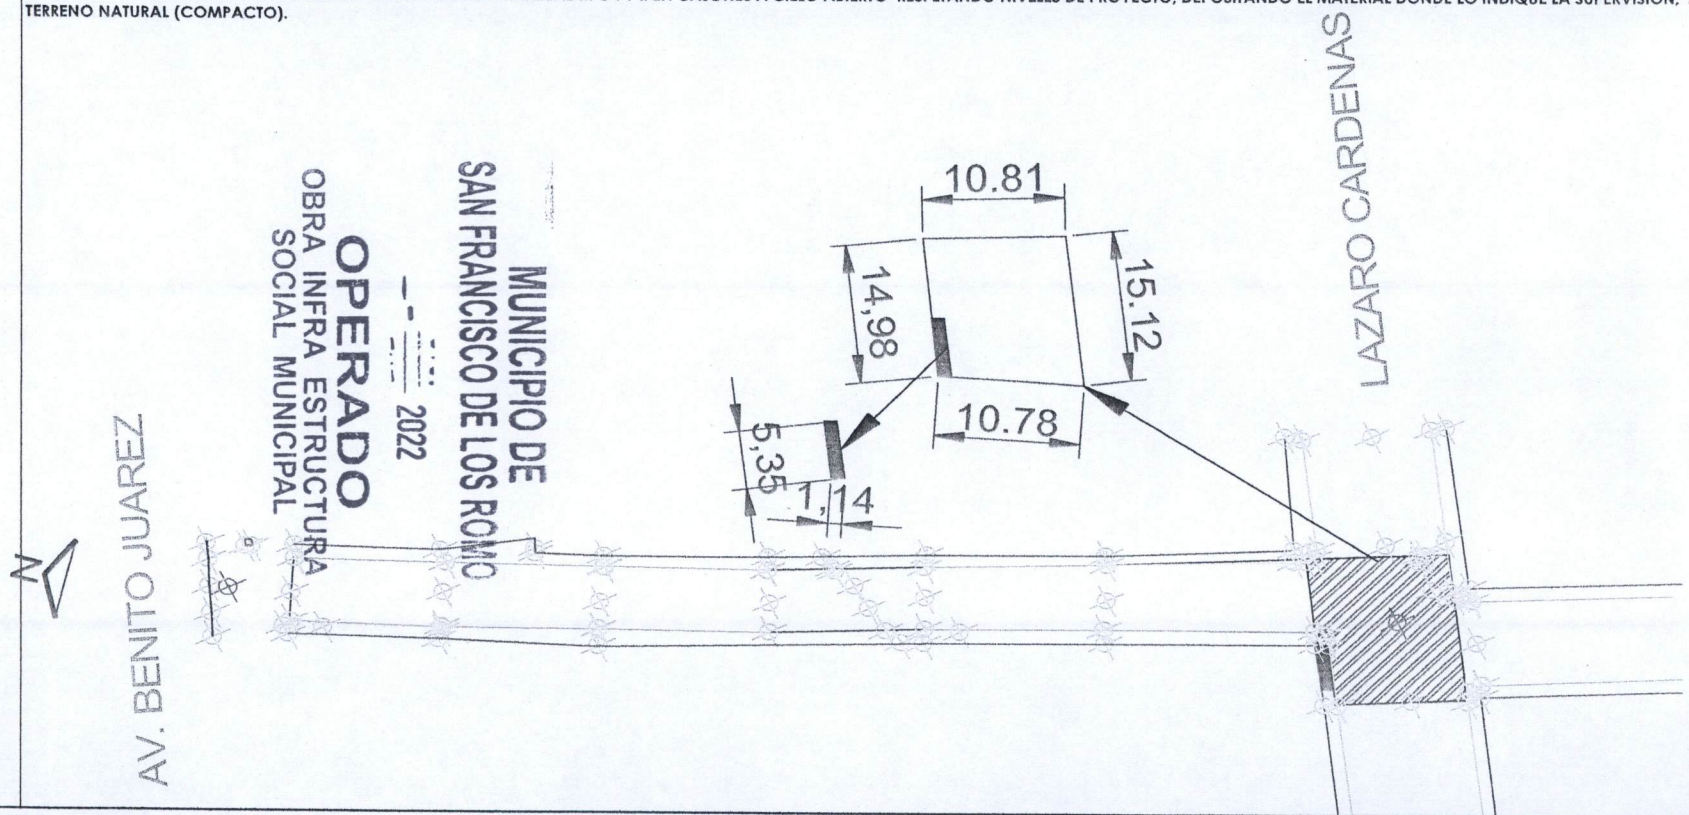

OBSERVACIONES :

SUPERVISOR DE OBRA
I.C. CARLOS ARMANDO CHAVEZ GARCIA
OBRAS PUBLICAS SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

RESIDENTE DE OBRA



T. (449) 9137737

Pabellón de Arteaga 104 cól San José del Arenal
Cp 20130 Aguascalientes Ags

NUMEROS GENERADORES


NO. DE OBRA:	FIS MDF 028/2022
NO. DE CONTRATO:	FIS MDF 028/2022
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE CALLE A BASE DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS
UBICACIÓN:	CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE LA CARRETERA AGUASCALIENTES LORETO Y CALLE

ESTIMACIÓN NO. 1

No.

FOTOGRAFÍAS

3 DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO
 CORTE DE MATERIAL EXISTENTE POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO I Y II EN CAJONES A CIELO ABIERTO RESPECTANDO NIVELES DE PROYECTO, DEPOSITANDO EL MATERIAL DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISIÓN, MEDIDO EN TERRENO NATURAL (COMPACTO).

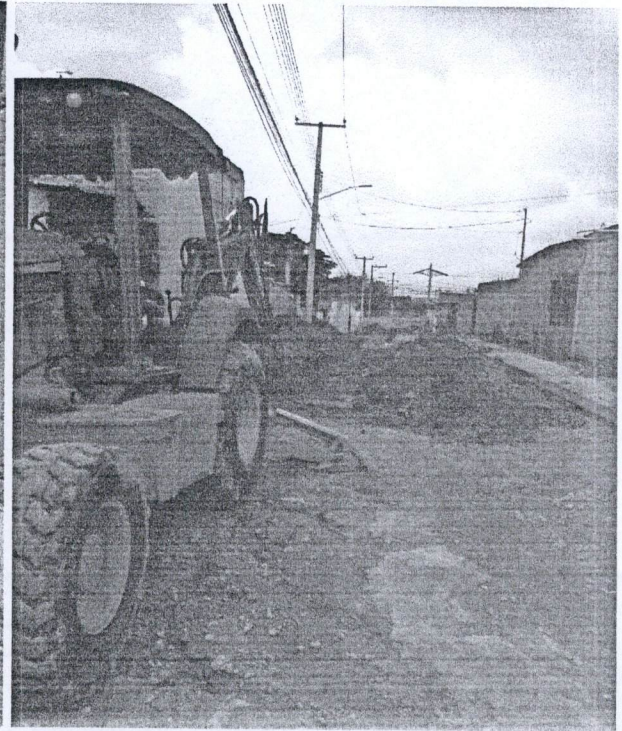


MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 2022
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

OBSERVACIONES :

SUPERVISOR DE OBRA
I.C. CARLOS ARMANDO CHAVEZ GARCIA
 OBRAS PUBLICAS SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

RESIDENTE DE OBRA





T. (449) 9137737

Pabellón de Arteaga 104 col San José del Arenal
Cp 20130 Aguascalientes Ags

NUMEROS GENERADORES


NO. DE OBRA:	FISDMF 028/2022
NO. DE CONTRATO:	FISDMF 028/2022
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE CALLE A BASE DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS
UBICACIÓN:	CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE LA CARRETERA AGUASCALIENTES LORETO Y C

ESTIMACIÓN NO. 1

No. CROQUIS

4 DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO
CONFORMACION DE PLANTILLA POR MEDIOS MECANICOS DEL TERRENO NATURAL AL 95% DE SU PVSM . INCLUYE: ESCARIFICACION, MANIOBRAS, HUMEDECIDO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO, LIMPIEZAS.

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 2022

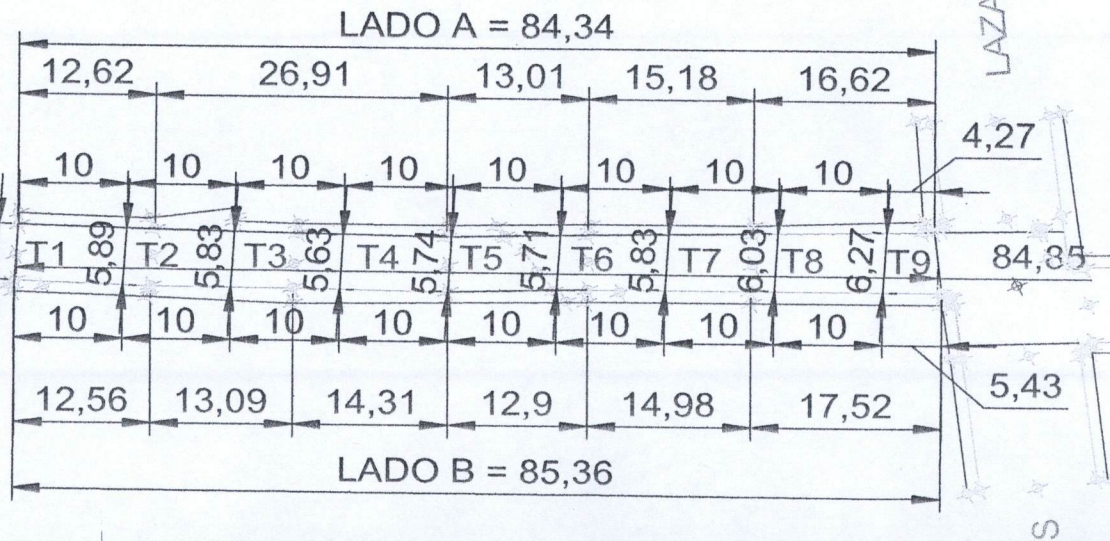

OBSERVACIONES :

SUPERVISOR DE OBRA
I.C. CARLOS ARMANDO CHAVEZ GARCIA
 OBRAS PUBLICAS SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

RESIDENTE DE OBRA



T. (449) 9137737

Pabellón de Arteaga 104 col San José del Arenal
Cp 20130 Aguascalientes Ags


NUMEROS GENERADORES

NO. DE OBRA:	FISMDF 028/2022
NO. DE CONTRATO:	FISMDF 028/2022
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE CALLE A BASE DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUILLO
UBICACIÓN:	CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE LA CARRETERA AGUASCALIENTES LORETO Y C

ESTIMACION NO. 1

No. CROQUIS

4 DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO
 CONFORMACION DE PLANTILLA POR MEDIOS MECANICOS DEL TERRENO NATURAL AL 95% DE SU PVSM . INCLUYE: ESCARIFICACION, MANIOBRAS, HUMEDECIDO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO, LIMPIEZAS.

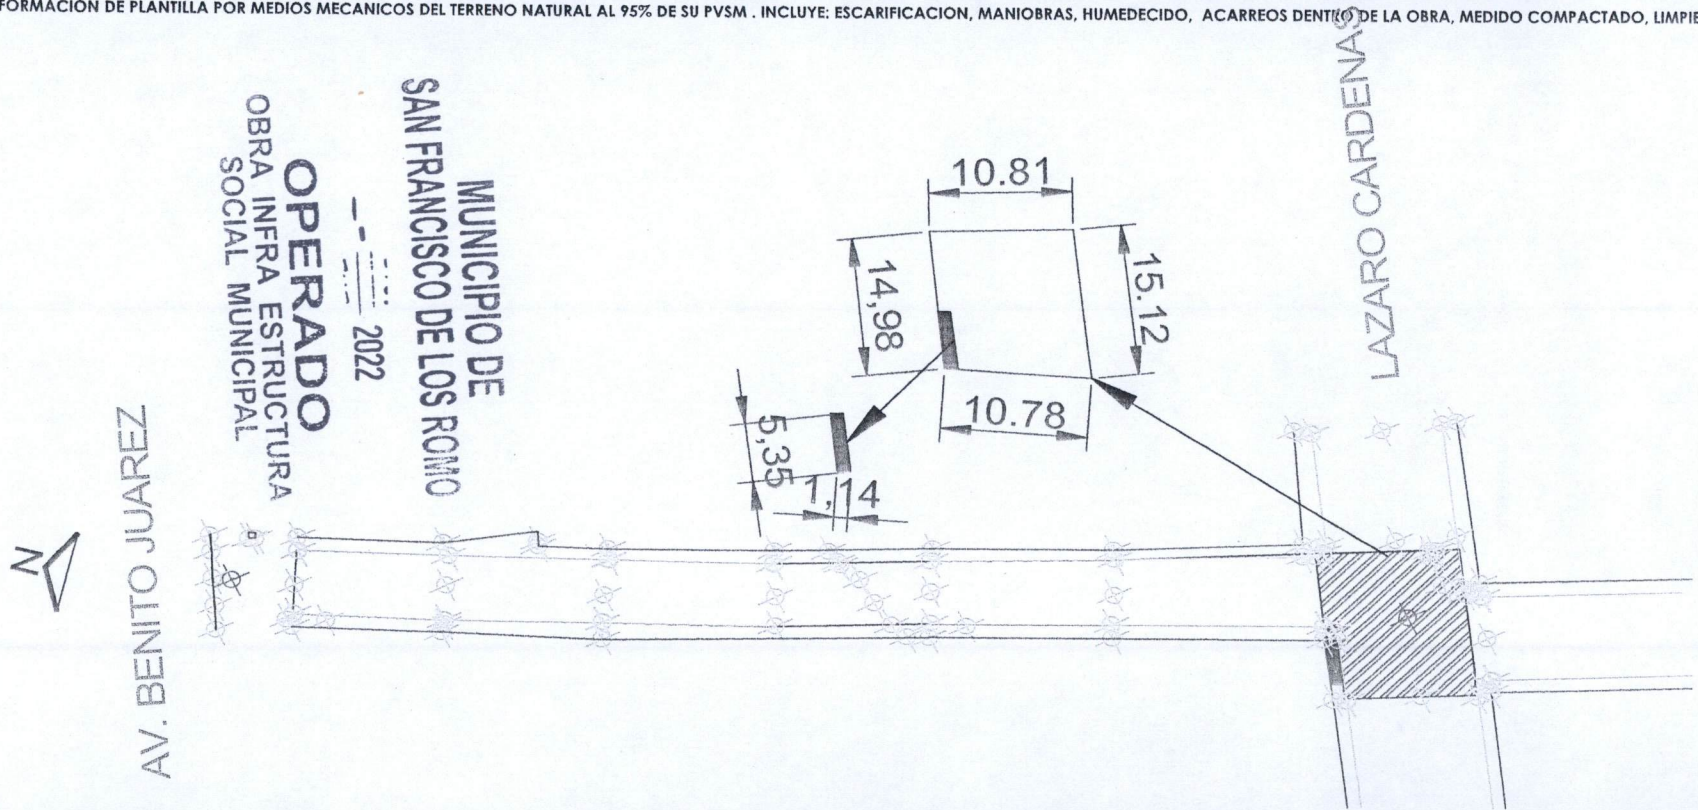

OBSERVACIONES :

SUPERVISOR DE OBRA
I.C. CARLOS ARMANDO CHAVEZ GARCIA
 OBRAS PUBLICAS SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

RESIDENTE DE OBRA



T. (449) 9137737

Pabellón de Arteaga 104 col San José del Arenal
Cp 20130 Aguascalientes Ags

NUMEROS GENERADORES

NO. DE OBRA:

FISDMF 028/2022

NO. DE CONTRATO:

FISDMF 028/2022

DESCRIPCIÓN:

REHABILITACIÓN DE CALLE A BASE DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS

UBICACIÓN:

CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE LA CARRETERA AGUASCALIENTES LORETO Y CALLE

ESTIMACIÓN NO. 1



No.

FOTOGRAFÍAS

4

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO

CONFORMACION DE PLANTILLA POR MEDIOS MECANICOS DEL TERRENO NATURAL AL 95% DE SU PVSM . INCLUYE: ESCARIFICACION, MANIOBRAS, HUMEDECIDO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO, LIMPIEZAS.

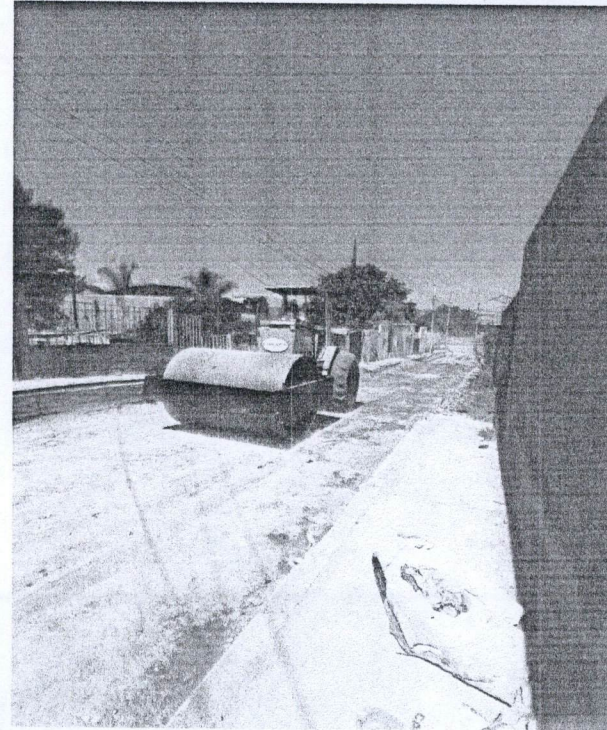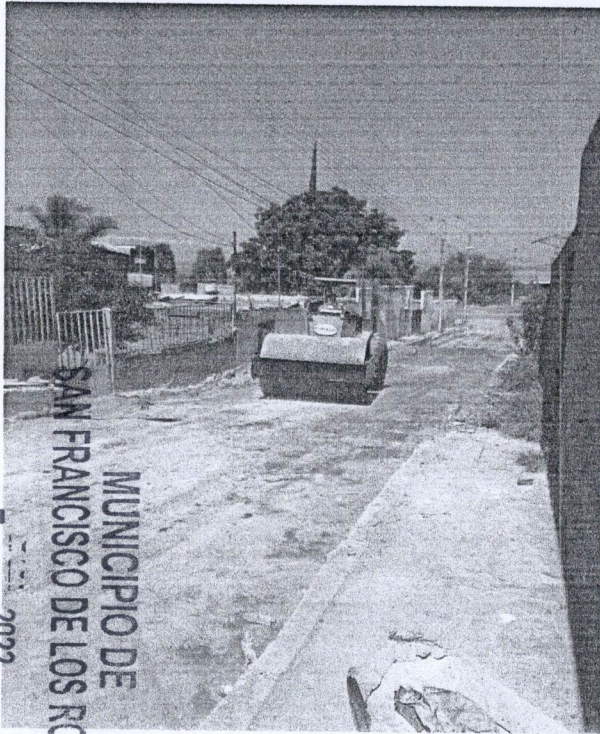

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
2022

OBSERVACIONES :

SUPERVISOR DE OBRA
I.C. CARLOS ARMANDO CHAVEZ GARCIA
OBRAS PUBLICAS SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

RESIDENTE DE OBRA



T. (449) 9137737

Pabellón de Arteaga 104 col San José del Arenal
Cp 20130 Aguascalientes Ags

NUMEROS GENERADORES

NO. DE OBRA:	FISMDF 028/2022
NO. DE CONTRATO:	FISMDF 028/2022
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE CALLE A BASE DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQL
UBICACIÓN:	CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE LA CARRETERA AGUASCALIENTES LORETO Y C

ESTIMACION NO. 1

No.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	AVANGE	TOTAL	CROQUIS	FOTOGRAFIA	
			EJE	TRAMO	TIPO									
5	CONSTRUCCIÓN DE SUB RASANTE A BASE DE TEPETATE, COMPACTADA AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR, EN PROPORCION, VRS DEL MATERIAL 50%, INCLUYE: MANIOBRAS, AGUA NECESARIA, EXTENDIDO DE MATERIAL, CONFORMACION, NIVELADO, SELECCION DE MATERIAL, AGUA LA NECESARIA, LIMPIEZAS.	M3				84.85	5.91	0.225	1.0		112.83	ANEXO A = 657.90 Vol = 657.90m ² * 0.20m vol = 131.58m ³		
LARGO														
		LADO A		84.34					0.20					
		LADO B		85.36										
		PROMEDIO A Y B		84.85										
ANCHO														
ANCHO A CADA 10 MTS														
		P1	5.79	PROMEDIO ANCHOS										
		P2	5.89	T1	5.84									
		P3	5.83	T2	5.86									
		P4	5.75	T3	5.79									
		P5	5.74	T4	5.745									
		P6	5.71	T5	5.725									
		P7	5.83	T6	5.77									
		P8	6.03	T7	5.93									
		P9	6.27	T8	6.15									
		P10	6.49	T9	6.38									
		PROMEDIO TOTAL =			5.91									
CRUCERO						10.80	15.05	0.225	1.0		36.57			
LARGO						5.35	1.14	0.225	-1.0		-1.37			
		LADO A		10.78										
		LADO B		10.81										
		PROMEDIO A Y B		10.80										
ANCHO														
		LADO C		14.98										
	LADO D		15.12											
	PROMEDIO A Y B		15.05											
TOTAL =											149.03			

OPERADO
 OBRA INFRA ESTRUCTURA
 SOCIAL MUNICIPAL
 2022

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 MUNICIPIO DE

OBSERVACIONES :

SUPERVISOR DE OBRA
 I.C. CARLOS ARMANDO CHAVEZ GARCIA
 OBRAS PUBLICAS SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

RESIDENTE DE OBRA



T. (449) 9137737

Pabellón de Arteaga 104 col San José del Arenal
Cp 20130 Aguascalientes Ags

NUMEROS GENERADORES

NO. DE OBRA:	FISMDF 028/2022
NO. DE CONTRATO:	FISMDF 028/2022
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE CALLE A BASE DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS
UBICACIÓN:	CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE LA CARRETERA AGUASCALIENTES LORETO Y CARRANZA


ESTIMACION NO. 1

CROQUIS

5 DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO
 CONSTRUCCIÓN DE SUB RASANTE A BASE DE TEPETATE, COMPACTADA AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR, EN PROPORCION, VRS DEL MATERIAL 50%. INCLUYE: MANIOBRAS, AGUA NECESARIA, EXTENDIDO DE MATERIAL, CONFORMACION, NIVELADO, SELECCION DE MATERIAL, AGUA LA NECESARIA, LIMPIEZAS.

OPERADO
 OBRA INFRA ESTRUCTURA
 SOCIAL MUNICIPAL
 2022

MUNICIPIO DE
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

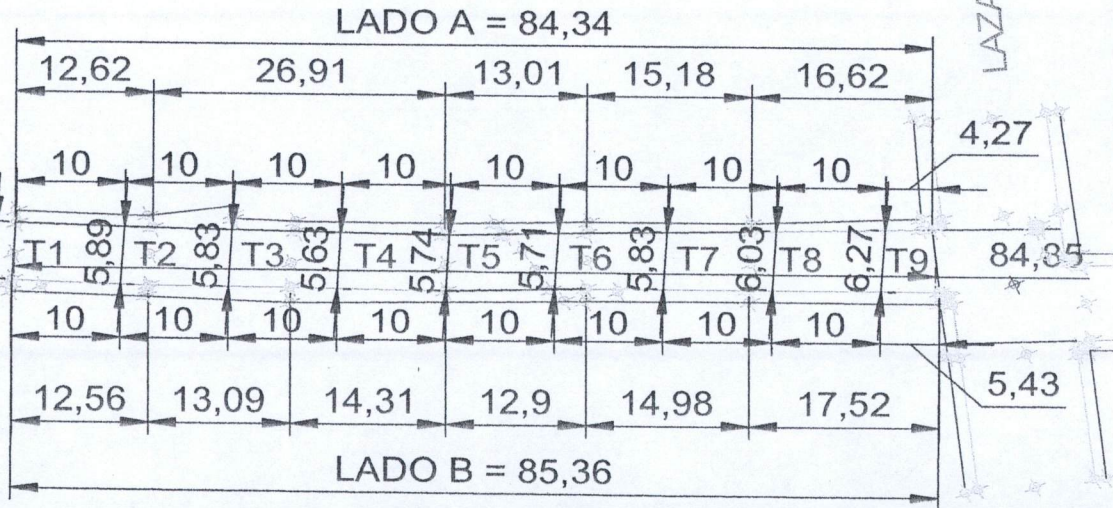

OBSERVACIONES :

SUPERVISOR DE OBRA
 I.C. CARLOS ARMANDO CHAVEZ GARCIA
 OBRAS PUBLICAS SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

RESIDENTE DE OBRA



T. (449) 9137737

Pabellón de Arteaga 104 col San José del Arenal
Cp 20130 Aguascalientes Ags

NUMEROS GENERADORES

NO. DE OBRA:

FISDMF 028/2022

NO. DE CONTRATO:

FISDMF 028/2022

DESCRIPCIÓN:

REHABILITACIÓN DE CALLE A BASE DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUILLO

UBICACIÓN:

CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE LA CARRETERA AGUASCALIENTES LORETO Y CALLE

ESTIMACION NO. 1


No.

CROQUIS

5

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO

CONSTRUCCIÓN DE SUB RASANTE A BASE DE TEPETATE, COMPACTADA AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR, EN PROPORCION, VRS DEL MATERIAL 50%, INCLUYE: MANIOBRAS, AGUA NECESARIA, EXTENDIDO DE MATERIAL, CONFORMACION, NIVELADO, SELECCION DE MATERIAL, AGUA LA NECESARIA, LIMPIEZAS.

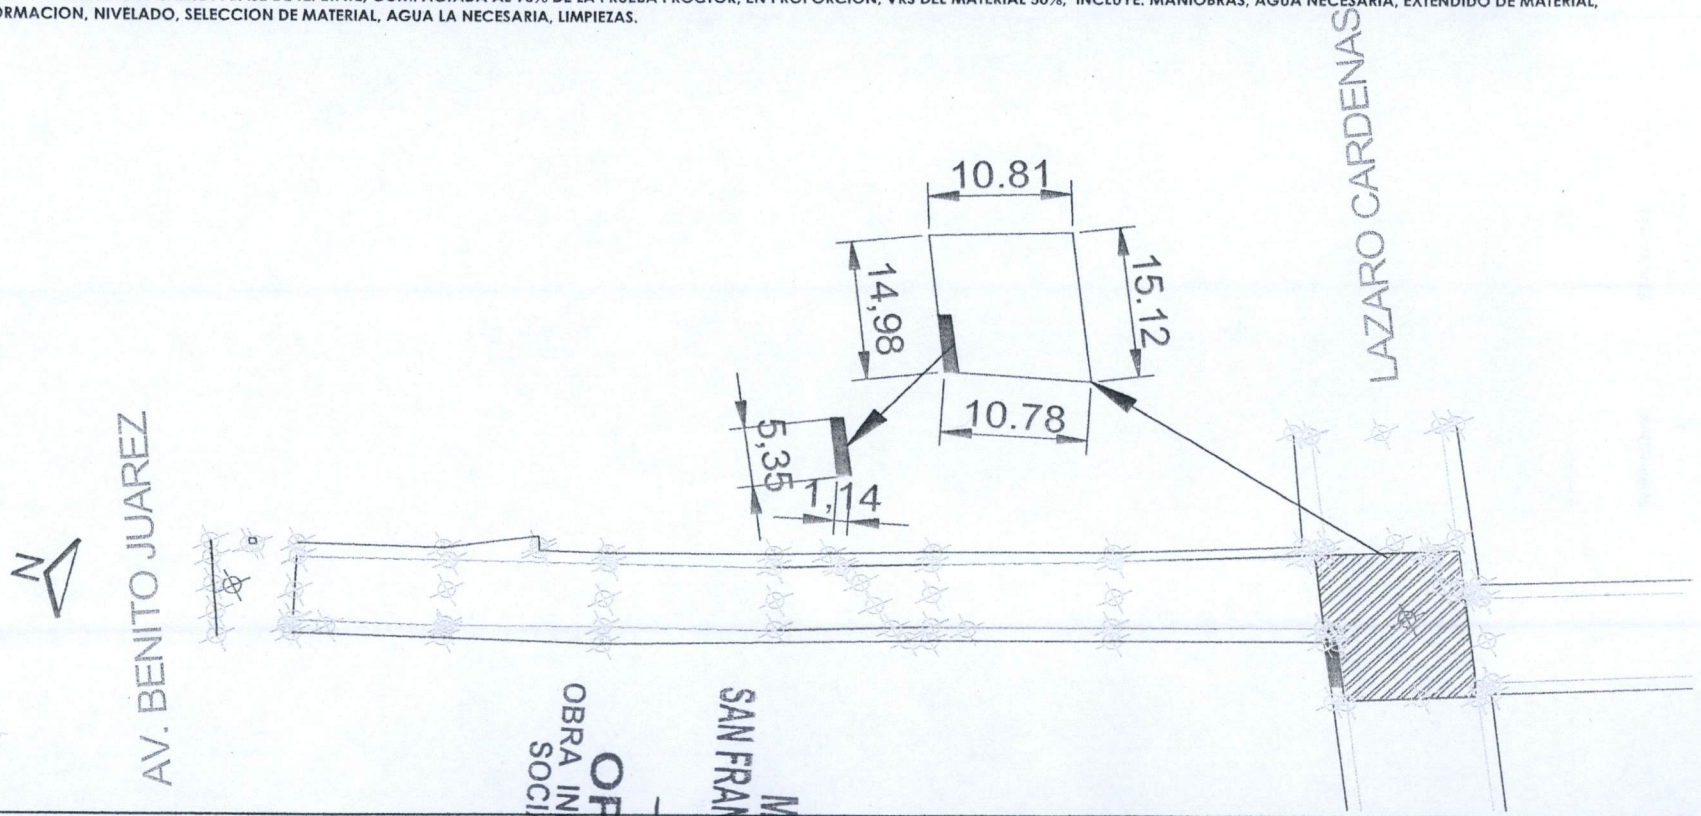

OBSERVACIONES :

SUPERVISOR DE OBRA
I.C. CARLOS ARMANDO CHAVEZ GARCIA
OBRAS PUBLICAS SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

RESIDENTE DE OBRA

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
OPERA DO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

2022



T. (449) 9137737

Pabellón de Arteaga 104 col San José del Arenal
Cp 20130 Aguascalientes Ags


NUMEROS GENERADORES

NO. DE OBRA:	FISMDF 028/2022
NO. DE CONTRATO:	FISMDF 028/2022
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE CALLE A BASE DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUILLO
UBICACIÓN:	CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE LA CARRETERA AGUASCALIENTES LORETO Y C

ESTIMACION NO. 1

FOTOGRAFÍAS

5 DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO
 CONSTRUCCIÓN DE SUB RASANTE A BASE DE TEPETATE, COMPACTADA AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR, EN PROPORCION, VRS DEL MATERIAL 50%, INCLUYE: MANIOBRAS, AGUA NECESARIA, EXTENDIDO DE MATERIAL, CONFORMACION, NIVELADO, SELECCION DE MATERIAL, AGUA LA NECESARIA, LIMPIEZAS.

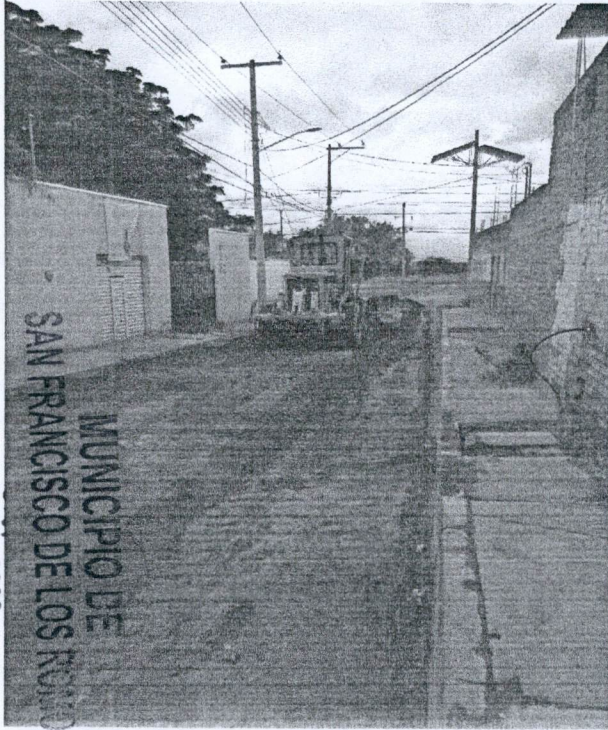

OPERADO
 OBRA INFRA ESTRUCTURA
 SOCIAL MUNICIPAL
 2022

MUNICIPIO DE
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

OBSERVACIONES :

SUPERVISOR DE OBRA
 I.C. CARLOS ARMANDO CHAVEZ GARCIA
 OBRAS PUBLICAS SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

RESIDENTE DE OBRA



T. (449) 9137737

Pabellón de Arteaga 104 col San José del Arenal
Cp 20130 Aguascalientes Ags

NUMEROS GENERADORES

NO. DE OBRA:	FISMDF 028/2022
NO. DE CONTRATO:	FISMDF 028/2022
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE CALLE A BASE DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUILLO
UBICACIÓN:	CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE LA CARRETERA AGUASCALIENTES LORETO Y C

ESTIMACION NO. 1


No.

CROQUIS

6 DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO
 CONSTRUCCIÓN DE SUB-BASE CON TEPETATE, COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR, VRS 50%, INCLUYE: MANIOBRAS, AGUA NECESARIA, EXTENDIDO DE MATERIAL, CONFORMACION, NIVELADO, SELECCION DE MATERIAL, AGUA LA NECESARIA, LIMPIEZAS.

OPERADO
 OBRA INFRA ESTRUCTURAS
 SOCIAL MUNICIPAL
 2022

MUNICIPIO DE
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

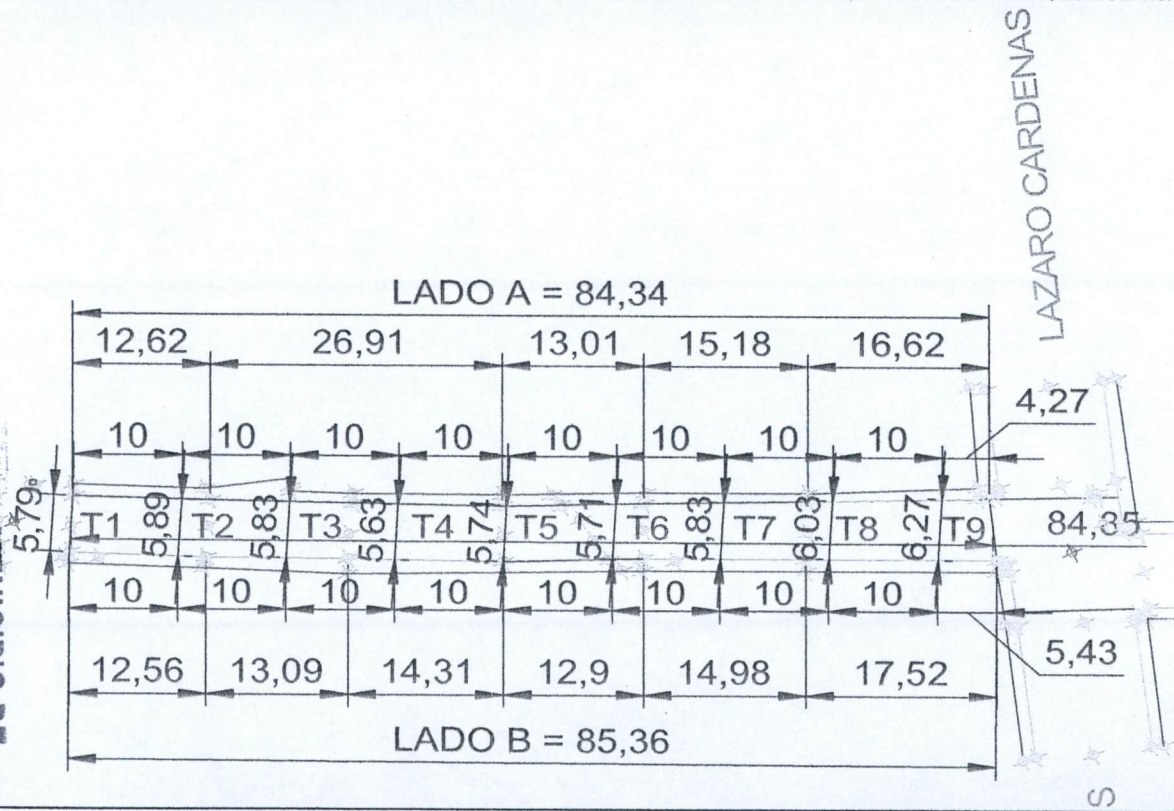

OBSERVACIONES :

SUPERVISOR DE OBRA
 I.C. CARLOS ARMANDO CHAVEZ GARCIA
 OBRAS PUBLICAS SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

RESIDENTE DE OBRA



T. (449) 9137737

Pabellón de Arteaga 104 col San José del Arenal
Cp 20130 Aguascalientes Ags

NUMEROS GENERADORES


NO. DE OBRA:	FISMDF 028/2022
NO. DE CONTRATO:	FISMDF 028/2022
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE CALLE A BASE DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUÍAS
UBICACIÓN:	CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE LA CARRETERA AGUASCALIENTES LORETO Y C

ESTIMACIÓN NO. 1

No.

CROQUIS

6 DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO
 CONSTRUCCIÓN DE SUB-BASE CON TEPETATE, COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR, VRS 50%, INCLUYE: MANIOBRAS, AGUA NECESARIA, EXTENDIDO DE MATERIAL, CONFORMACION, NIVELADO, SELECCION DE MATERIAL, AGUA LA NECESARIA, LIMPIEZAS.

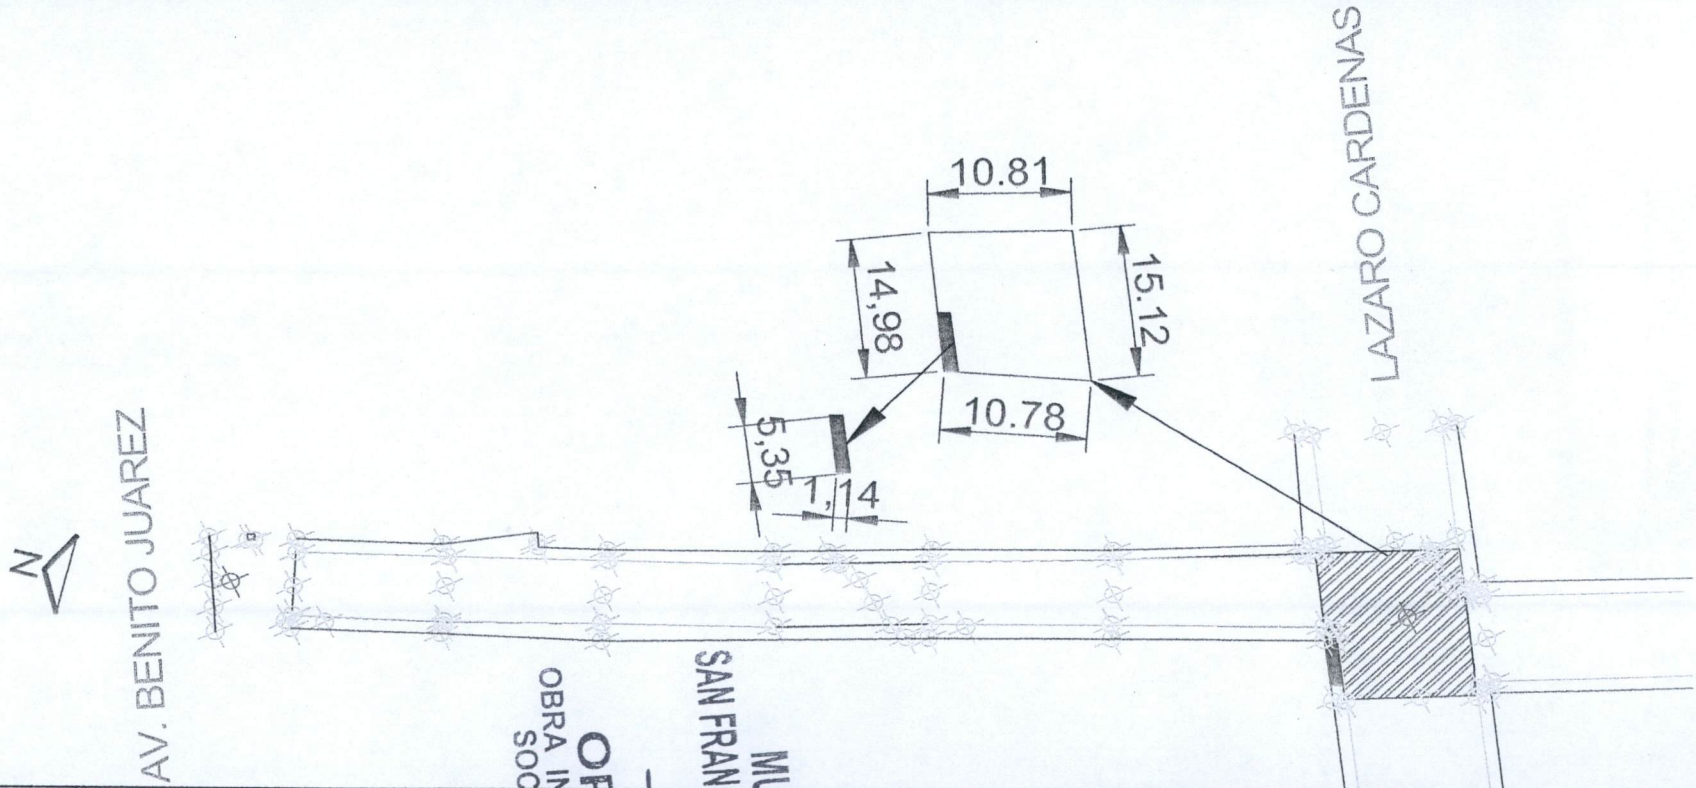

OBSERVACIONES :

SUPERVISOR DE OBRA
 I.C. CARLOS ARMANDO CHAVEZ GARCIA
 OBRAS PUBLICAS SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

OPERADO
 OBRA INFRA ESTRUCTURAL
 SOCIAL MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

2022

RESIDENTE DE OBRA



T. (449) 9137737

Pabellón de Arteaga 104 col San José del Arenal
Cp 20130 Aguascalientes Ags

NUMEROS GENERADORES


NO. DE OBRA:	FISMDF 028/2022
NO. DE CONTRATO:	FISMDF 028/2022
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE CALLE A BASE DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUILLO
UBICACIÓN:	CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE LA CARRETERA AGUASCALIENTES LORETO Y C

ESTIMACION NO. 1

No.

FOTOGRAFIAS

6 DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO
 CONSTRUCCIÓN DE SUB-BASE CON TEPETATE, COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR, VRS 50%, INCLUYE: MANIOBRAS, AGUA NECESARIA, EXTENDIDO DE MATERIAL, CONFORMACION, NIVELADO, SELECCION DE MATERIAL, AGUA LA NECESARIA, LIMPIEZAS.

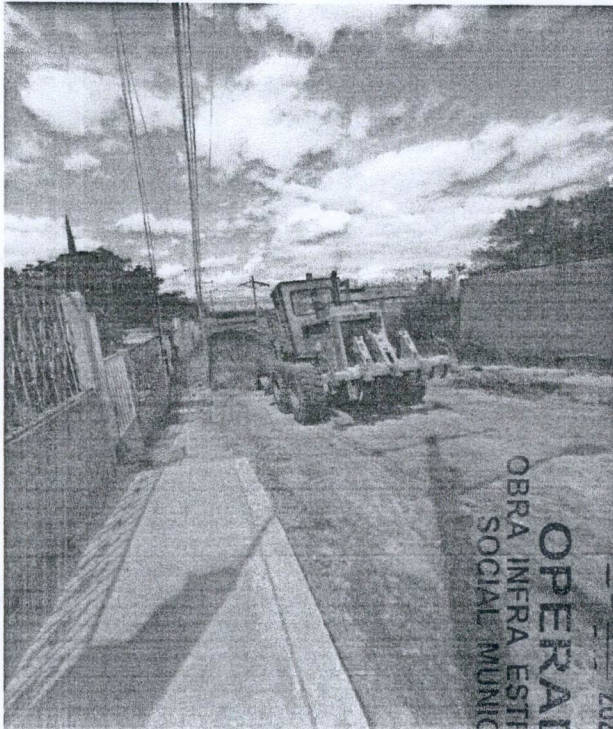

OPERADO
 OBRA INFRA ESTRUCTURA
 SOCIAL MUNICIPAL

2022



MUNICIPIO DE
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

OBSERVACIONES :

SUPERVISOR DE OBRA
 I.C. CARLOS ARMANDO CHAVEZ GARCIA
 OBRAS PUBLICAS SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

RESIDENTE DE OBRA



T. (449) 9137737

Pabellón de Arteaga 104 col San José del Arenal
Cp 20130 Aguascalientes Ags

NUMEROS GENERADORES

NO. DE OBRA:

FISMDF 028/2022

NO. DE CONTRATO:

FISMDF 028/2022

DESCRIPCIÓN:

REHABILITACIÓN DE CALLE A BASE DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS

UBICACIÓN:

CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE LA CARRETERA AGUASCALIENTES LORETO Y CALLE

ESTIMACIÓN NO. 1

No.


CROQUIS

7

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO

CARGA MECÁNICA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE ESCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO AL 1er. KM, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.

OPERADO
 OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
 SOCIAL MUNICIPAL
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 MUNICIPIO DE
 ZAVAJÓN JUÁREZ
 AV. BENITO JUÁREZ
 2022

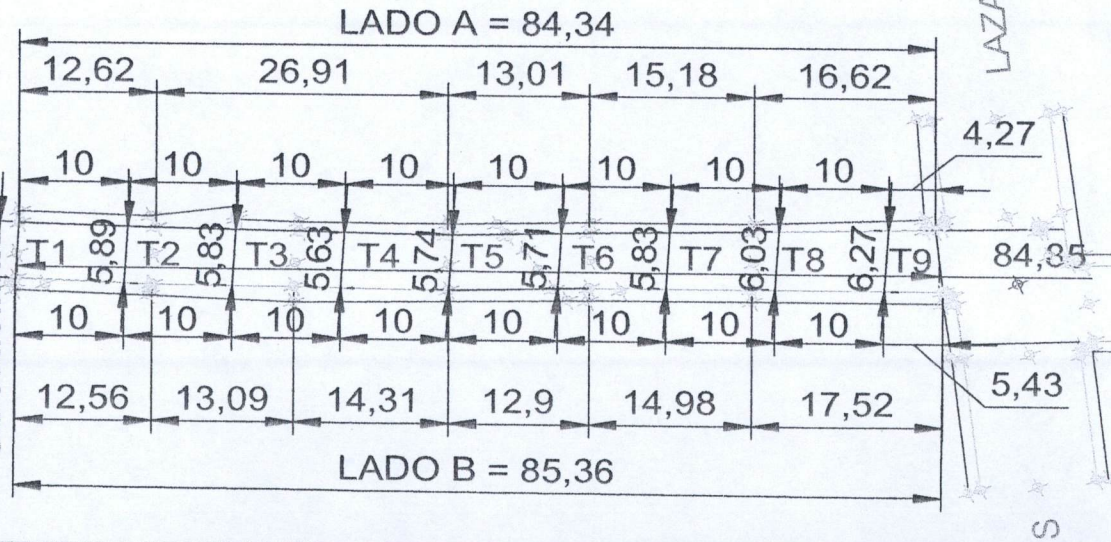

OBSERVACIONES :

SUPERVISOR DE OBRA
I.C. CARLOS ARMANDO CHAVEZ GARCIA
OBRAS PUBLICAS SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

RESIDENTE DE OBRA



T. (449) 9137737

Pabellón de Arteaga 104 col San José del Arenal
Cp 20130 Aguascalientes Ags

NUMEROS GENERADORES


NO. DE OBRA:	FISMDF 028/2022
NO. DE CONTRATO:	FISMDF 028/2022
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE CALLE A BASE DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS
UBICACIÓN:	CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE LA CARRETERA AGUASCALIENTES LORETO Y CALLE

ESTIMACION NO. 1

No.

CROQUIS

7 DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO
CARGA MECÁNICA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE ESCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO AL 1er. KM, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.

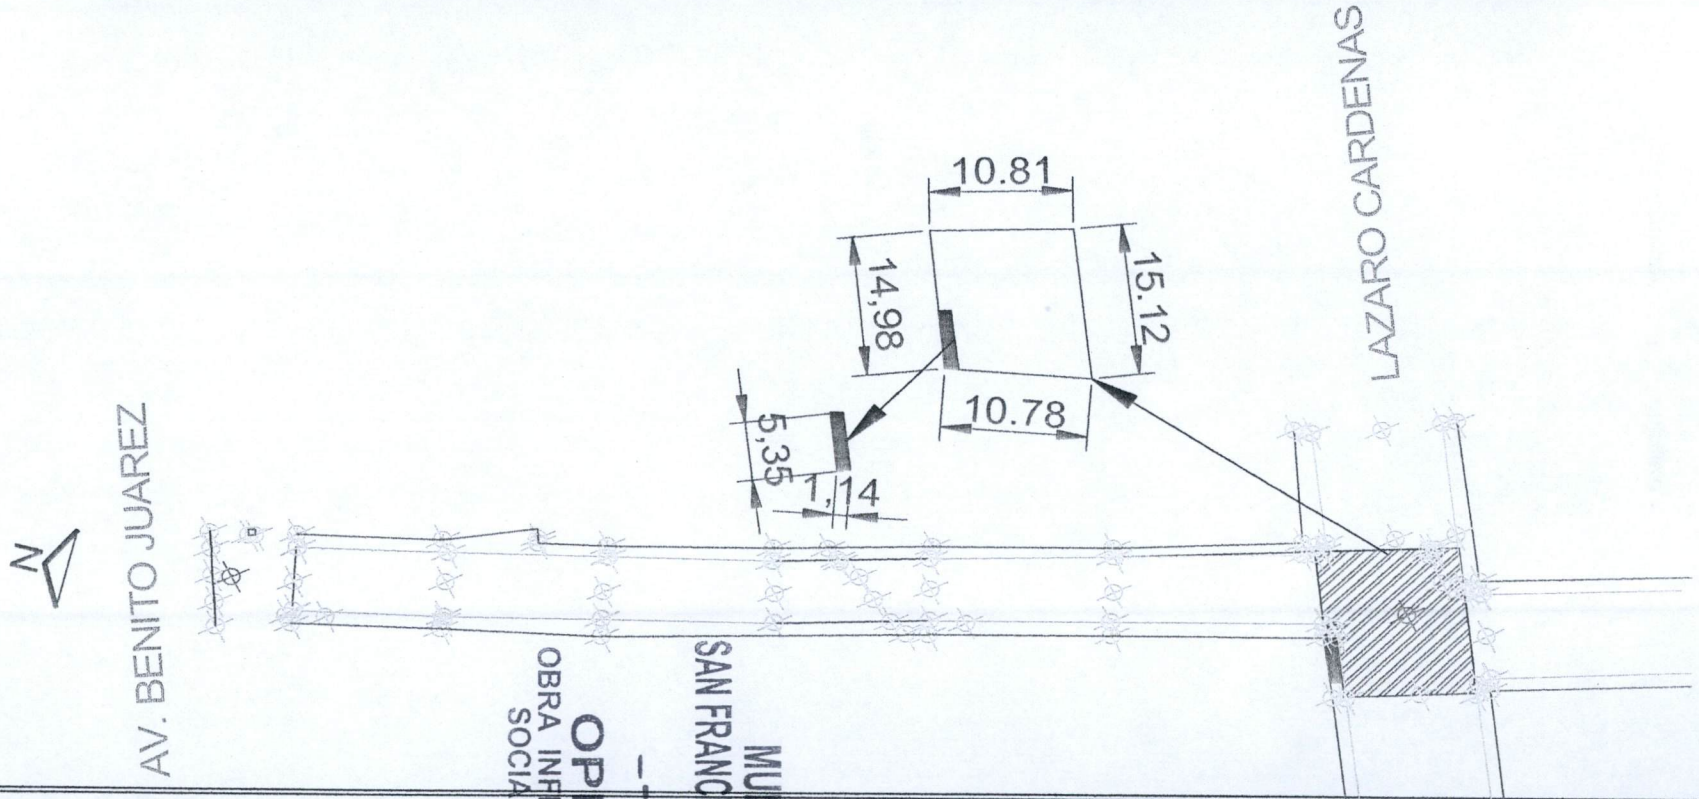

OBSERVACIONES :

SUPERVISOR DE OBRA
I.C. CARLOS ARMANDO CHAVEZ GARCIA
OBRAS PUBLICAS SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

2022

RESIDENTE DE OBRA

NUMEROS GENERADORES

NO. DE OBRA:	FISMDF 028/2022
NO. DE CONTRATO:	FISMDF 028/2022
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE CALLE A BASE DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUILLOS
UBICACIÓN:	CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE LA CARRETERA AGUASCALIENTES LORETO Y CALLE

ESTIMACIÓN NO. 1

No.

FOTOGRAFÍAS

7 DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO
CARGA MECÁNICA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE ESCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO AL 1er. KM, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.



MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL
2022

OBSERVACIONES :

SUPERVISOR DE OBRA
I.C. CARLOS ARMANDO CHAVEZ GARCIA
OBRAS PUBLICAS SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

RESIDENTE DE OBRA



T. (449) 9137737

Pabellón de Arteaga 104 col San José del Arenal
Cp 20130 Aguascalientes Ags


NUMEROS GENERADORES

NO. DE OBRA:	FISMDF 028/2022
NO. DE CONTRATO:	FISMDF 028/2022
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE CALLE A BASE DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUILLO
UBICACIÓN:	CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE LA CARRETERA AGUASCALIENTES LORETO Y C

ESTIMACIÓN NO. 1

CROQUIS

8 DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO
ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES AL TIRADERO OFICIAL AUTORIZADO MÁS CERCANO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.

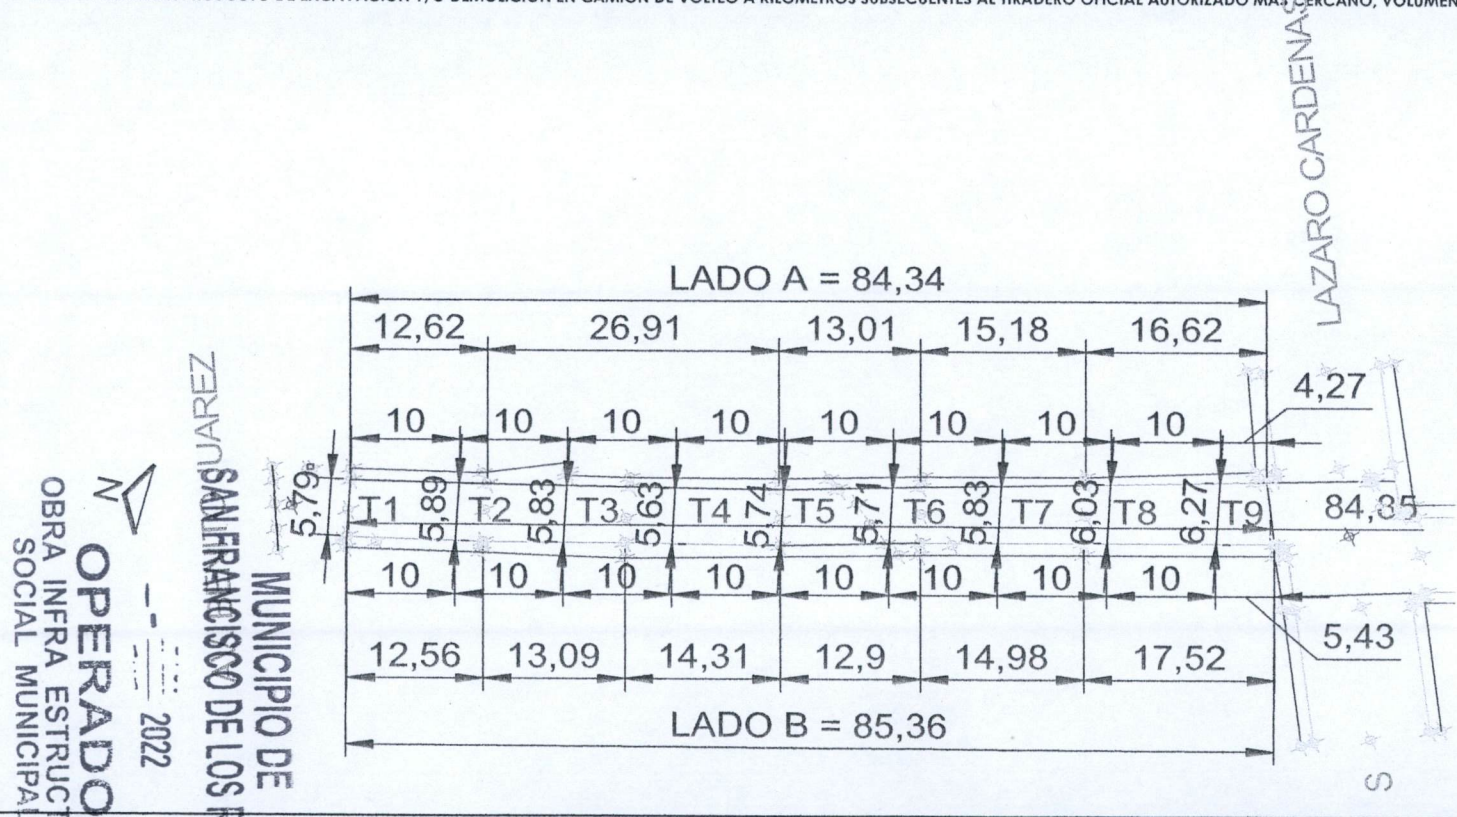

OBSERVACIONES :

SUPERVISOR DE OBRA
I.C. CARLOS ARMANDO CHAVEZ GARCIA
OBRAS PUBLICAS SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

RESIDENTE DE OBRA



T. (449) 9137737

Pabellón de Arteaga 104 col San José del Arenal
Cp 20130 Aguascalientes Ags

NUMEROS GENERADORES

NO. DE OBRA:

FISMDF 028/2022

NO. DE CONTRATO:

FISMDF 028/2022

DESCRIPCIÓN:

REHABILITACIÓN DE CALLE A BASE DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUÍAS

UBICACIÓN:

CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE LA CARRETERA AGUASCALIENTES LORETO Y CALLE

ESTIMACIÓN NO. 1


No.

CROQUIS

8

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO

ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES AL TIRADERO OFICIAL AUTORIZADO MÁS CERCANO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.

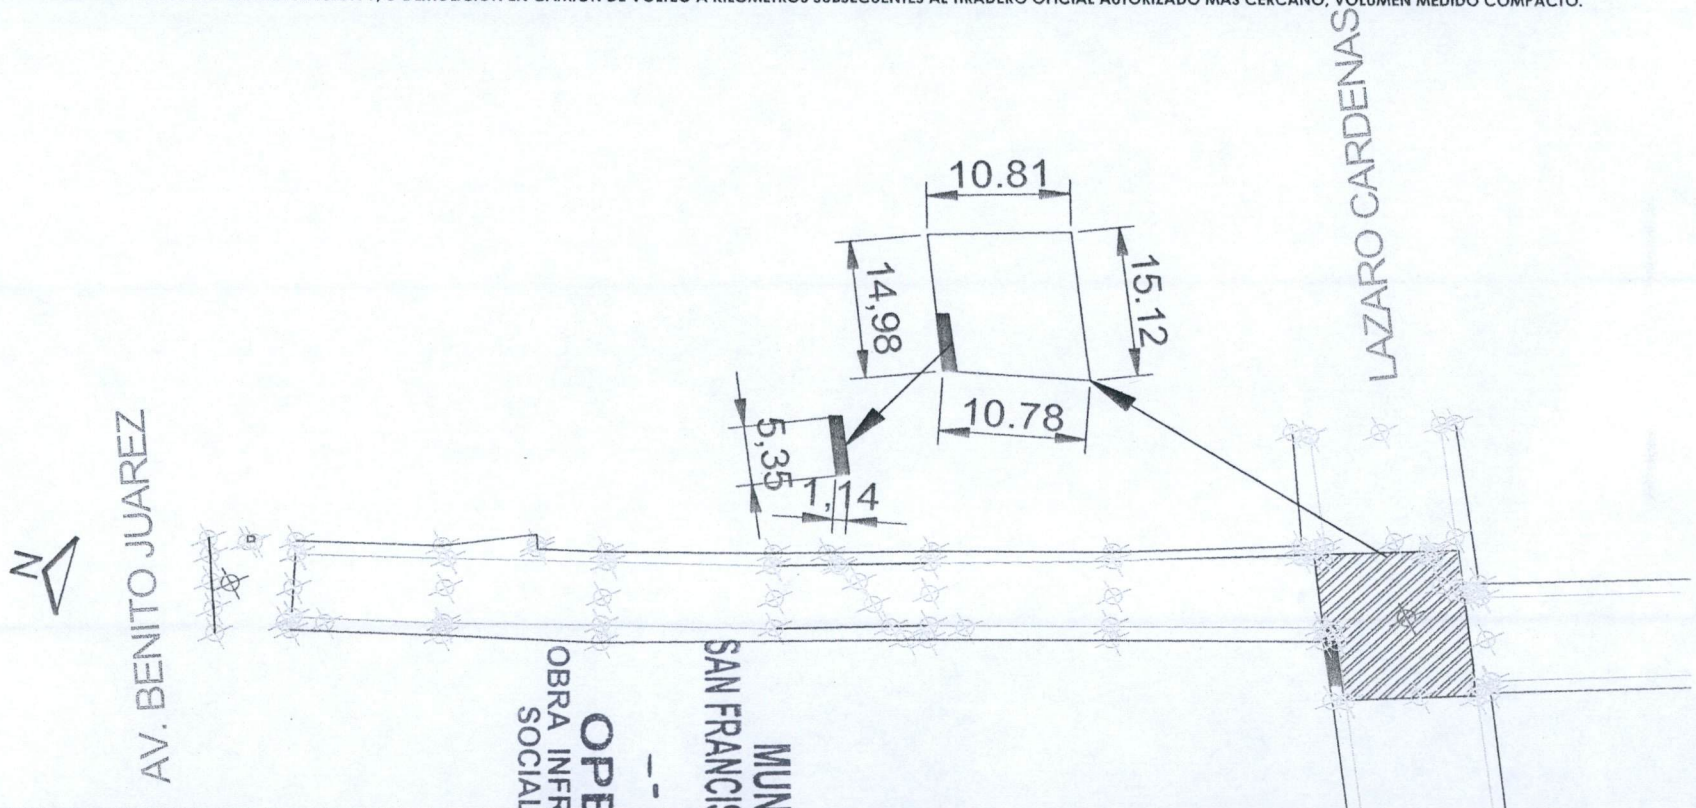

OBSERVACIONES :

SUPERVISOR DE OBRA

I.C. CARLOS ARMANDO CHAVEZ GARCIA
OBRAS PUBLICAS SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

2022

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

RESIDENTE DE OBRA

Equipe de Obra S. de C. V.



T. (449) 9137737

Pabellón de Arteaga 104 col San José del Arenal
Cp 20130 Aguascalientes Ags

NÚMEROS GENERADORES

NO. DE OBRA:

FISMDF 028/2022

NO. DE CONTRATO:

FISMDF 028/2022

DESCRIPCIÓN:

REHABILITACIÓN DE CALLE A BASE DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUILLOS

UBICACIÓN:

CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE LA CARRETERA AGUASCALIENTES LORETO Y CALLE

ESTIMACIÓN NO. 1

No.

FOTOGRAFÍAS

8

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO

ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES AL TIRADERO OFICIAL AUTORIZADO MÁS CERCANO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.



MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL
2022

OBSERVACIONES

SUPERVISOR DE OBRA

I.C. CARLOS ARMANDO CHAVEZ GARCIA
OBRAS PUBLICAS SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

RESIDENTE DE OBRA

BITÁCORA DE OBRA

HOJA _____

CONTRATO FISMDF 028/2022

OBRA FISMDF 028/2022

Nota

04 / octubre 2022

Con esta fecha se concluye la revisión del resumen y número generadores de obra correspondiente a la extinción (Lmd) con periodo del 02 de Septiembre del 2022 al 16 de Septiembre del 2022. Se adjunta bajo la siguiente Estructura:

Monto base	\$ 127,109.75
Amortización Anticipo (E)	\$ 63,884.88
Subtotal con I.V.A	\$ 73,723.65
Referencias (I)	\$ 1,271.10
Total a pagar	\$ 72,452.55

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
2022
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL
