


## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

**Obra:** IEA PMSFR 001/2024 PRIMARIA GENERAL JOSE EFREN GARCIA ESPARZA - PRIMARIA GENERAL GERARDO MARIN MARTINEZ  
**Ubicación:** FRACC. CEDROS, CABECERA MUNICIPAL      **Contrato:** IEA PMSFR 001/2024  
**Tipo de inversión:** CONVENIO DE COLABORACIÓN Y APOYO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA      **Contratista:** ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  
**Programa:**      **Inicio Vigente:** martes, 27 de febrero de 2024      **Días de Obra:** 30 días  
**Subprograma:** 01 b) RECONSTRUCCION      **Inicio Real:** martes, 27 de febrero de 2024      **Monto Contratado:** \$ 1,328,822.46  
**Residente:** ARQ. LUIS FERNANDO MARTINEZ REYES      **Fin Vigente:** miércoles, 27 de marzo de 2024      **Monto Ejercido:** \$ 1,328,822.46  
**Fin Real:** martes, 12 de marzo de 2024

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	23/02/2024	0.00%	0.00%	49.6%
2	01/03/2024	19.54%	41.87%	49.6%
3	08/03/2024	40.79%	87.40%	90.5%
4	15/03/2024	62.04%	100.00%	100.0%
5	22/03/2024	95.54%	100.00%	100.0%
6	29/03/2024	100.00%	100.00%	100.0%

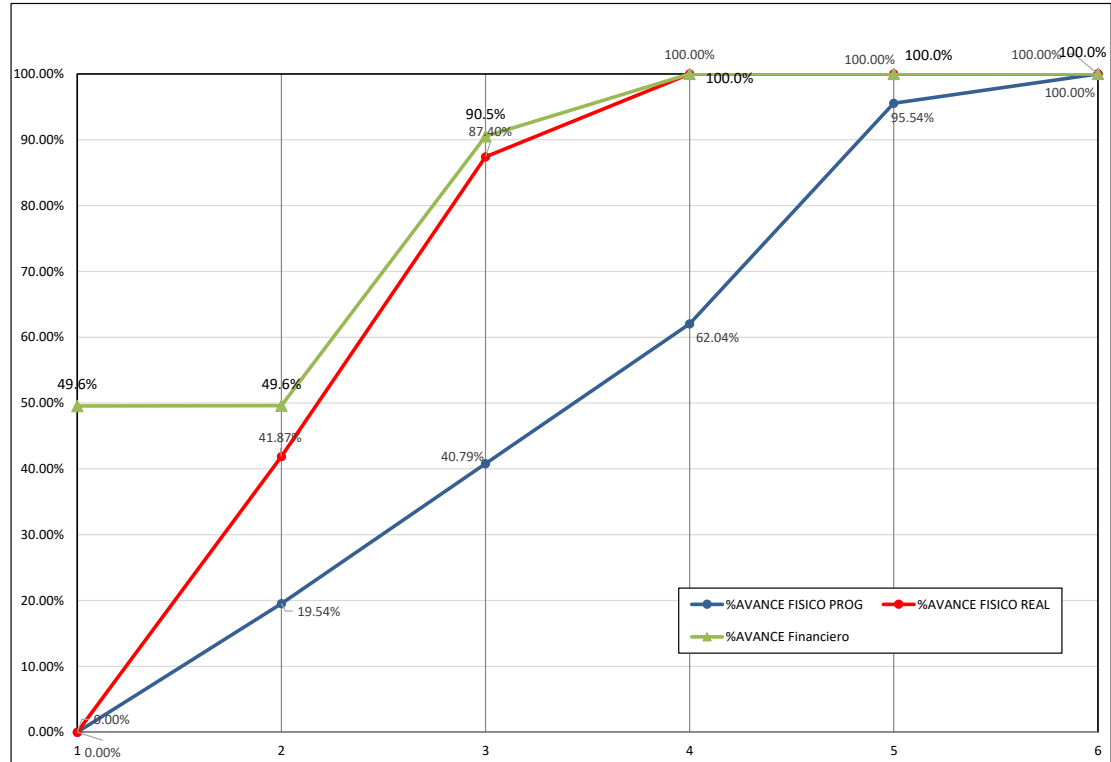

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
