


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra:	IEA PMSFR 003/2024 CERCO PERIMETRAL Y MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE PRIMARIA GENERAL VICENTA TRUJILLO				
Ubicación:	PUERTECITO DE LA VIRGEN, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO,	Contrato:	IEA PMSFR 003/2024		
Tipo de inversión:	CONVENIO DE COLABORACIÓN Y APOYO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Contratista:	ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		
Programa:		Inicio Vigente:	viernes, 16 de febrero de 2024	Días de Obra:	30 días
Subprograma:	01 RECONSTRUCCIÓN b) PRIMARIA 02 CONSTRUCCIÓN b) PRIMARIA	Inicio Real:	viernes, 16 de febrero de 2024	Monto Contratado:	\$ 925,129.41
Residente:	ARQ. LUIS FERNANDO MARTINEZ REYES	Fin Vigente:	sábado, 16 de marzo de 2024	Monto Ejercido:	\$ 925,129.41
		Fin Real:	martes, 12 de marzo de 2024		

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	15/02/2024	0.00%	0.00%	49.5%
2	22/02/2024	10.74%	12.88%	49.5%
3	29/02/2024	49.98%	59.97%	49.5%
4	07/03/2024	82.10%	98.52%	92.4%
5	14/03/2024	97.13%	100.00%	99.1%
6	21/03/2024	100.00%	100.00%	100.0%

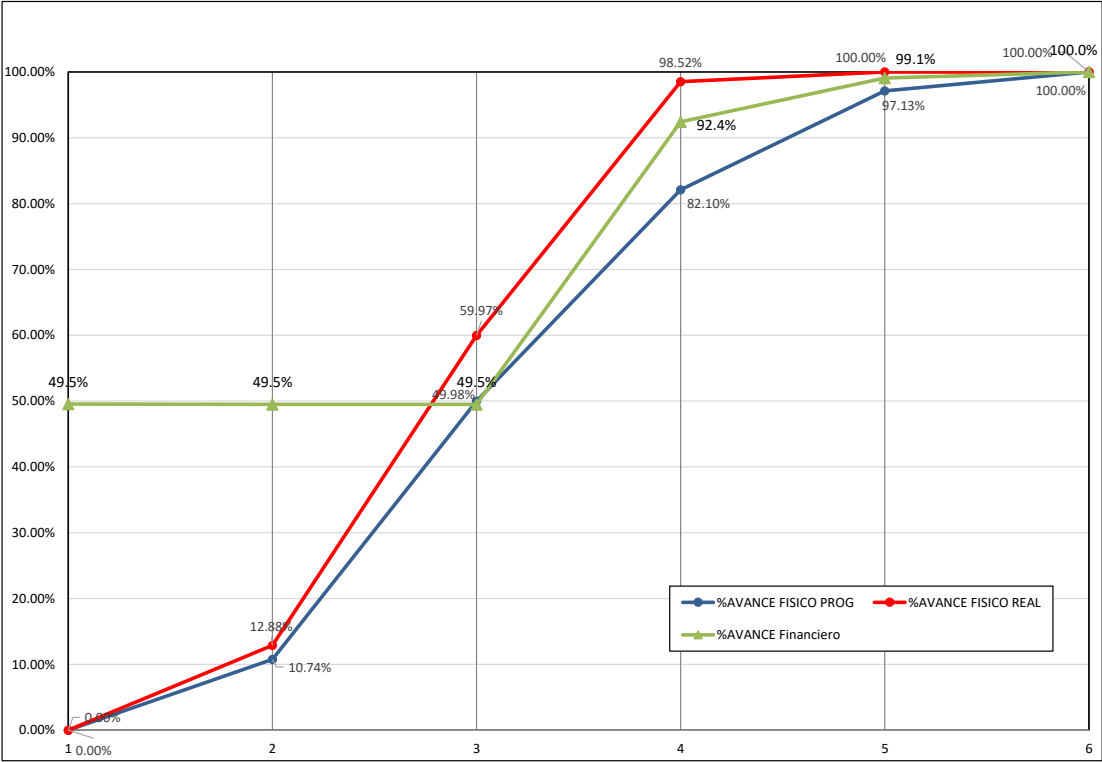

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
