

## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

**Obra:** IEA PMSFR 004/2024 PRIMARIA GENERAL AGUSTIN MELGAR

**Ubicación:** CIRCUITO ESCUELAS, LA CONCEPCIÓN

**Contrato:** IEA PMSFR 004/2024

**Tipo de inversión:** CONVENIO DE COLABORACIÓN Y APOYO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**Contratista:** MAOFRE GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.

**Programa:** 01 b) RECONSTRUCCION

**Inicio Vigente:** martes, 27 de febrero de 2024

**Días de Obra:** 30 días

**Subprograma:** 01 b) RECONSTRUCCION

**Inicio Real:** martes, 27 de febrero de 2024

**Monto Contratado:** \$ 1,255,749.34


**Residente:** ARQ. LUIS FERNANDO MARTINEZ REYES

**Fin Vigente:** miércoles, 27 de marzo de 2024

**Monto Ejercido:** \$ 1,255,749.34

**Fin Real:** martes, 12 de marzo de 2024

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	23/02/2024	0.00%	0.00%	49.5%
2	01/03/2024	4.84%	10.37%	49.5%
3	08/03/2024	16.86%	85.62%	83.1%
4	15/03/2024	54.36%	100.00%	100.0%
5	22/03/2024	84.94%	100.00%	100.0%
6	29/03/2024	100.00%	100.00%	100.0%

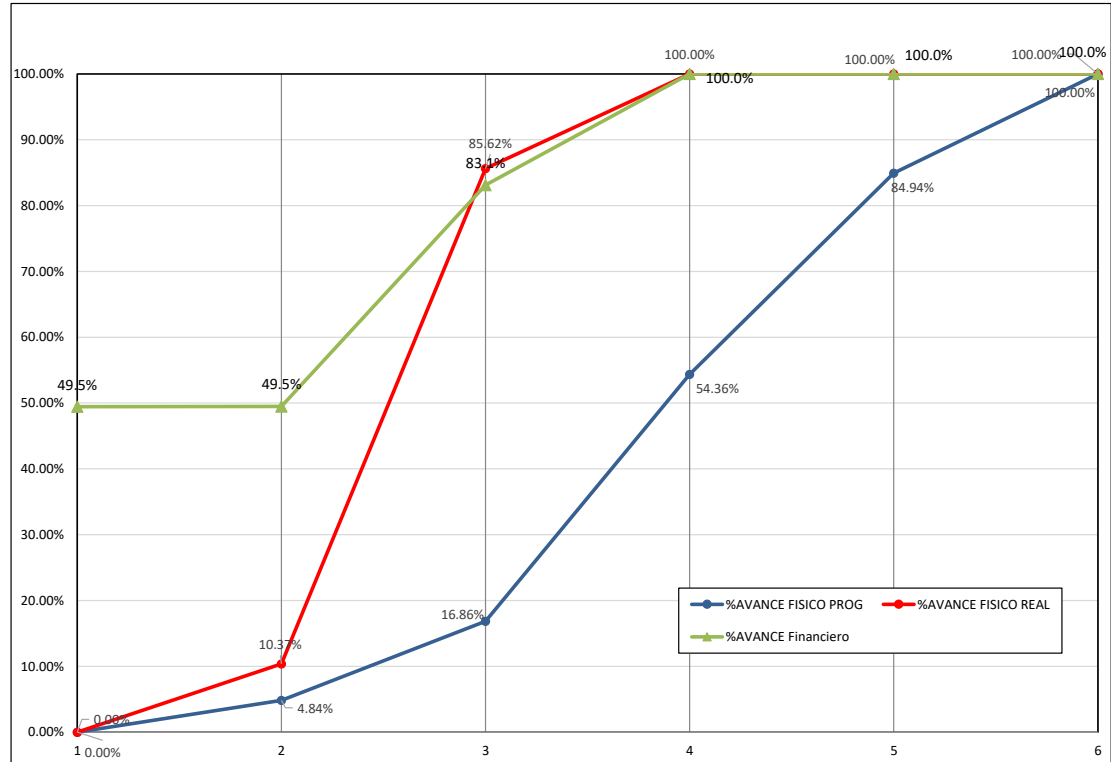

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
