


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

| | | | | | |
|---------------------------|--|------------------------|--|--------------------------|--------------------|
| Obra: | IP 001 B/2024 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - TRAMITE DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, PERITO RESPONSABLE DE 18 OBRAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO (CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA). | | | | |
| Ubicación: | SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | Contrato: | IP 001 B/2024 | | |
| Tipo de inversión: | IP INGRESOS PROPIOS 2024 | Contratista: | INGENIERIA PROYECTO Y CONTROL DE OBRA, S. DE R.L. DE C.V., | | |
| Programa: | U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DES. REG. | Inicio Vigente: | sábado, 27 de enero de 2024 | Días de Obra: | 30 |
| Subprograma: | 03 SERVICIOS | Inicio Real: | sábado, 27 de enero de 2024 | Monto Contratado: | \$63,735.55 |
| Residente: | ING. MIGUEL ANGEL SILVA SERNA | Fin Vigente: | domingo, 25 de febrero de 2024 | Monto Ejercido: | \$63,735.55 |
| | | Fin Real: | domingo, 25 de febrero de 2024 | | |

| SEMANA | FECHA | %AVANCE FISICO PROG | %AVANCE FISICO REAL | %AVANCE Financiero |
|--------|------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 30/01/2024 | 4.55% | 4.55% | 0.0% |
| 2 | 06/02/2024 | 51.67% | 51.67% | 0.0% |
| 3 | 13/02/2024 | 70.00% | 70.00% | 0.0% |
| 4 | 20/02/2024 | 85.00% | 85.00% | 0.0% |
| 5 | 27/02/2024 | 100.00% | 100.00% | 0.0% |
| 6 | 05/03/2024 | 100.00% | 100.00% | 100.0% |

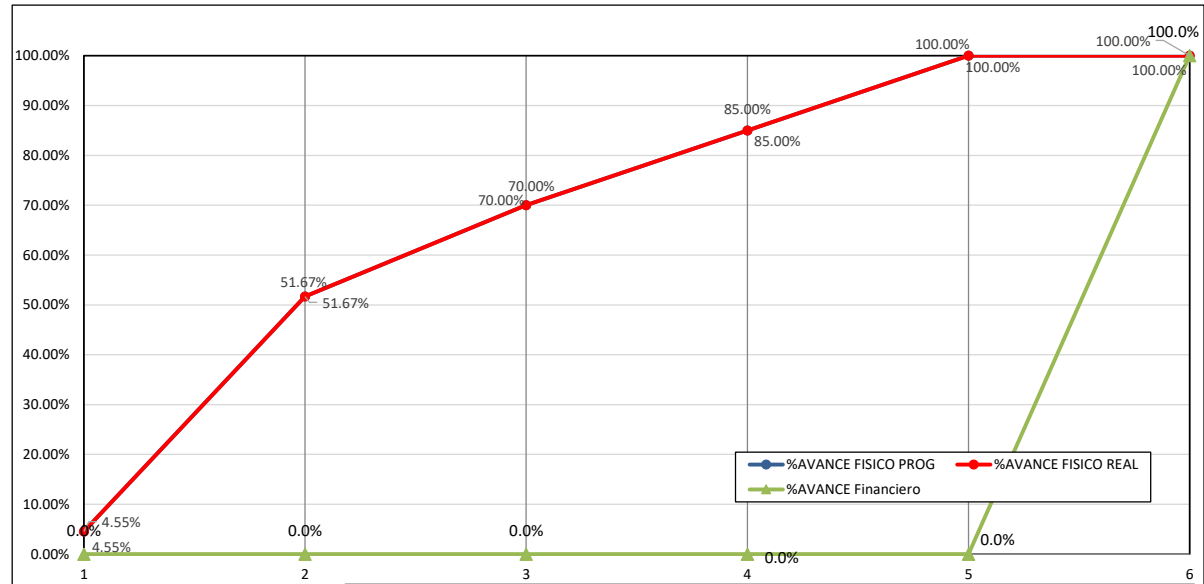

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
