


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra:	PF 001/2024 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, REHABILITACIÓN DE RED DE LINEA DE CONDUCCIÓN, RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y JARDINERÍA			
Ubicación:	SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	Contrato:	PF 001/2024	
Tipo de inversión:	INGRESOS PROPIOS, DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO 2023	Contratista:	DINAMICA ALRO, S.A. DE C.V. ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	
Programa:	SF SE PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES, URBANIZACIÓN SD ALCANTARILLADO SC AGUA POTABLE	Inicio Vigente:	martes, 12 de marzo de 2024	Días de Obra: 60
Subprograma:	01, 03 REHABILITACIÓN, CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS	Inicio Real:	martes, 12 de marzo de 2024	Monto Contratado: \$6,935,764.99
Residente:	ING. MIGUEL ANGEL SILVA SERNA	Fin Vigente:	viernes, 10 de mayo de 2024	Monto Ejercido:
		Fin Real:	viernes, 10 de mayo de 2024	

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	12/03/2024	0.00%	0.00%	50.0%
2	30/03/2024	14.86%	14.88%	50.0%
3	15/04/2024	60.02%		
4	30/04/2024	90.32%		
5	15/05/2024	100.00%		
6	30/05/2024	100.00%		
7	15/06/2024	100.00%		

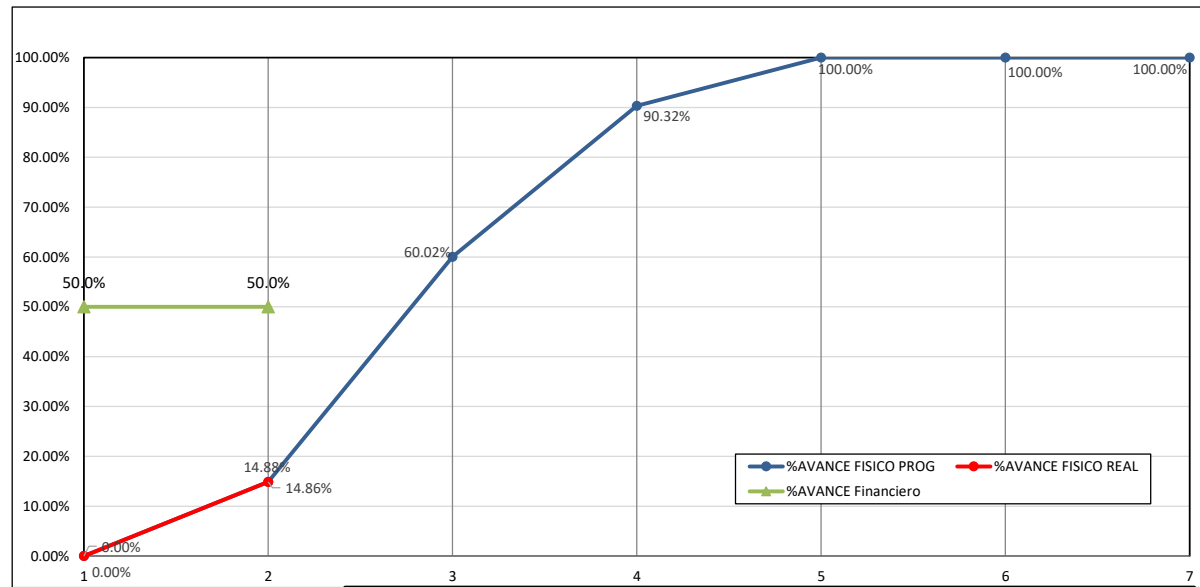

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
