

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FAISMUN 001 005/2024 REHABILITACIÓN DE DESCARGAS SANITARIAS, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ARGENTINA TRAMO DE AV. JUÁREZ A CALLE MÉXICO

Ubicación: REHABILITACIÓN DE DESCARGAS SANITARIAS, REHABILITACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE, TRAMO DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A ESCUELA PRIMARIA REFUGIO MIRANDA AGUAYO SAN FRANCISCO DE LOS ROMO **Contrato:** FAISMUN 001 005/2024

Tipo de inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2024 **Contratista:** MAOFRE GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.


Programa: SF,SE PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES, URBANIZACIÓN **Inicio Vigente:** viernes, 19 de abril de 2024 **Días de Obra:** 60

Subprograma: SD ALCANTARILLADO SC AGUA POTABLE **Inicio Real:** viernes, 19 de abril de 2024 **Monto Contratado:** \$2,531,801.58

Residente: ING. CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA **Fin Vigente:** lunes, 17 de junio de 2024 **Monto Ejercido:**

Fin Real: lunes, 17 de junio de 2024

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	19/04/2024	0.09%	0.10%	50.00%
2	03/05/2024	2.10%	2.12%	50.00%
3	17/05/2024	12.08%	12.10%	50.00%
4	31/05/2024	30.14%	30.16%	66.72%
5	14/06/2024	99.42%	99.44%	94.68%
6	28/06/2024	100.00%		
7	12/07/2024	100.00%		
8	26/07/2024	100.00%		
9	09/08/2024	100.00%		

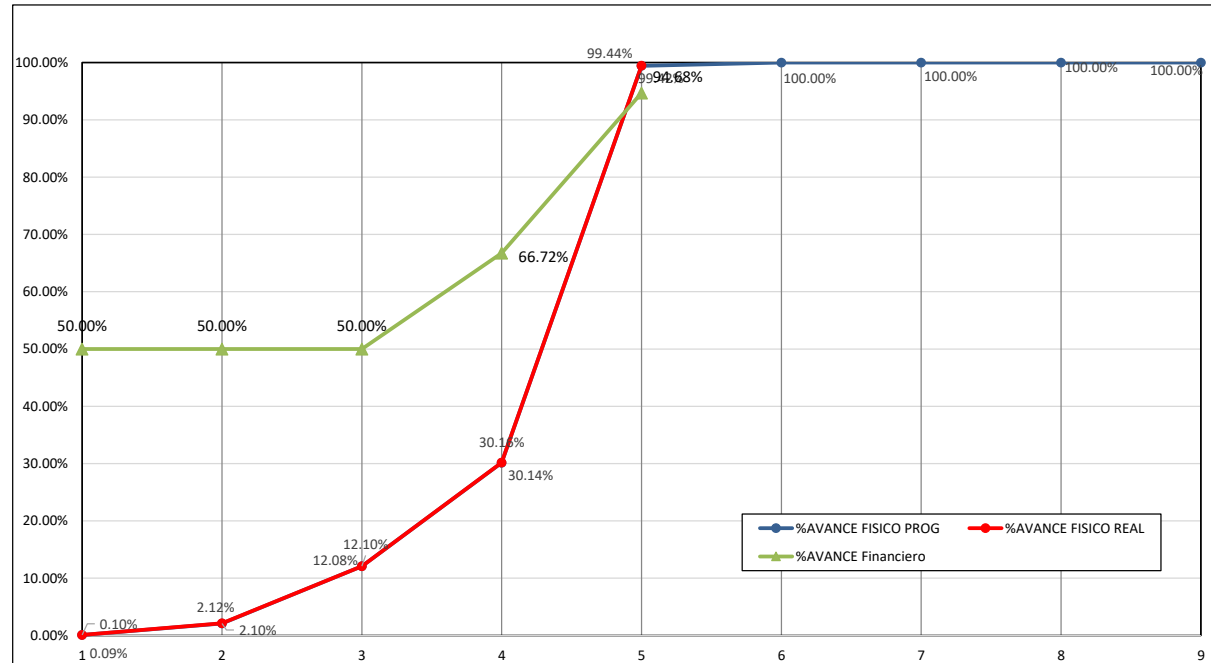

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
