

## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

**Obra:** FAISMUN 003/2024 REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE TOMAS DE AGUA POTABLE Y RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 12 DE DICIEMBRE DE CALLE 1 DE MAYO A CALLE 5 DE MAYO

**Ubicación:** SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

**Contrato:** FAISMUN 003/2024

**Tipo de inversión:** FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2024

**Contratista:** CAMINOS Y URBANIZACIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

**Programa:** SF,SE PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES, URBANIZACIÓN SD ALCANTARILLADO SC AGUA POTABLE

**Inicio Vigente:** viernes, 19 de abril de 2024

**Días de Obra:** 60

**Subprograma:** 01,03 REHABILITACIÓN, CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS

**Inicio Real:** viernes, 19 de abril de 2024

**Monto Contratado:** \$2,092,650.50


**Residente:** ING. CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA

**Fin Vigente:** lunes, 17 de junio de 2024

**Monto Ejercido:**

**Fin Real:** lunes, 17 de junio de 2024

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	19/04/2024	0.00%	0.00%	50.0%
2	30/04/2024	21.89%	21.90%	50.0%
3	30/05/2024	60.56%	60.58%	71.9%
4	30/06/2024	100.00%	93.15%	78.6%
5	31/07/2024	100.00%		
6	31/08/2024	100.00%		
7	30/09/2024	100.00%		
8	30/10/2024	100.00%		
9	30/11/2024	100.00%		

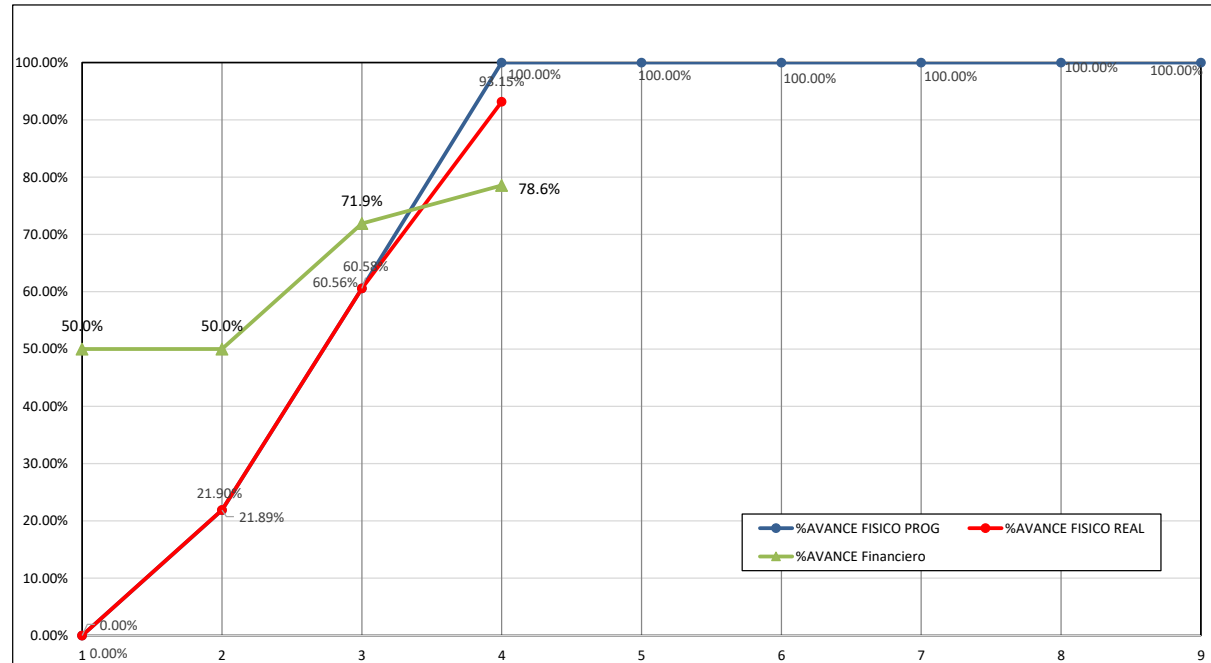

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
