


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra:	FAISMUN 015/2024 REHABILITACIÓN DE DESCARGAS SANITARIAS, REHABILITACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE			
Ubicación:	SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	Contrato:	FAISMUN 015/2024	
Tipo de inversión:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2024	Contratista:	CAMINOS Y URBANIZACIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.,	
Programa:	SF,SE PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES, URBANIZACIÓN SD ALCANTARILLADO SC AGUA POTABLE	Inicio Vigente:	viernes, 7 de junio de 2024	Días de Obra: 60
Subprograma:	01,03 REHABILITACIÓN, CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS	Inicio Real:	viernes, 7 de junio de 2024	Monto Contratado: \$1,916,538.64
Residente:	ING. CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA	Fin Vigente:	lunes, 5 de agosto de 2024	Monto Ejercido:
		Fin Real:	lunes, 5 de agosto de 2024	

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	07/06/2024	0.00%	0.02%	50.0%
2	30/06/2024	24.33%	24.35%	50.0%
3	30/07/2024	96.03%		
4	29/08/2024	100.00%		
5	28/09/2024	100.00%		
6	28/10/2024	100.00%		
7	27/11/2024	100.00%		
8	27/12/2024	100.00%		
9	26/01/2025	100.00%		

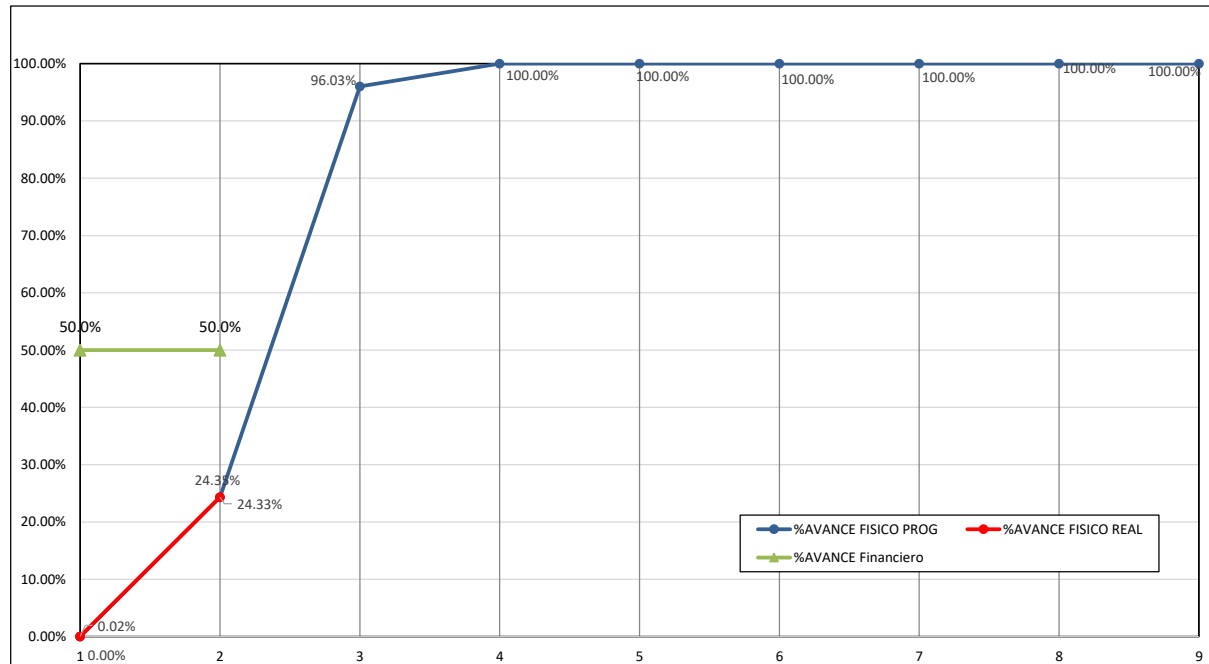

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
