

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FAISMUN 016/2024 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE CANDILES TRAMO CALLE POZO NUEVO A CALLE PONIENTE Y DE CALLE PONIENTE A MITAD DEL TRAMO DE LA CALLE PONIENTE A CALLE SAN MARTÍN , REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE CANDILES TRAMO CALLE POZO NUEVO A CALLE PONIENTE Y DE CALLE PONIENTE A MITAD DEL TRAMO DE LA CALLE PONIENTE A CALLE SAN MARTÍN.

Ubicación: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO **Contrato:** FAISMUN 016/2024

Tipo de inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2024 **Contratista:** LEOPOLDO MORONES FONSECA


Programa: SC AGUA POTABLE SD ALCANTARILLADO **Inicio Vigente:** miércoles, 5 de junio de 2024 **Días de Obra:** 30

Subprograma: 01 REHABILITACIÓN **Inicio Real:** miércoles, 5 de junio de 2024 **Monto Contratado:** \$1,008,136.41

Residente: ING. CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA **Fin Vigente:** jueves, 4 de julio de 2024 **Monto Ejercido:**

Fin Real: jueves, 4 de julio de 2024

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	05/06/2024	0.00%	0.03%	50.0%
2	12/06/2024	7.56%	7.59%	50.0%
3	19/06/2024	30.16%	30.17%	50.0%
4	26/06/2024	61.89%	61.92%	50.0%
5	03/07/2024	94.05%		
6	10/07/2024	100.00%		
7	17/07/2024	100.00%		
8	24/07/2024	100.00%		
9	31/07/2024	100.00%		

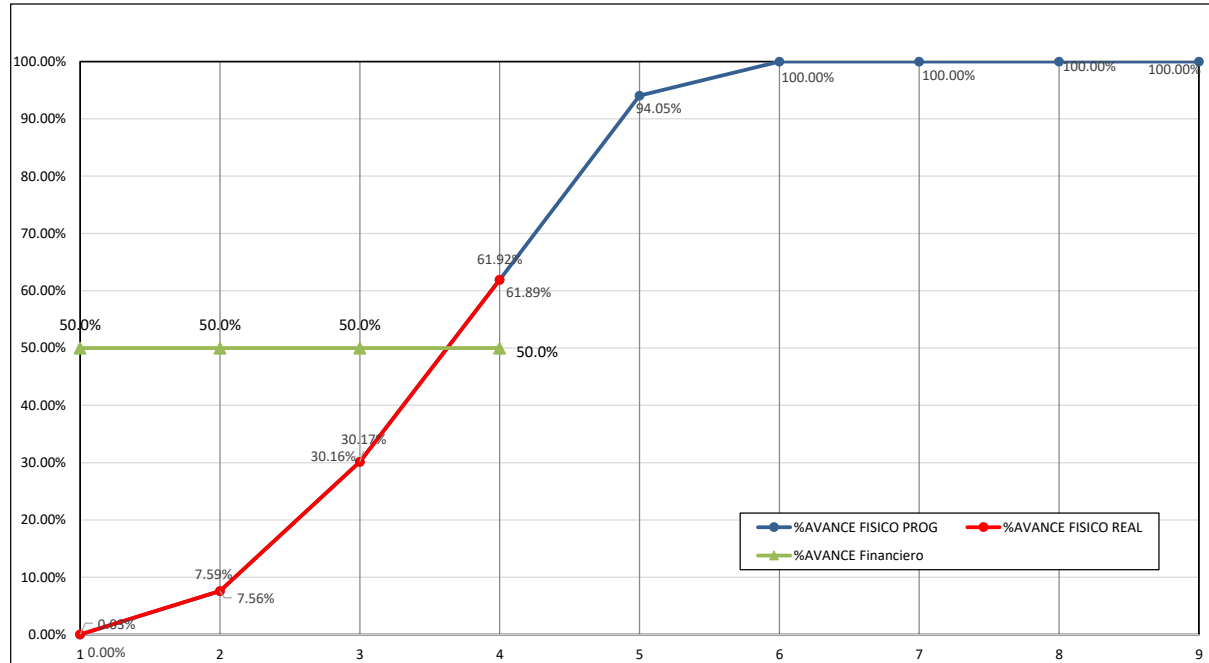

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
